



UNIONE EUROPEA



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



REGIONE DEL VENETO



**Rapporto Annuale di Esecuzione
sull'avanzamento del Programma Attuativo
FSC 2007-2013**

al 31 dicembre 2014

Regione del Veneto



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi
Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Autorità di Gestione PAR FSC 2007-2013
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia Tel. 041/2794145-4147 – Fax 041/2794130
dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.veneto.it
FSCautoritagestione@regione.veneto.it

Contenuti

Programmazione FSC 2007-2013	5
1. Identificazione	5
2. Stato di attuazione del Programma Attuativo.....	7
2.1. Breve storia del PAR del Veneto	7
2.2. Rimodulazione del Piano finanziario del PAR.....	9
2.3. Risultati e analisi dei progressi	12
2.3.1. Avanzamento del Programma	12
2.3.2. Avanzamento Finanziario	15
2.3.3. Avanzamento procedurale.....	16
2.3.4. Avanzamento economico	18
2.3.5. Avanzamento fisico.....	18
2.4. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma	19
2.4.1. Priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	21
2.4.2. Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale.....	25
2.4.3. Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	25
2.4.4. Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità	28
2.4.5. Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci....	29
2.5. Stato di attuazione analitico degli APQ	31
2.5.1. APQ VE20 - Difesa del suolo e della costa	32
2.5.2. APQ VE31 - Beni culturali.....	34
2.6. Stato di attuazione analitico dei SAD	36
2.6.1. SAD VE11 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile.....	37
2.6.2. SAD VE42 - Mobilità sostenibile - Impianti a fune	38
2.6.3. SAD VE53 - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio.....	39
2.6.4. SAD VE61 e VE62 - Assistenza Tecnica.....	40
2.7. Stato di attuazione analitico delle Azioni cardine	42
2.7.1. Azione cardine “Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale”.....	43
2.7.2. Azione cardine “Piste ciclabili”	44
2.7.3. Azione cardine “Qualità dell’Atmosfera (Riduzione del PM10)”	45
2.7.4. Azione cardine “Sostegno alle iniziative di sviluppo locale”	46
2.8. Cronoprogramma di spesa FSC	47
2.9. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.....	48

2.10. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.....	48
2.11. Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	49
2.12. Valutazione e sorveglianza	50
2.12.1. Valutazione	50
2.12.2. Sorveglianza.....	52
2.12.3. Partenariato	53
2.12.4. Monitoraggio	53
2.13. Attività di controllo.....	54
2.14. Analisi qualitativa della gestione delle Economie	55
2.15. Assistenza Tecnica	55
2.16. Informazione e pubblicità	56
2.17. Progetti esemplari	57
Energia	58
Difesa del suolo	61
Sviluppo Locale	64
3. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento.....	66
Allegato.....	67

Programmazione FSC 2007-2013¹

1. Identificazione

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	Programmazione	2007-2013
	Titolo del programma	2007VE002FA015 - PAR Veneto
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2014
	Rapporto approvato il:	Approvato dal Cds mediante procedura avviata in data 04/06/2015

¹ Questo RAE relaziona sulle risorse FSC assegnate al Veneto nel periodo di programmazione 2007-2013. Per le risorse FSC del periodo 2000-2006, la Sezione Affari Generali FAS-FSC, in qualità di "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006" ha predisposto un apposito Rapporto avente come oggetto tutti gli APQ sottoscritti dal 2001 al 2009.

Il *Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE)*, previsto dal *Programma Attuativo Regionale (PAR)* e dal *Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)* del PAR stesso, adottato, per il Veneto, con DGR 487/2013, risponde all'esigenza dell'Autorità di Gestione del PAR FSC e della Giunta Regionale del Veneto, di rendere conto al Partenariato, alle Amministrazioni Centrali e ai cittadini dello stato di attuazione del Programma e delle scelte operate per il periodo di programmazione 2007-2013 con le risorse FSC² assegnate al Veneto.

Per queste ragioni il presente Rapporto viene pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto onde consentirne la sua massima diffusione.

Il RAE è previsto anche dal *“Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”* predisposto dal DPS e trasmesso alle Amministrazioni attuatrici dei PAR con circolare prot. n. 14987 del 20 ottobre 2010.

Questo Rapporto è altresì redatto in conformità ad un modello predisposto nell'ambito del *“Progetto di monitoraggio FAS”* (ex Delibera CIPE 17/2003). Progetto attuato con la partecipazione delle Amministrazioni Regionali, con lo scopo di migliorare la qualità dei dati oggetto di analisi.

Alla luce delle citate premesse, il presente documento è stato prodotto dalla *Sezione Affari Generali e FAS-FSC* in qualità di *Autorità di Gestione (AdG)* e condiviso, ai fini della successiva approvazione nel Comitato di Sorveglianza, con le *Strutture Responsabili di Attuazione (SRA)*, conformemente a quanto indicato nel SI.GE.CO.

² Con Il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, le risorse denominate Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) hanno assunto il nuovo nome di *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”*. Il cambiamento di denominazione delle risorse oggetto di questo RAE, avvenuto a metà periodo di programmazione delle risorse stesse, può motivare l'utilizzo della vecchia o nuova denominazione in ragione del contesto in cui si fa riferimento a queste risorse. In questo RAE le due sigle sono equivalenti e identificano le stesse risorse.

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il PAR del Veneto è articolato in 6 Assi prioritari e questi a loro volta sono suddivisi in complessive 15 Linee di intervento. Questa articolazione della politica del PAR è rappresentata dalla tabella n. 1 che mostra anche la dotazione finanziaria dei singoli Assi e delle singole Linee di intervento. La descrizione puntuale di tali Linee sarà fatta in seguito, unitamente alla relazione sulle Priorità del Quadro Strategico Nazionale (QSN).

Come sarà riportato più avanti nel documento, il piano finanziario del PAR (tabella 1) è stato aggiornato con DGR 2463 del 23 dicembre 2014 ed è stato posto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza che si è riunito il giorno 8 gennaio 2015.

Il presente documento è il secondo *Rapporto Annuale di Esecuzione*, in quanto le attività di monitoraggio degli interventi sono iniziate soltanto nel mese di dicembre 2013, in occasione della stipula dell'APQ (Accordo di Programma Quadro) "Difesa del suolo", strumento attuativo di entrambe le Linee di intervento dell'Asse 2.

2.1. Breve storia del PAR del Veneto

Il *Fondo per lo Sviluppo e la Coesione* (FSC) ha assunto la sua attuale denominazione in forza del D.Lgs n. 88 del 31 maggio 2011, che detta disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Precedentemente il Fondo era denominato *Fondo per le Aree Sottoutilizzate* (FAS) e, per il periodo di programmazione 2000-2006, veniva stanziato annualmente dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibere di riparto e di attuazione.

Il Fondo ha la finalità di dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e, in tale ottica, dal 2007 il Fondo ha una dotazione pluriennale al pari dei Fondi Strutturali.

Per il periodo 2007-2013, la programmazione delle risorse FSC è rientrata all'interno del QSN, con l'obiettivo di creare delle sinergie con i Fondi Strutturali e, nel dicembre 2007, il CIPE ha approvato la delibera 166 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate" nella quale si indicavano il riparto e le finalità delle risorse FAS, la *governance* dei Programmi Attuativi, le modalità di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione della attività eseguite per la realizzazione del PAR stesso.

La citata delibera CIPE 166/2007 ha stanziato per il Veneto risorse pari a 608,729 Meuro. In seguito all'approvazione della delibera CIPE, nel corso del 2008 sono stati approvati dalla Giunta regionale

del Veneto tre importanti documenti finalizzati all'impiego delle risorse e all'integrazione di queste con le politiche già avviate con la programmazione comunitaria.

- Con DGR 543/2008 è stato approvato il Piano di Valutazione della programmazione unitaria che delinea l'assetto organizzativo della Regione del Veneto e prevede di coordinare la nuova fase di programmazione tratteggiando, a grandi linee, le modalità e le tempistiche per la valutazione.

- Con la DGR 2607/2008 è stato approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP) che illustra la strategia di politica regionale di coesione unitaria, individuandone gli obiettivi generali e specifici, nonché le relative modalità di attuazione e *governance*.

- Infine, con DGR 2608 del 16 settembre 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma Attuativo Regionale.

Seppure la crisi economico finanziaria, che ancora condiziona le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, sia iniziata già nel 2007, è solo con la delibera 1/2009 che il CIPE ridimensiona le dotazioni finanziarie FSC precedentemente assegnate alle Regioni, riducendo a 570,466 Meuro l'ammontare a disposizione del Veneto.

Successivamente, con delibera 1/2011, il CIPE ha ridotto ulteriormente l'ammontare FSC per il Veneto decurtando un importo pari a 57,047 Meuro e portandolo pertanto alla dotazione finanziaria di 513,419 Meuro.

Le mutate condizioni economiche finanziarie e le nuove indicazioni fornite dal CIPE hanno comportato la revisione del documento che è stato poi approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1186 del 26 luglio 2011.

Nella seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE, con delibera 9, ha preso atto del PAR del Veneto così come approvato dalla DGR 1186/11, fornendo alcune osservazioni, per l'attuazione e la *governance*, che in estrema sintesi si possono così elencare:

- acquisizione della "Valutazione ex ante" del Programma e delle Azioni cardine;
- l'indicazione di procedere con la stipula di Accordi di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi nei settori Difesa del suolo, Beni culturali e Sistema Metropolitano Ferroviario Regionale (SFMR);
- necessità di una più precisa attività di audit, prevedendo espressamente per questo, l'individuazione di un'apposita Autorità.

Per quanto riguarda la valutazione ex ante, con nota del 5 luglio 2012, l'Autorità di Gestione del PAR ha inviato al DPS il Rapporto di Valutazione ex ante, predisposto dalla società di valutazione indipendente Rina Value S.r.L. che, oltre ad essere soggetto "valutatore" del PAR è anche "valutatore" del POR CRO parte FESR, in attuazione della DGR 543/2008.

Quanto alla stipula degli APQ, al momento ne sono stati sottoscritti due: uno relativo all'Asse 2 Difesa del suolo e uno relativo alla Linea di intervento 3.1 Beni culturali. Per quanto riguarda il

SFMR, pur constatando la notevole diminuzione di risorse destinate a questa Linea di intervento, il relativo APQ sarà sottoscritto, previa istruttoria con le Amministrazioni interessate, nel corso del 2015.

Riguardo infine all'attività di audit si fa presente che, in occasione dell'approvazione con DGR 487/2013 del *Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)*, avvenuta a seguito del giudizio positivo espresso dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER), che ha ritenuto il funzionamento del sistema di gestione e controllo efficace e rispondente a quanto previsto dalle delibere CIPE 166/2007 e 9/2012, la Giunta ha individuato altresì l'Autorità di Audit che, in analogia con il POR CRO 2007-2013, è la *Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie* (ora *Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie*).

Pertanto, a fronte delle prescrizioni indicate dal CIPE e compiutamente recepite dalla Regione del Veneto, come riportato sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha messo a disposizione le risorse PAR con un decreto che ci è stato trasferito con nota del 7 settembre 2013 e nel mese di ottobre dello stesso anno la Regione ha incassato la prima quota pari all'8 % della dotazione del Programma (€ 41.073.520,00).

2.2. Rimodulazione del Piano finanziario del PAR

L'importo originario complessivo destinato al PAR FSC Veneto (€ 513.008.264,80) è stato ridotto dalla Delibera CIPE 14/2013 che, in attuazione del D.L. 95/2012, ha previsto l'applicazione di tagli alle risorse FSC assegnate alle regioni a statuto ordinario nelle annualità 2013, 2014 e 2015.

Per le annualità 2013 e 2014 i decurtamenti non sono stati applicati in quanto la Regione del Veneto ha aderito al "patto verticale incentivato", così come previsto dal DL 35/2013, art. 1 bis e come concordato nella conferenza Stato Regioni l'11 luglio 2013. È stato invece confermato il taglio dell'annualità 2015, pari a 69.406.483 €. Ulteriori tagli sono stati infine previsti dal DL 66/2014 che prevede un'ulteriore riduzione del FSC delle Regioni per un importo pari a € 200.000.000,00. Le quote per le singole Regioni, al dicembre 2014, non sono ancora definite, tuttavia, applicando la precedente chiave di riparto utilizzata nella delibera CIPE 14/2003, la Regione ha stimato per il Veneto una riduzione pari a 13.220.202,48 €.

La Giunta Regionale inoltre, con delibera n. 1923/2013, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 11 – quinquies del DL 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del fare), ha posto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'utilizzo di risorse del PAR FSC a valere sulla linea 4.1 (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) per

un importo complessivo di € 21.157.916,51, per finanziare il Piano di ristrutturazione in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.

La Giunta regionale, al fine di dare certezza al quadro finanziario del PAR, con propria delibera 2199/14 ha preso atto di queste decurtazioni e ha approvato una nuova ipotesi di riparto delle risorse tra le diverse Linee di intervento.

Successivamente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF è stata disposta un'ulteriore riduzione delle risorse FSC destinate alle Regioni e per la Regione del Veneto il taglio è stato quantificato in € 59.979.000,00; questo ha comportato una ulteriore revisione del piano finanziario del PAR che è stato adottato dalla Giunta con delibera 2463 del 24 dicembre 2014. L'aggiornamento della dotazione finanziaria FSC per il Veneto, quantificata ora in € 349.655.318,01, è servito per ridefinire le priorità del finanziamento tra le diverse Linee, ripartendo le decurtazioni in modo non lineare.

Il CIPE, in data 30 giugno 2014, ha adottato la Delibera n. 21, secondo la quale le Regioni devono assumere tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse FSC entro il 31 dicembre 2015, prevedendo comunque la possibilità di spostare detto termine al 30 giugno 2016 con una decurtazione del 1,5% del finanziamento. Le risorse per le quali non saranno assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti dopo la data del 30/06/2016, verranno automaticamente revocate.

Con il medesimo provvedimento il CIPE ha stabilito che il *Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica* (DPS) effettui, entro il 30 novembre 2014, una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con il FSC e della programmazione delle risorse non ancora impegnate.

L'Autorità di Gestione del PAR FSC (*Sezione Affari Generali e FAS FSC*) pertanto, ha eseguito una puntuale ricognizione riguardante, per ciascuna Linea del PAR, lo stato di attuazione degli interventi già avviati, nonché la definizione, con relativo programma temporale, delle ulteriori iniziative da attivare.

Questa ricognizione ha permesso di meglio identificare le situazioni critiche e operare delle scelte in base alla fattibilità degli interventi e al fabbisogno finanziario dei diversi settori.

In particolare quindi, per quanto riguarda l'Asse 2, in considerazione dell'importanza che il tema della sicurezza idraulica va assumendo per il territorio veneto, l'importo delle relative due Linee è stato aumentato, mentre, per nell'Asse 4, la disponibilità finanziaria della linea di intervento relativa al SFMR è stata ridotta in modo significativo, in ragione della incerta cantierabilità degli interventi.

Nella tabella di pagina successiva viene illustrato il piano finanziario attuale (ratificato in CdS del 8 gennaio 2015) confrontandolo con quello adottato dal CIPE nella presa d'atto del 20 gennaio 2012 (delibera CIPE 9).

ASSI PRIORITARI	LINEE Risorse prima versione PAR	LINEE DI INTERVENTO	Assi Nuova ripartizione	Linee Int. Nuova ripartizione
1. Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile	60.000.000,00	1.1 Riduzione dei consumi energetici e incentivi alla diversificazione delle fonti di produzione	79.013.585,17	46.013.585,17
	40.000.000,00	1.2 Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile		33.000.000,00
2. Difesa del suolo	48.000.000,00	2.1 Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti	72.622.900,00	61.750.000,00
	12.872.900,00	2.2 Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale		10.872.900,00
3. Beni Culturali e Naturali	65.000.000,00	3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali	71.257.883,31	59.500.000,00
	11.000.000,00	3.2 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale		11.757.883,31
4. Mobilità sostenibile	100.000.000,00	4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	77.103.583,33	14.485.456,41
	30.000.000,00	4.2 Impianti a fune		24.118.126,92
	16.957.580,27	4.3 Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale		3.500.000,00
	35.000.000,00	4.4 Piste ciclabili		35.000.000,00
5. Sviluppo locale	12.500.000,00	5.1 Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico	44.746.631,00	0,00
	35.000.000,00	5.2 Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili		11.490.606,00
	32.677.784,53	5.3 Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio		33.256.025,00
6. Assistenza tecnica	11.000.000,00	6.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo	4.500.000,00	4.050.000,00
	3.000.000,00	6.2 Valutazione, studi e ricerche		450.000,00
Conti pubblici territoriali	410.735,20		410.735,20	410.735,20
Totale	513.419.000,00		349.655.318,01	349.655.318,01

Tabella 1 – raffronto piani finanziari: prima versione del PAR e versione aggiornata con DGR 2463 del 23/12/2014

2.3. Risultati e analisi dei progressi

2.3.1. Avanzamento del Programma

La tabella nella pagina seguente mostra le risorse movimentate al 31/12/2014, in attuazione del PAR FSC del Veneto.

La tabella del piano finanziario, al pari di altre tabelle presenti in questo RAE, è tratta dal sistema informatico di monitoraggio e riporta dati aggregati dei soli progetti presenti nei sistemi informativi del DPS e dell'*Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)*. Di conseguenza il piano finanziario riportato non evidenzia l'intera disponibilità del programma sulla quale stanno lavorando le *Strutture Responsabili di Attuazione (SRA)* della Regione del Veneto.

Linea intervento	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	UE	FSC	Fondi regionali	Fondi provinciali	Fondi Comunali	Altri finanz. pubblici	Stato altri provvedimenti	Privati
1.1	22	14.767.902,06	0,00	12.524.112,13	0,00	15.500,00	958.289,93	1.270.000,00	0,00	0,00
2.1	64	37.761.016,54	0,00	18.999.980,00	18.761.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	6	14.212.913,30	119.000,00	4.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102.913,30*	0,00
4.2	29	67.355.817,08	0,00	19.708.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647.790,16
5.3	34	19.143.963,00	0,00	12.283.049,00	0,00	0,00	6.652.124,00	208.790,00	0,00	0,00
6.1	5	3.226.987,80	0,00	3.226.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	1	151.581,92	0,00	151.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	158.620.181,70	119.000,00	71.884.737,77	20.761.036,54	15.500,00	7.610.413,93	1.478.790,00	9.102.913,30	47.647.790,16

Tabella 2 – Piano Finanziario del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2014 – dati riferiti ai progetti monitorati

* La fonte "Stato altri provvedimenti" della Linea di intervento 3.1 comprende € 7.000.000,00 di risorse FSC nazionali

Le Tabelle di seguito riportate mostrano l'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie).

La prima è riferita agli Strumenti, la seconda ai Progetti, monitorati al 31/12/2014.

Nel corso del 2014 è continuata l'attività delle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle diverse Linee di intervento e, in seguito al finanziamento (in parte già avviato nel 2013) di ulteriori iniziative, è stato possibile inserire nel sistema di monitoraggio 4 nuovi Strumenti attuativi (3 di tipo SAD e un nuovo APQ) per complessivi ulteriori 94 interventi.

Come indicato in altra parte del RAE, dei 127 interventi che realizzano *opere e lavori pubblici*:

- 65 sono contenuti nel primo APQ stipulato per la Difesa del suolo (APQ VE20) a dicembre 2013;
- 22 sono nella Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici;
- 6 sono inseriti nell'APQ VE31 stipulato per i Beni culturali;
- i restanti 34 sono attuativi della Linea di intervento 5.3 Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio.

I 6 interventi della tipologia *Acquisizione di beni e servizi* sono relativi all'Asse 6 Assistenza tecnica.

I 29 interventi di *finanziamento ed aiuto alle imprese* riguardano la Linea di intervento 4.2 Impianti a fune.

Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
SAD avviati	5	104.646.251,86	47.893.757,77
– Ve11 Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Riduzione consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici (monitorato dal 2014)		14.767.902,06	12.524.112,13
– VE42 Mobilità sostenibile - Impianti a fune (monitorato dal 2014)		67.355.817,08	19.708.026,92
– VE53 Sviluppo locale - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio (monitorato dal 2014)		19.143.963,00	12.283.049,00
– VE61 Realizzazione Attività Assistenza Tecnica (monitorato dal 2013)		3.226.987,80	3.226.987,80
– VE62 Realizzazione Attività Assistenza Tecnica - Valutazione, studi e ricerche (monitorato dal 2013)		151.581,92	151.581,92

Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
APQ stipulati	2	53.973.612,60	23.990.662,76*
– VE20 APQ Difesa del suolo e della costa (monitorato dal 2013)		39.760.699,30	18.999.662,76
– VE31 APQ Beni culturali - Conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali (monitorato dal 2014)		14.212.913,30	4.991.000,00*
Totale	7	158.619.864,46	71.884.420,53

Tabella 3 – Avanzamento degli Strumenti del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

* Nell'APQ VE31, stipulato in attuazione della Linea di intervento 3.1, sono state programmate ulteriori risorse nazionali FSC pari a € 7.000.000,00. Il valore riportato in tabella tiene conto soltanto del FSC assegnato al PAR del Veneto.

Avanzamento del Programma – Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi ³	162	158.619.864,46	71.884.420,53
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	127	87.885.477,66	48.797.823,89
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	6	3.378.569,72	3.378.569,72
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	29	67.355.817,08	19.708.026,92
Progetti chiusi	0	0,00	0,00
Totale	162	158.619.864,46	71.884.420,53

Tabella 4 – Avanzamento dei progetti del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2014 – per la tipologia 'opere e lavori pubblici', nella colonna FSC si devono aggiungere 7.000.000,00 euro di risorse FSC nazionali (non del PAR) inserite nello Strumento VE31)

2.3.2. Avanzamento Finanziario

La tabella sotto riportata mostra la quantità di risorse impiegate negli interventi oggetto di monitoraggio al 31/12/2014, con indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti effettuati per queste ultime.

L'importo di FSC trasferito si riferisce alla prima tranche di contributo, ed equivale all'8% della dotazione finanziaria complessiva del PAR definita in sede di presa d'atto da parte del CIPE. Si

³ Per "Progetti Attivi" si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da "Chiuso" o "Annullato".

tratta della prima quota trasferita come anticipo ai sensi del punto 7.1 della delibera CIPE 166/2007; come è noto, il successivo trasferimento da parte dello Stato è subordinato alla certificazione di spesa realizzata pari al 75% della prima quota già trasferita, certificazione che, per il PAR del Veneto, deve attestarsi a circa 30 Meuro.

Programma: PAR Veneto	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
Totale	162	158.620.181,70	41.073.520,00	59.770.672,19	19.166.001,37

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

2.3.3. Avanzamento procedurale

Le tabelle sotto riportate mostrano la fase procedurale in cui si trovano gli interventi al 31/12/2014. I dati degli interventi sono suddivisi per tipologia e pertanto si possono riscontrare Opere pubbliche, Acquisizione di beni e servizi e Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti		
		Numero	Valore	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	0	0,00	0,00
	Progettazione preliminare	20	10.633.130,93	7.406.906,50
	Progettazione definitiva	14	18.711.684,43	5.551.194,02
	Progettazione esecutiva	44	28.486.863,00	11.481.582,52
	Esecuzione lavori	22	16.764.253,32	11.546.469,80
	Collaudo	8	4.688.646,04	4.271.807,65
	Chiusura intervento	0	0,00	0,00
	Funzionalità	19	8.600.899,94	8.539.863,40
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0,00	0,00
Totale		127	87.885.477,66	48.797.823,89

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - Realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti		
		Num.	Costo	Valore FSC
Acquisizione di Beni e Servizi	Chiuso	0	0,00	0,00
	Definizione e stipula contratto	0	0,00	0,00
	Esecuzione Fornitura	6	3.378.569,72	3.378.569,72
	Verifiche e controlli	0	0,00	0,00
Totale		6	3.378.569,72	3.378.569,72

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – Acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti		
		Num.	Costo	Valore FSC
Aiuti alle Imprese	Concessione di finanziamento	29	67.355.817,08	19.708.026,92
	Esecuzione investimenti	0	0,00	0,00
	Chiusura intervento	0	0,00	0,00
Totale		29	67.355.817,08	19.708.026,92

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Rispetto al 31/12/2013 si nota una significativa differenza che mostra una marcata accelerazione del PAR del Veneto. Le differenze riguardano tutte le tipologie di intervento. Compare ora in questa annualità la tipologia “Aiuti alle imprese” (Tabella 8) che mostra i 29 interventi inseriti nel 2014 per la linea SAD VE42. Anche i dati delle tabelle 6 e 7 mostrano un aumento degli interventi che sono ora 127 e 6 mentre a fine 2013 erano rispettivamente 65 e 3.

Come si vedrà più avanti nel documento, significative sono state le realizzazioni nell'APQ VE20 che può ora indicare 19 interventi nella fase di ‘funzionalità’ e la conclusione di fasi intermedie di parecchi interventi. Per quanto riguarda invece gli interventi ancora in fase di progettazione (78 interventi su 127), si ritiene che questi siano giustamente situati in una fase iniziale di attuazione considerando l'avvio relativamente recente dei nuovi Strumenti.

Anche per quanto riguarda gli interventi di Assistenza tecnica (i 6 interventi classificati come Acquisizione di beni e servizi) sono in piena fase attuativa ed iniziano a evidenziare spesa realizzata.

2.3.4. Avanzamento economico

L'avanzamento del PAR riporta un costo realizzato pari ad € 19.603.064,41. Considerando che molti interventi beneficiano di ulteriori e diversi finanziamenti, la **spesa realizzata riferibile al Fondo è pari a circa 17,5 Meuro**.

Le realizzazioni si riferiscono, quasi esclusivamente allo strumento attuativo VE20, APQ stipulato in attuazione dell'Asse 2 – Difesa del suolo che presenta una spesa rendicontabile sul PAR pari a circa 16 Meuro. Come è noto, la delibera CIPE 166/2007 stabilisce che i trasferimenti da parte del DPS alla Regione avvengano in ragione del costo realizzato certificato dall'Autorità di Certificazione. La prima certificazione di spesa avverrà quando questa raggiungerà il 75% di quanto trasferito a titolo di anticipo. Considerando che la Regione del Veneto ha ottenuto un primo trasferimento pari a poco più di 41 Meuro, le condizioni per richiedere il trasferimento di una seconda tranche pari all'8% saranno mature quando la spesa realizzata raggiungerà i 30 Meuro. In considerazione dell'avanzata fase realizzativa di molti interventi inseriti a sistema, è ipotizzabile una prima certificazione nel primo semestre del 2015.

Programma: PAR Veneto	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	162	158.620.181,70	158.619.864,46	19.603.064,41	317,24

Tabella 9 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014

Il costo degli interventi ora monitorati ammonta a 158.619.864,48 con un incremento, rispetto al 2013 di € 117.773.179,57.

Anche la spesa realizzata ha avuto un incremento di € 10.211.013,76; incremento ovviamente più contenuto rispetto a quello del costo, giustificato dal recente avvio delle iniziative.

2.3.5. Avanzamento fisico

Rispetto allo scorso anno c'è stata una significativa accelerazione nell'attuazione del PAR che ha consentito di mettere nel sistema di monitoraggio tre nuovi SAD (VE11, VE42 e VE53) e un nuovo APQ (VE31). Anche il numero degli interventi monitorati ha avuto un significativo incremento passando dai 68 progetti monitorati a fine 2013 ai 162 del 31/12/2014. Come detto in altre parti del Rapporto, nel 2014, anche in seguito all'emanazione della delibera CIPE 21/14, sono state avviate nuove iniziative che porteranno a dei risultati inseribili a sistema nel corso del 2015.

2.4. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma

In sede di prima approvazione, tra le 10 Priorità previste dal QSN, sulle quali impiegare le risorse, il PAR del Veneto ne aveva individuate 5. In sede di riprogrammazione e di definizione del nuovo piano finanziario del Programma, approvato dalla Giunta regionale con propria delibera n. 2463/2014 e ratificato nel CdS del 8 gennaio 2015, dovendo operare delle scelte dipendenti dal mutato contesto economico finanziario, ma anche condizionate dalla nuova tempistica per la realizzazione contemplata dalla delibera CIPE 21/2014, il Veneto ha ritenuto opportuno ridimensionare in modo significativo gli stanziamenti riferiti alle priorità 6 e 10 e azzerare completamente l'importo assegnato alla priorità 4. Per facilitare il confronto tra la situazione attuale e quanto riportato nel RAE 2013 si riporta anche quest'anno il vecchio piano.

Codice Priorità	Descrizione	Importo Numerico	Importo %
3	Energia e ambiente:uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	151.636.485,17	43,42%
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	0,00	0,00%
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	116.004.514,31	33,22%
6	Reti e collegamenti per la mobilità	77.103.583,33	22,08%
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	4.500.000,00	1,29%
Totale		349.244.582,81	100,00

Tabella 10 – Quantità finanziarie del PAR suddivise per Priorità del QSN – Piano finanziario approvato con DGR 2463/2014 e CdS 8 gennaio 2015

Codice Priorità	Descrizione	Importo Numerico	Importo %
3	Energia e ambiente:uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	160.872.900,00	31,36
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	12.500.000,00	2,44
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	143.677.784,53	28,01
6	Reti e collegamenti per la mobilità	181.957.580,27	35,47
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	14.000.000,00	2,73
Totale		513.008.264,80	100,00

Tabella 10 - bis – Quantità finanziarie del PAR suddivise per Priorità del QSN – Piano finanziario originario del PAR approvato con delibera CIPE 9/2012.

Le attività per la realizzazione del PAR sono iniziate negli ultimi mesi del 2013 e pertanto, nel sistema di monitoraggio sono inseriti soltanto i progetti che hanno avuto un provvedimento di finanziamento.

Per tale motivo, la tabella n. 11, sotto riportata, non dà un'esatta rappresentazione di quanto fatto per le diverse Linee e Priorità. Anche in considerazione dei vincoli temporali introdotti con la citata delibera CIPE, le attività sono state avviate per tutte le Linee di intervento e i risultati saranno riportati nel prossimo RAE.

La tabella 11 indica che gli interventi monitorati sono riferibili a tutte le 4 priorità QSN ora individuate.

Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
<i>3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo</i>	87	54.528.918,60	27.581.281,71	17.083.105,30
<i>5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo</i>	40	33.356.876,30	10.777.793,94	1.313.443,28
<i>6 - Reti e collegamenti per la mobilità</i>	29	67.355.817,08	19.708.026,92	0,00
<i>10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci</i>	6	3.378.569,72	1.703.569,62	769.452,79
Totale	162	158.620.181,70	59.770.672,19	19.166.001,37

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014

A seguire, si procede ad una veloce esposizione sulle attività realizzate in attuazione del PAR e delle Priorità da questo individuate, ipotizzando inoltre i risultati che potranno essere monitorati nel Sistema Informatico di gestione dei progetti (SGP) nel corso del 2015 come conseguenza delle iniziative avviate nel 2014 e che saranno pertanto oggetto del prossimo RAE.

Per facilitare la lettura delle pagine che seguono, si riporta una tabella riepilogativa delle iniziative monitorate e le iniziative avviate con atti formali (bandi o presentazione di interventi al Tavolo del Partenariato) ancorché non riportate nei dati di questo RAE.

Come riportato in altre parti del documento, con la delibera 2463 del 23/12/2014, la Giunta regionale ha individuato interventi o iniziative precise per il totale delle risorse ora presenti nel PAR del Veneto. Come si evince dalla tabella sotto riportata, i rimanenti 65,83 Meuro non ancora allocati, sono da ritenersi già programmati e le relative iniziative per l'attuazione degli interventi sono già avviate nei primi mesi del 2015.

Priorità	Linee intervento interessate	Importo stanziato nel PAR	Importi FSC nel sistema di monitoraggio	Progetti presentati al TdP (FSC richiesto)	Importo FSC progetti attivati tramite altre procedure
<i>3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo</i>	1.1	46.013.585,17	12.524.112,13	0,00	33.489.473,04
	1.2	33.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	2.1	61.750.000,00	18.999.980,00	42.750.000,00	0,00
	2.2	10.872.900,00	0,00	10.872.900,00	0,00
<i>5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo</i>	3.1	59.500.000,00	4.991.000,00	0,00	36.386.900,00
	3.2	11.757.883,31	0,00	11.757.883,31	0,00
	5.2	11.490.606,00	0,00	0,00	6.120.606,00
	5.3	33.256.025,00	12.283.049,00	0,00	20.972.976,00
<i>6 - Reti e collegamenti per la mobilità</i>	4.1	14.485.456,41	0,00	4.179.456,41	0,00
	4.2	24.118.126,92	19.708.026,92	0,00	0,00
	4.3	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
<i>10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci</i>	6.1	4.050.000,00	3.226.987,80	0,00	0,00
	6.2	450.000,00	151.581,92	0,00	0,00
Totale		349.244.582,81	71.884.737,77	79.560.239,72	131.969.955,04

Tabella 12 – Iniziative monitorate e altre attivate nel 2014 e non ancora nel sistema di monitoraggio al 31/12/2014

2.4.1. Priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo

Il PAR del Veneto persegue la priorità 3 “Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo” tramite l’Asse 1 “Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile” e l’Asse 2 “Difesa del suolo”.

Il primo Asse suddivide i 79.013.585,17 euro tra 2 Linee di intervento: la prima, “Riduzione dei consumi energetici”, prevede uno stanziamento pari a € 46.013.585,17, alla seconda, “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile”, sono destinati i rimanenti € 33.000.000.

Anche l’Asse 2 “Difesa del suolo” viene attuato tramite due Linee di intervento per complessivi € 72.622.900,00. Alla Linea “Prevenzione e mantenimento della risorse idriche, riduzione del

rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti” sono destinati € 61.750.000,00 mentre alla seconda Linea “Interventi di contrasto all’erosione costiera e di ripristino ambientale” sono riservati i rimanenti € 10. 872.900.

Per quanto riguarda la Priorità 3, sono già nel sistema di monitoraggio interventi che riguardano 3 delle 4 Linee di intervento citate sopra. Le Strutture Responsabili di Attuazione hanno comunque presentato progetti su tutte le quattro Linee per l’intero importo FSC a queste assegnate.

La conformazione del territorio della Regione del Veneto come pure la distribuzione della popolazione e degli insediamenti produttivi così come le modalità di trasporto, contribuiscono a determinare un livello di inquinamento non più sopportabile con valori che superano a volte quelli indicati dalla normativa vigente. Le cause di deterioramento della qualità dell’aria risiedono nelle emissioni derivanti dalla produzione di energia termica ed elettrica, dai trasporti, dalle attività produttive nonché dal trattamento e smaltimento dei rifiuti. Risulta pertanto prioritario intervenire in maniera combinata sulle fonti di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti al fine di migliorare la qualità dell’aria e promuovere allo stesso tempo la sostenibilità energetica. Per tale motivo nel PAR del Veneto è previsto l’apposito Asse 1 “Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile”.

Per l’attuazione della **Linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e incentivi alla diversificazione delle fonti di produzione”**, la struttura competente della Regione del Veneto ha esplorato (con nota del 1/7/2013) le necessità del territorio coinvolgendo gli Enti Locali e le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

Questa rilevazione mirava alla selezione di interventi classificabili “di rilevante interesse regionale” in termini di replicabilità, di elevata efficienza ed innovazione e con costi contenuti. La scelta è stata quella di puntare su interventi di diagnosi energetica degli edifici, compresi quelli dedicati ad attività sportive, per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e conseguente realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici stessi (climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo della fonte idrotermica, aerotermica o geotermica). Allo stesso tempo si puntava all’autoproduzione di energia, con particolare riferimento a fonti termiche, e al completamento di reti di teleriscaldamento derivante da impianti di produzione mediante fonti energetiche rinnovabili. Sono stati inoltre richiesti progetti per il telecontrollo, telegestione e automazione degli impianti di climatizzazione e illuminazione, sostituzione di sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza o non a norma.

Come richiesto dalla rilevazione sopra indicata, i progetti presentati, attuati prevalentemente da Comuni, sono relativi ad interventi di teleriscaldamento, efficientamento energetico e produzione di energia geotermica e da biomasse.

In seguito a questa iniziativa, la Sezione Energia ha selezionato 19 interventi (18 Comuni e una Provincia), dal valore complessivo di € 6.844.112,13, che sono stati presentati al Tavolo di Partenariato (TdP) nel mese di novembre 2013. Nel corso del 2014 sono stati individuati 2 nuovi interventi a Regia regionale che sono stati sottoposti, con esito positivo, al Tavolo del Partenariato nel mese di novembre 2014. Si tratta di interventi di efficientamento energetico di due grandi edifici di edilizia residenziale. Il costo complessivo ammonta ad € 6.950.000,00 con un contributo FSC pari a € 5.680.000,00.

Tutti i progetti sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio e sono rappresentati nelle tabelle di questo RAE.

Nell'ambito della Linea di intervento 1.1, nel corso del 2014 sono stati emanati due bandi: il primo per il finanziamento di interventi di reti di illuminazione pubblica, il secondo per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Si ritiene che con questi due bandi venga interamente utilizzato l'intero importo FSC stanziato per la Linea di intervento 1.1. I progetti, al 31/12/2014 ancora in fase di istruttoria, saranno inseriti nel sistema informatico nel corso del 2015.

Con l'obiettivo dichiarato di voler favorire interventi per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti derivanti da traffico veicolare, nel PAR del Veneto è prevista la **Linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile"** che prosegue il processo di rinnovamento dei mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale.

Anche per questa Linea, il Tavolo di Partenariato del novembre 2013 ha approvato l'iniziativa di finanziamento per il rinnovo parco mezzi dei comuni capoluogo di provincia per un ammontare FSC di € 10.000.000. Nel corso del 2014, l'istruttoria per il finanziamento dei progetti si è conclusa e con DGR n. 1606 del 9 settembre 2014 sono stati assegnati € 4.000.000 per l'acquisto di autovetture tramviarie dei sistemi di Padova e Venezia e € 6.000.000 per autobus dei sette comuni capoluogo di provincia. In seguito alla sottoscrizione dei necessari accordi con gli enti coinvolti, i progetti saranno inseriti nel sistema di monitoraggio e non si intravedono problemi per la loro attuazione.

Tuttavia l'iniziativa sopra riportata, a causa del ridotto finanziamento messo a disposizione, non ha risposto in modo adeguato alle esigenze di ammodernamento del parco veicolare impiegato nei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Veneto, soprattutto per quanto riguarda i servizi svolti in aree suburbane ed extraurbane, che erano stati esclusi dall'originaria versione del Programma. Pertanto, al fine di rispondere più compiutamente al fabbisogno di tale settore, la DGR 2199/2014 ha dato mandato all'Autorità di Gestione di proporre una modifica del PAR per rendere ammissibili al finanziamento anche gli investimenti per l'acquisto di autobus per le linee extraurbane e suburbane.

Allo stesso tempo, la citata DGR proponeva di rendere non più vincolante il rispetto del riparto, stabilito dal PAR, tra autobus (60%) e tram (40%), avendo questi ultimi già ottenuto sufficienti risorse per approvvigionamenti e vetture. Il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 gennaio 2015 ha approvato quanto proposto con la DGR 2199/2014.

Per l'Asse 2, il PAR ha individuato come obiettivo specifico la prevenzione e gestione dei rischi naturali, declinando poi questo obiettivo specifico in due obiettivi operativi: prevenire il dissesto idrogeologico e difendere i litorali.

Quanto al primo, si ricorda che la Regione del Veneto, sempre in ragione delle caratteristiche del proprio territorio, può essere soggetta a dissesti idrogeologici con gravi conseguenze per i centri abitati e gli insediamenti produttivi. Ecco dunque che la sicurezza idraulica viene ad essere uno dei requisiti principali affinché il territorio si possa sviluppare evitando nel contempo i danni, i disagi e i timori che alluvioni, smottamenti e mareggiate possano provocare ai cittadini e al tessuto produttivo della Regione.

In riferimento al secondo obiettivo invece, si evidenzia che la fascia costiera della Regione è di vitale importanza per l'economia dei centri costieri e della Regione stessa, considerato l'elevato valore economico dell'attività turistica e la necessità di garantire la sostenibilità dei flussi turistici nel territorio.

La **Linea di intervento 2.1** riconosce queste esigenze e mette a disposizione risorse per procedere con interventi strutturali al fine di garantire una adeguata difesa del reticolo socio-economico presente nel territorio. Per quanto riguarda questa Linea, è opportuno segnalare che le risorse FSC si affiancano alle risorse del POR parte FESR 2007-2013 che riserva a queste finalità una apposita misura.

Gli interventi strutturali previsti dal PAR FSC Veneto 2007-2013, in parte già programmati e finanziati, riguardano la rete idraulica regionale, attraverso opere di consolidamento e adeguamento delle arginature esistenti, ricalibratura e risezionamento dei corsi d'acqua, adeguamento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa e di regolazione delle acque. Tali interventi, si realizzeranno per stralci funzionali, in relazione sia alla natura delle opere da realizzare, sia in relazione alle disponibilità finanziarie, consentendo di incrementare la sicurezza idraulica del territorio secondo fasi successive.

Per l'attuazione degli interventi dell'Asse 2, già nel novembre del 2013 sono stati sottoposti al Tavolo del Partenariato una prima serie di interventi che sono stati successivamente inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto con il DPS e il MATTM il 18 dicembre dello stesso anno.

Nell'APQ per l'Asse 2 (si veda l'apposito paragrafo destinato a questo Strumento) sono stati inseriti 64 interventi riguardanti la Linea di intervento 2.1 e 1 intervento relativo alla **Linea di intervento 2.2 "Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale"** per uno stralcio funzionale di sistemazione del litorale tra foce Piave e foce Livenza.

Come riportato anche in altre parti del Rapporto, in sede di formulazione del nuovo quadro finanziario del PAR, la disponibilità finanziaria dell'Asse 2 è stata potenziata pur in presenza di consistenti tagli. Questa nuova dotazione è stata approvata dal CdS del 8 gennaio 2015 che ha anche preso atto dei nuovi interventi proposti al finanziamento, già presentati al Tavolo del Partenariato, i quali, con l'inserimento in un atto integrativo all'APQ, esauriranno le risorse a disposizione delle due Linee.

2.4.2. Priorità 4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

In recepimento dei tagli al FSC regionale imposti dalla normativa statale, la **Linea 5.1 "Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico"** che prevedeva uno stanziamento di € 12.500.000 è stata azzerata. Questa era la sola Linea che prevedeva attività finalizzate alla Priorità 4 "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale". **Pertanto la Priorità 4 non viene più perseguita con le risorse FSC 2007-2013.**

2.4.3. Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo

La priorità 5 è attuata tramite 4 Linee di intervento appartenenti a due Assi.

Le prime due Linee sono incardinate nell'Asse 3 "Beni culturali e naturali" e sono le Linee 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali" e 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". Le due Linee prevedono ora, in seguito alla riprogrammazione, rispettivamente € 59.500.000 e € 11.757.883,31, esaurendo i 71.257.883,31 euro a disposizione dell'Asse 3.

La terza e la quarta Linea per questa Priorità appartengono all'Asse 5 e sono la Linea 5.2 "Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili" con uno stanziamento di € 11.490.606,00 e la Linea 5.3 "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio" con uno stanziamento pari a € 33.256.025,00.

L'individuazione dei primi progetti per le Linee di intervento 3.1 e 5.3 è iniziata nel 2013 e nel corso del 2014 si è provveduto ad inserirli nel sistema di monitoraggio. Per le rimanenti due Linee le azioni per il finanziamento degli interventi si sono concluse a fine 2014 o si concluderanno nei primi mesi del 2015 e pertanto non presentano ancora dati nel sistema informatico.

Per quanto riguarda la **Linea 3.1**, già nell'incontro con il Tavolo del Partenariato del novembre 2013, sono stati presentati 3 progetti selezionati "a regia" per un importo FSC complessivo di € 4.991.000. Si tratta di tre progetti importanti per il Veneto che spaziano in tre ambiti di intervento: architetture militari e sistemi difensivi, ville venete e restauro di edifici di pregio architettonico. Questi tre interventi sono stati inseriti nell'APQ VE31 sottoscritto dal DPS, dal Ministero Beni e Attività Culturali e dalla Regione del Veneto e sono riportati nelle tabelle del presente documento. Sempre per la Linea 3.1, nel novembre del 2014, sono stati pubblicati anche 2 bandi: il primo è stato indetto per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale; il secondo è mirato alla concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro degli immobili sede di musei, biblioteche ed archivi.

A dicembre 2014, le risposte ricevute da parte dei potenziali soggetti beneficiari erano in fase di istruttoria e pertanto il finanziamento e il relativo monitoraggio avverrà nel corso del 2015.

Anche per quanto riguarda la **Linea 3.2**, la SRA si è attivata già a dicembre 2013, e la Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 2332 con la quale è stata approvata la procedura per la raccolta e la verifica di progetti strategici a regia regionale presentata dagli Enti Parco regionali, dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e da Veneto Agricoltura. Nel corso del 2014, al fine di utilizzare tutte le risorse della Linea di intervento, alla valutazione del Tavolo del Partenariato sono stati sottoposti 41 progetti (di cui 17 riconducibili ad un'unica iniziativa coordinata) per un contributo complessivo € 11.757.883,31. Il monitoraggio di questi progetti inizierà nel primo trimestre 2015

Per quanto riguarda la **Linea 5.2** nel corso del 2014 è stato emanato un bando che utilizzerà € 6.120.606,00 per il finanziamento di 22 interventi definiti ammissibili. I rimanenti € 5.370.000,00 sono destinati al completamento di opere nella Rocca di Monselice, sito storico molto importante per il territorio dei colli padovani. L'Obiettivo operativo di questa Linea è infatti di migliorare l'offerta turistico culturale del territorio in un'ottica di sostenibilità; pertanto un turismo sostenibile che rispetti i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Gli interventi possibili sono orientati al potenziamento e alla riqualificazione, ma anche diversificazione, dell'offerta turistica basata sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Si tratta di iniziative finalizzate ad una ricettività sostenibile come pure al sostegno di attività economiche finalizzate alla

valorizzazione e fruizione del territorio, sempre in un'ottica di turismo sostenibile. Il bando, emanato nell'agosto dello scorso anno era rivolto agli Enti pubblici, sottoscrittori dei Protocolli d'intesa delle Intese Programmatiche d'Area, per realizzare opere e infrastrutture volte al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità di specifici, ben individuati e circoscritti siti di interesse turistico e attrattori culturali. L'istruttoria delle domande si è conclusa nel dicembre 2014 e pertanto, pur consentendo l'assunzione degli impegni nel bilancio regionale, non ha lasciato il tempo per inserire i progetti nel sistema di monitoraggio. Saranno pertanto oggetto di valutazione dal 2015.

L'obiettivo specifico dell'Asse 5 consiste nel 'Riqualificare il territorio promuovendo processi di sviluppo e di aggregazione locale', viene declinato nell'obiettivo operativo 'migliorare l'attrattività dei centri urbani' con la **Linea 5.3**.

Considerando che i centri storici, e i centri urbani in generale, hanno un ruolo fondamentale per la nostra regione, la riqualificazione di questi centri è una priorità che, agendo sul patrimonio pubblico, ha forti ricadute anche per le attività dei privati.

Il PAR stabilisce pertanto che gli interventi finanziabili in questa Linea per questa Priorità sono quelli rivolti al rafforzamento della funzione attrattiva dei centri urbani valorizzandone le funzioni commerciali e residenziali e migliorandone l'accessibilità.

In attuazione di questa Linea di intervento, nel maggio del 2013 è stato indetto un primo bando per la selezione di interventi finalizzati all'innalzamento della qualità degli spazi nei centri urbani, rendendoli più funzionali al fine di accrescerne la vitalità economico-sociale. Tale iniziativa ha portato alla selezione e finanziamento di 34 interventi (scorrendo interamente la graduatoria degli interventi ammissibili) per un costo complessivo pari a € 19.143.963,00 e un contributo FSC pari a € 12.283.049,00. Questi interventi sono regolarmente inseriti nel sistema di monitoraggio e i dati sono riportati nelle tabelle di questo documento.

Nell'agosto del 2014 è stato emanato un ulteriore bando al fine di utilizzare completamente quanto stanziato ora nella Linea (€ 33.256.025,00). Anche questo bando, al pari di quello emanato per la Linea 5.2 è rivolto agli Enti pubblici, sottoscrittori dei Protocolli d'intesa delle Intese Programmatiche d'Area. Gli interventi ammessi al finanziamento sono opere infrastrutturali di riqualificazione dei centri urbani che ne valorizzino la loro capacità attrattiva e di servizio mediante il miglioramento dell'arredo urbano, l'aumento della disponibilità di aree verdi e di spazi pedonali commerciali, la riduzione e gestione sostenibile del traffico urbano.

A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute sono stati selezionati 39 interventi per un costo totale pari a € 25.955.410,00 e un contributo FSC pari a 19.972.976,00. Un ulteriore intervento del costo di € 2.430.000,00 potrebbe essere reso ammissibile in seguito ad ulteriori

valutazioni dal parte del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUVV). In questo caso, con il contributo di € 1.000.000,00, il finanziamento della Linea 5.3 sarebbe totalmente utilizzato. In considerazione del fatto che la definizione degli interventi è stata possibile solo a fine dicembre 2014, per questi interventi è stato possibile assumere gli impegni sul bilancio regionale ma il relativo monitoraggio inizierà solo a partire dal 2015.

2.4.4. Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità

Questa Priorità è perseguita tramite le azioni attuative delle 4 Linee di intervento dell'Asse 4 "Mobilità sostenibile". In questo Asse, particolare importanza assume la **Linea di intervento 4.1 "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)"**. Per questa iniziativa si prevede il potenziamento del trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, pubblici o privati. In sede di prima scrittura del PAR questa Linea è stata considerata fortemente sinergica con una Azione del POR parte FESR del Veneto che ha consentito di finanziare e realizzare una serie di parcheggi per facilitare il trasporto intermodale. Come detto in altra parte di questo documento, in sede di rimodulazione del piano finanziario del PAR, il finanziamento di questa Linea è stato fortemente ridimensionato. Dei 7 progetti presentati al Tavolo del partenariato a novembre 2013, soltanto per uno, con iter procedurale avanzato, è stato confermato il finanziamento. La Giunta regionale, con DGR 2463/14 ha inserito nella proposta di utilizzo delle risorse anche un intervento di attrezzaggio della linea ferroviaria Mestre-Adria per la messa in sicurezza e controllo della circolazione di una linea che è parte integrante del SFMR.

La **Linea 4.2 "Impianti a fune"** è finalizzata al miglioramento dell'accessibilità delle aree di montagna, anche potenziando i sistemi di trasporto a fune esistenti. Nel corso del 2014 si è conclusa la fase di selezione degli interventi attuativi della linea.

In considerazione del fatto che le procedure di selezione degli interventi selezionati tramite bando si erano già concluse, in sede di rimodulazione del piano finanziario del PAR, a dicembre 2014, lo stanziamento per la Linea 4.2 è stato portato, con una riduzione di quasi 6 Meuro, all'importo richiesto dagli interventi ammessi al finanziamento.

Si rimanda al paragrafo relativo allo Strumento SAD VE42 per ulteriori dettagli sull'attuazione di questa Linea.

Anche La **Linea di intervento 4.3 "Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale"** ha avuto una forte riduzione del finanziamento, passando da € 16.957.580,27 previsti in sede di prima approvazione, ai 3.500.000,00 euro del nuovo piano finanziario.

Con le risorse a disposizione, la linea 4.3 si prefigge di giungere alla creazione delle condizioni per poter avviare l'integrazione tariffaria sull'intero territorio regionale, attraverso l'acquisizione della necessaria tecnologia, e con lo sviluppo di adeguate analisi ed elaborazioni di modelli applicabili concretamente a tutte le realtà aziendali presenti nel Veneto, sia per i servizi urbani che per i servizi extra-urbani. Per questa Linea, le iniziative avviate non hanno ancora prodotto risultati da riportare in questo Rapporto.

La quarta Linea dell'Asse 4 riguarda le **Piste ciclabili**. Oltre ad essere attuativa della Priorità 6 del QSN, questa Linea è anche una Azione cardine del PAR, che prevede ancora stanziamenti per € 35.000.000. Questa modalità di trasporto ha sicuramente l'obiettivo di decongestionare il traffico cittadino ma allo stesso tempo contribuisce alla qualità dell'aria, riducendo smog e inquinamento acustico. Inoltre, l'uso della bicicletta contribuisce all'affermarsi di un 'turismo sostenibile', non invasivo ma rispettoso delle risorse locali e naturali. Per questa Linea, nel settembre del 2014, con DGR 1724, è stato emanato un bando concernente la realizzazione di piste ciclabili che forniscano un apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane - periurbane e costituiscano un'opportunità di sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale. L'istruttoria si è conclusa nei primi mesi del 2015 e pertanto sarà possibile illustrare i primi risultati a partire dal RAE del prossimo anno.

2.4.5. Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci

Per le finalità delineate dalla Priorità 10, il PAR FSC del Veneto ha riservato le Linee di intervento dell'Asse 6 "Assistenza tecnica". Si tratta della Linea 6.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo" alla quale era stato destinato, in sede di prima approvazione del PAR, uno stanziamento di € 11.000.000 e della Linea 6.2 "Valutazione, studi e ricerche" con uno stanziamento iniziale di € 3.000.000.

In sede di rimodulazione del piano finanziario del PAR, conclusasi con il Comitato di Sorveglianza del 8 gennaio 2015, le risorse disponibili per quest'Asse sono state fortemente ridotte portandole a € 4.500.000,00.

La **Linea 6.1** si propone di realizzare, sostenere e rafforzare le attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PAR e pertanto in questa Linea può essere assunto personale a tempo determinato come pure può essere acquistato materiale utile alle finalità sopra descritte. Fino al mese di novembre 2013, l'avvio del PAR è stato supportato da personale a tempo determinato assunto con risorse FSC della programmazione 2000-2006 e

pertanto non imputabili al PAR oggetto di questo Rapporto. Nell'ultimo trimestre del 2013, sono state effettuate delle apposite selezioni di personale, per diversi profili professionali, per supportare le attività finanziate con i fondi per la politica di coesione (FSC e Fondi Strutturali). È stato pertanto possibile assumere, da dicembre 2013, personale a tempo determinato anche per le attività del PAR attuate dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA. Per questa finalità sono stati avviati tre progetti, inseriti nel sistema di monitoraggio, per un costo complessivo di circa 3 Meuro, per garantire il personale di supporto fino a fine 2016.

È da ricordare altresì che l'elemento essenziale per il monitoraggio, e cioè il sistema informatico di raccolta e trasmissione dati alla Banca Dati Unitaria (BDU), usato per il PAR è il Sistema Gestione Progetti (SGP) sviluppato e mantenuto direttamente dal DPS. Questo ha evitato di impiegare risorse per sviluppare o mantenere un sistema informatico di proprietà della Regione del Veneto. Tuttavia, in considerazione della strategicità del sistema informativo per le attività di programmazione, controllo e valutazione della politica regionale, e in considerazione della necessità di aggiornare, per il periodo 2014-2020, quello attualmente in uso per i Fondi Strutturali, l'AdG del PAR ha iniziato, in collaborazione con le altre AdG regionali, lo sviluppo di un nuovo software per il monitoraggio che interagisca con il sistema contabile regionale prevedendo anche moduli per la certificazione e il controllo. Per questa iniziativa è previsto un co-finanziamento anche del FSC per un importo pari a € 250.000,00.

Per quanto riguarda **la Linea 6.2**, è in corso l'attività di valutazione affidata ad un soggetto indipendente. Rispondendo alle attese generate dall'avvio della Programmazione Regionale Unitaria, nel 2008 è stato approvato il Piano di valutazione che prevedeva un unico incarico per la valutazione del POR parte FESR e del PAR FAS. I ritardi nell'avvio delle attività del Programma FSC, pur mantenendo un unico soggetto valutatore, hanno di fatto svincolato la valutazione del POR dalla valutazione del PAR il cui disegno di valutazione è stato presentato al Comitato di Sorveglianza soltanto il 26 novembre 2013. Per l'attività del valutatore è stato assunto un impegno pari a € 151.581,92. Per questa Linea è da segnalare che il documento di Valutazione ex ante, richiesto dalla delibera CIPE 9/2012 di presa d'atto del PAR del Veneto, è stato prodotto nel corso del 2012 ed è stato finanziato con risorse FSC del periodo 2000-2006. In questo caso non si tratta di spesa rendicontabile in questo Rapporto.

2.5. Stato di attuazione analitico degli APQ

In sede di predisposizione del PAR, la Regione del Veneto non ha individuato in modo puntuale gli strumenti di attuazione delle diverse Linee di intervento. Sempre nel PAR si auspica peraltro l'adozione dello strumento APQ per concordare, con altre Amministrazioni Centrali interessate, interventi di interesse comune sul territorio veneto anche concentrando risorse provenienti da diversi livelli istituzionali.


La delibera CIPE di presa d'atto del PAR veneto (n. 9/2012) ha comunque prescritto il ricorso allo strumento APQ per tre ambiti del PAR: la Difesa del suolo, i Beni culturali e il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Nel dicembre del 2013 è stato sottoscritto l'APQ per la difesa del suolo e nel luglio 2014 è stato sottoscritto il primo APQ per i Beni culturali.

Con la DGR 2463 del dicembre 2014, sono stati individuati ulteriori interventi e iniziative che saranno portate in atti integrativi ai citati APQ nel corso del 2015.

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VE20 - APQ Difesa del suolo e della costa	65	39.761.016,54	26.703.354,31	16.833.954,74
VE31 - APQ Beni culturali - Accordo di Programma Quadro in materia di Beni culturali	6	14.212.913,30	7.065.569,91	0,00
Totale	71	53.973.929,84	33.768.924,22	16.833.954,74

Tabella 13 - Avanzamento finanziario degli APQ alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

2.5.1. APQ VE20 - Difesa del suolo e della costa

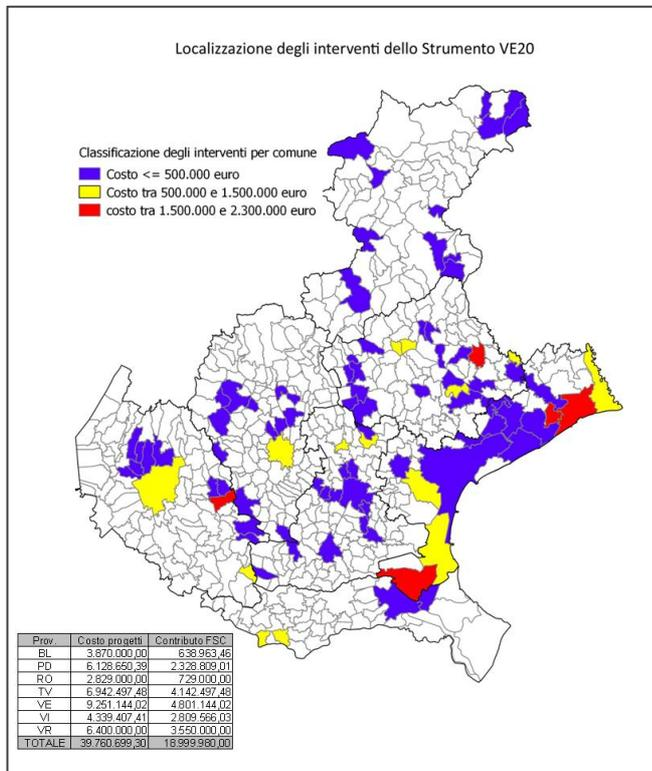

L'APQ "VE20" è stato stipulato il 18 dicembre 2013 con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico (DPS). Tra i soggetti sottoscrittori, per la Regione del Veneto ci sono le strutture competenti per la programmazione del FSC (AdG) e attuazione delle Linee dell'Asse 2 (SRA – Sezione Difesa del suolo).

La frammentazione del contributo su una molteplicità di interventi di importo non elevato, va vista in relazione al disegno unitario di sistemazione dell'intera rete idraulica regionale, obiettivo perseguito anche con le risorse di questo PAR, e alla cantierabilità

degli interventi stessi in relazione alla disponibilità finanziaria e a altri elementi di fattibilità. A riprova di ciò infatti la stessa valutazione dell'insieme dei progetti proposti in APQ ha fatto emergere chiaramente il loro legame rispetto alle esigenze idrografiche del territorio.

Il costo degli interventi ammonta ora a € 39.760.699,30 con un aumento rispetto al 2013 pari a € 329.662,76 essenzialmente imputabili agli interventi VE20P045 (250.000) e VE20P060 (80.000), aumento di costo interamente coperto da risorse regionali.

Le risorse FSC allocate in questo Strumento sono ora pari a € 18.999.980,00 (la riduzione di 20,00 euro rispetto al monitoraggio 2013 è dovuto ad un mero errore materiale in fase di primo inserimento e sarà corretto in futuro). Il restante finanziamento necessario alla copertura del costo è di fonte regionale. La Regione del Veneto ha infatti inserito nell'APQ, sottoscritto nel dicembre 2013, risorse regionali pari a € 20.431.036,54 per interventi del settore, avviati nelle more dell'avvio della programmazione PAR FSC 2007-2013, per attuare un più puntuale monitoraggio e per anticipare, se possibile, la certificazione della spesa sostenuta.

I 65 interventi inseriti nell'APQ sono quelli definiti 'cantierabili' in fase di stipula e pertanto inseriti da subito nel sistema di monitoraggio. Di questi, 64 sono attuativi della Linea 2.1 e 1 della Linea 2.2. L'ulteriore intervento attuativo della Linea 2.2 relativo al contrasto dell'erosione costiera (non

cantierabile e con un costo stimato di 2 Meuro), previsto dalla stesso APQ, doveva essere attivato in seguito a specifico accordo con il Magistrato alle Acque. Tuttavia, in fase di riprogrammazione, è stata individuata un'ulteriore serie di interventi, integrativi dell'APQ in questione e in seguito contenuti nella DGR 2463/2014, che impiegano tutte le risorse non ancora allocate e non monitorate in SGP, Tale riprogrammazione comprende i 2 Meuro originariamente riservati all'intervento non cantierabile citato sopra e sarà pertanto con la sottoscrizione dell'Atto integrativo allo Strumento codificato "VE20" che verrà recepito che quest'ultimo APQ non contiene più interventi 'non cantierabili'.

Relativamente agli indicatori finanziari di questo APQ, si ritiene che i valori di avanzamento (impegni e pagamenti) siano coerenti con il fatto che la stipula è avvenuta sul finire del 2013 e pertanto con indicatori di realizzazione ancora poco significativi. Tuttavia, gli impegni giuridicamente vincolati hanno avuto un incremento pari a € 9.037.997,48 e i pagamenti mostrano un aumento pari a € 10.107.714,22. A completamento di quanto riportato in tabella, si segnala che la spesa realizzata in questo APQ ammonta ora a € 16.909.439,27 con un aumento rispetto a fine 2013 pari a € 7.555.050,66.

Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC in interventi
Progettazione Preliminare	3	2.400.000,00	0,00
Progettazione Definitiva	2	2.200.000,00	0,00
Progettazione Esecutiva	20	13.230.000,00	400.000,00
Esecuzione Lavori	14	8.971.153,32	5.951.153,32
Collaudo	7	4.358.646,04	4.108.646,04
Funzionalità	19	8.600.899,94	8.539.863,40
TOTALE	65	39.760.699,30	18.999.662,76


Tabella 14 - Avanzamento procedurale dell'APQ VE20 al 31/12/2014

Per quanto riguarda la fase procedurale degli interventi, dalla tabella sopra riportata si può notare che 40 dei 65 progetti, per un costo complessivo superiore al 50% dell'APQ, sono in fase di esecuzione o completati. Per i rimanenti 25, di cui 20 in fase di progettazione esecutiva, non si intravedono particolari problemi.

Il profilo di spesa dell'intero Strumento, prevede un picco di oltre 17 Meuro nel il 2015, coerentemente con le fasi procedurali evidenziate più sopra. Tutti gli interventi dovrebbero chiudersi entro il 2018.

La cartina tematica indica i 93 comuni, ripartiti sulla totalità delle province della regione, in cui sono attuati gli interventi.

2.5.2. APQ VE31 - Beni culturali

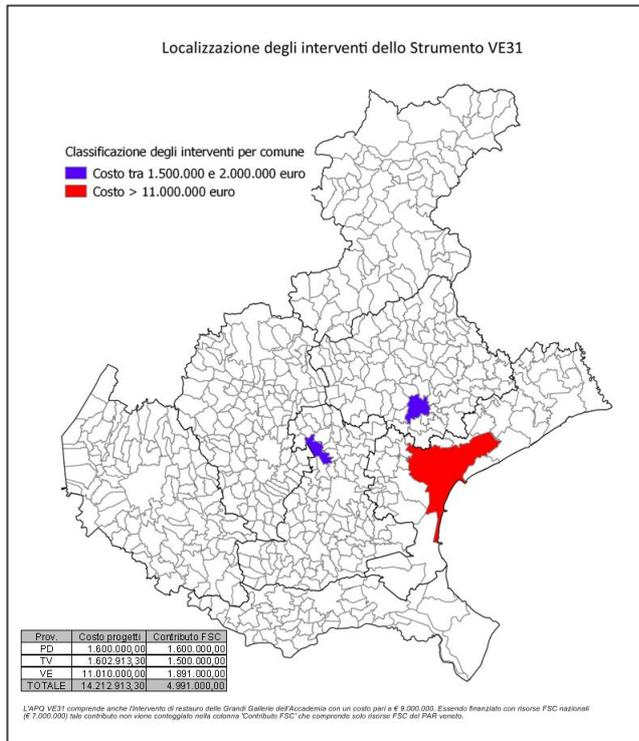

L'APQ "VE31" è stato sottoscritto il 10 luglio 2014 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione del Veneto e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Tra i soggetti sottoscrittori, per la Regione del Veneto ci sono la Struttura competente per la programmazione del FSC (AdG) e la Struttura Responsabile di Attuazione della Linea di intervento 3.1 (SRA – Sezione Beni Culturali).

Con questo APQ sono state programmate le prime risorse FSC di questa Linea per un importo pari a € 4.991.000,00. La Regione del Veneto ha proposto 3 interventi per un costo complessivo di € 5.212.913,30. Due di questi

interventi al momento dell'inserimento nel sistema informatico, sono stati suddivisi per monitorare i due stralci di ciascuno. Inoltre, nell'APQ è stato inserito un intervento, dal costo di 9 Meuro con un contributo FSC pari a 7.000.000,00 La quota FSC destinata a quest'ultimo intervento non è del PAR del Veneto bensì di parte nazionale; in sede di predisposizione dell'APQ in oggetto, è stato deciso, su proposta delle AACC competenti, di inserire nell'Accordo anche l'intervento molto importante per la cultura veneta e nazionale, consistente nel restauro delle Gallerie dell'Accademia, che ha trovato coperture nella risorse FSC nazionali. In totale sono 6 gli interventi inseriti ora nel sistema con un costo di € 14.212.913,30.

In considerazione della sua recente sottoscrizione, la spesa realizzata ammonta a soli € 350.000,00 e non sono ancora stati effettuati pagamenti.

Per quanto riguarda la fase procedurale, tre progetti sono nello stato di "definitivo" mentre altri tre, al 31/12/14, sono ancora nello stato di preliminare.

È da segnalare che l'intervento relativo a Villa Contarini (VE31P003 e VE31P004), in considerazione delle specificità dell'immobile, sta evidenziando un degrado maggiore rispetto alle previsioni, con conseguente maggiore onerosità dei lavori di restauro. È pertanto ipotizzabile che l'intero ammontare delle risorse destinate a questo complesso monumentale, possano essere riservate al primo stralcio, rinviando a tempi successivi il finanziamento del secondo.

I sei interventi si concluderanno entro il 2018.

Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC in interventi
Progettazione Preliminare	3	2.940.000,00	2.940.000,00
Progettazione Definitiva	3	11.272.913,30	2.051.000,00
TOTALE	6	14.212.913,30	4.991.000,00

Tabella 15 - Avanzamento procedurale dell'APQ VE31 al 31/12/2014

Come riportato sopra, nella descrizione della Priorità 5, con la riprogrammazione di fine 2014, sono stati individuati ulteriori interventi a regia regionale e sono già stati emanati due bandi, le cui risposte sono ora in fase di istruttoria. Nel primo semestre del 2015 si predisporrà un atto integrativo all'APQ.

2.6. Stato di attuazione analitico dei SAD


Nel corso del 2014 ci sono stati avanzamenti su tutte le Linee di intervento del PAR e pertanto sono state avviate procedure per l'attuazione degli Strumenti di Attuazione Diretta. Per tutte le Linee si ricorda il processo di riprogrammazione che si è concluso con l'approvazione da parte della Giunta e con la ratifica da parte del Comitato di Sorveglianza del 8 gennaio 2015. Per alcune Linee, gli avanzamenti procedurali hanno consentito di individuare e finanziare alcuni interventi e pertanto i dati di questi ultimi sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio e si possono rappresentare in questa Rapporto.

Per quanto non rappresentato in questo paragrafo si rimanda a quanto riportato per le diverse Priorità del QSN più sopra nel documento.

SAD	Numer o Proget ti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VE11 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Riduzione consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	22	14.767.902,06	877.927,40	249.150,56
VE42 - Mobilità sostenibile - Impianti a fune	29	67.355.817,08	19.708.026,92	0,00
VE53 - Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	34	19.143.963,00	3.712.224,03	1.313.443,28
VE61 - Realizzazione Attività di Assistenza Tecnica	5	3.226.987,80	1.551.987,70	701.412,12
VE62 - Realizzazione Attività di Assistenza Tecnica - Valutazione, studi e ricerche	1	151.581,92	151.581,92	68.040,67
Totale	91	104.646.251,86	26.001.747,97	2.332.046,63

Tabella 16 - Avanzamento finanziario dei SAD alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

2.6.1. SAD VE11 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile

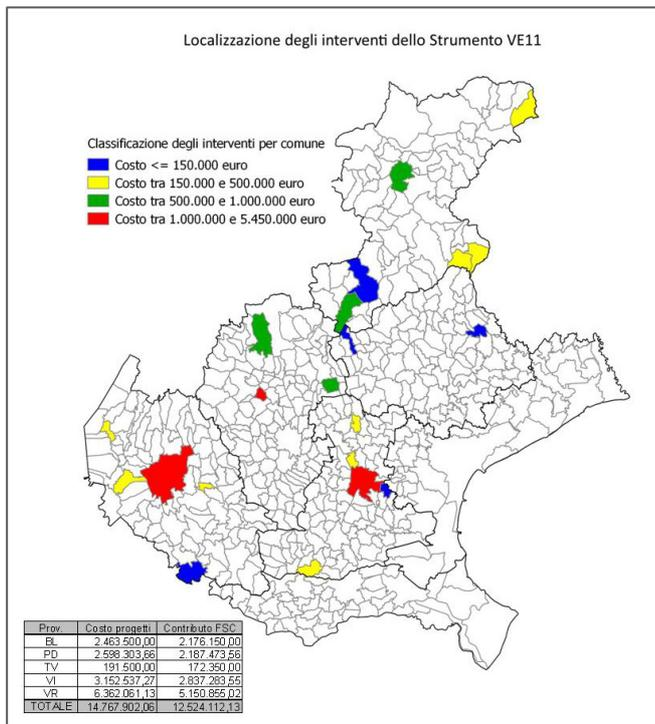

Nel corso del 2014, si sono create le condizioni per portare nel sistema informativo i 19 progetti a regia regionale la cui selezione era iniziata a fine 2013, con la presentazione degli stessi al Tavolo del Partenariato. Anche nel 2014 sono state selezionate ulteriori due iniziative (suddivise in tre interventi) che sono ora nel sistema di monitoraggio.

Si riporta sotto il contributo delle diverse fonti di finanziamento a copertura dei costi dei progetti.

SAD	Numero Progetti	Costo	FSC	Risorse comunali	Risorse provinciali	Altro pubblico
VE11	22	14.767.902,06	12.524.112,13	958.289,93	15.500,00	1.270.000,00

Tabella 17 - Piano finanziario del SAD VE11 alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

Gli impegni e i pagamenti, come pure il costo realizzato, che ammontano a € 712.990,53, sono in linea con le attese, considerando il recente avvio di questo strumento.

Stante a tipologia dei progetti finanziati, si prevede di completare questa prima serie di interventi entro i 2017 con la spesa realizzata essenzialmente nel 2015 e 2016.


Tutti gli interventi rientrano nella tipologia opere pubbliche e sono nelle fasi procedurali sotto riportate.

Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC in interventi
Progettazione Preliminare	10	3.878.130,93	3.432.156,50
Progettazione Definitiva	2	1.267.771,13	1.140.994,02
Progettazione Esecutiva	6	4.848.900,00	4.213.483,52
Esecuzione Lavori	3	4.443.100,00	3.574.316,48
Collaudo	1	330.000,00	163.161,61
TOTALE	22	14.767.902,06	12.524.112,13

Tabella 18 - Avanzamento procedurale del SAD VE11 al 31/12/2014

Per ulteriori informazioni in merito alle attività attuate per questo Strumento, attuativo della Priorità 3 si rinvia più sopra in questo Rapporto.

2.6.2. SAD VE42 - Mobilità sostenibile - Impianti a fune

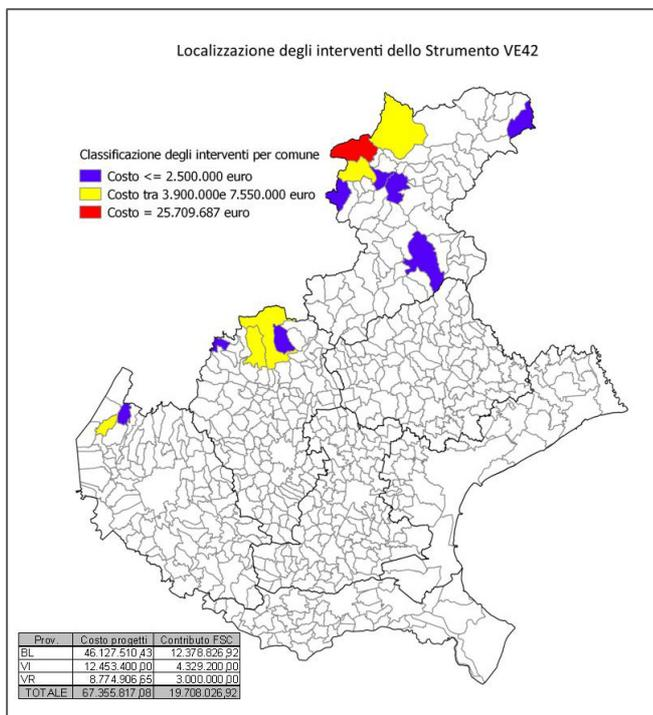

Anche per la Linea di intervento 4.2, nel corso del 2014 si sono create le condizioni per il finanziamento degli interventi selezionati tramite bando, avviato con DGR n.1700 del 24 settembre 2013.

I progetti ora presenti nella Base Dati Unitaria sono 29. In seguito all'istruttoria delle domande pervenute, gli interventi ammessi sono stati 32 per un contributo complessivo FSC pari a € 24.185.693,92. L'intervento per la realizzazione della nuova funivia "SAS del Mul (2630)-Serauta (2940)", cui spetterebbe un contributo FSC di € 3.000.000,00, è stato ammesso con riserva in quanto non è stato possibile definire con certezza la competenza

territoriale dell'area interessata (il confine con il Trentino che passa per la Marmolada non è ben definito) e pertanto non è ancora stato inserito nel sistema informatico.

Due ulteriori interventi, di cui uno monitorato al 31/10/2014 (contributo € 67.567,00) e uno mai inserito nel sistema informativo (contributo € 1.410.000,00), hanno rinunciato al contributo FSC rendendo disponibili risorse per ulteriori interventi.


SAD	Numero Progetti	Costo	FSC	Risorse privati
VE42	29	67.355.817,08	19.708.026,92	47.647.790,16

Tabella 19 – Piano finanziario del SAD VE42 al 31/12/2014

I 29 interventi dello Strumento VE42 sono del tipo “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” e sono tutti nello stato procedurale “Concessione finanziamento”. Infatti, gli impegni a favore dei soggetti attuatori degli interventi sono stati assunti sul bilancio regionale con DGR 2370 del 16/12/2014. In considerazione del recente provvedimento di finanziamento, al 31/12/2014 la spesa realizzata e i pagamenti sono nulli.

Anche per questo Strumento si prevede di certificare la spesa entro il 2017 con consistenti erogazioni nel 2016.

2.6.3. SAD VE53 - Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio

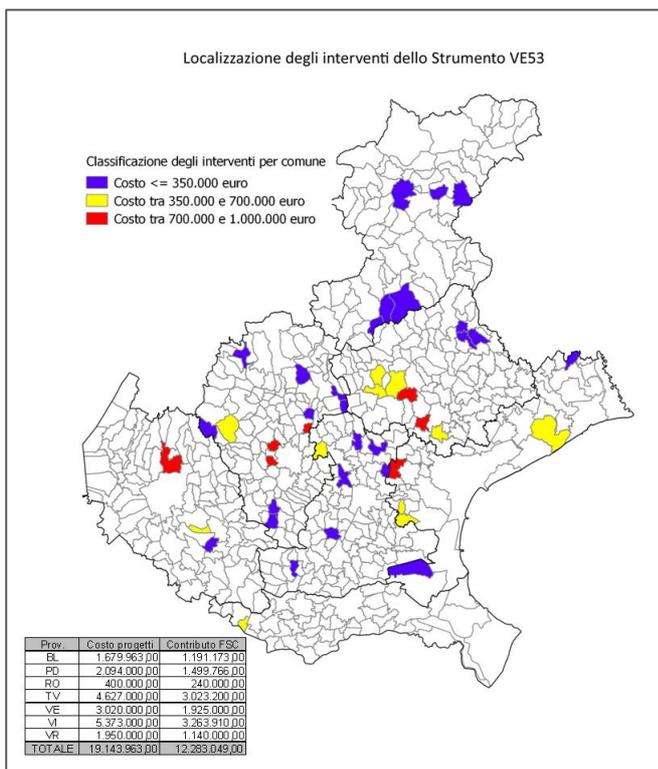

La selezione degli interventi inseriti in questo Strumento si è conclusa già nel 2013 con l'approvazione di una prima graduatoria ottenuta dalle risultanze del bando pubblicato nel maggio 2013. Tuttavia, gli interventi sono stati inseriti a sistema soltanto nel corso del 2014, dopo la sottoscrizione dei disciplinari da parte dei soggetti attuatori.

Gli interventi ora monitorati sono 34 e prevedono una consistente partecipazione finanziaria delle Amministrazioni comunali.

SAD	Numero Progetti	Costo	FSC	Risorse Comunali	Risorse Altro pubblico
VE53	34	19.143.963,00	12.283.049,00	6.652.124,00	208.790,00

Tabella 20 - Avanzamento procedurale del SAD VE53 al 31/12/2014

I 34 interventi dello Strumento VE53 sono del tipo “Realizzazione di opere pubbliche” e sono così suddivisi nelle diverse fasi procedurali:

Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC in interventi
Progettazione Preliminare	4	1.415.000,00	1.034.750,00
Progettazione Definitiva	7	3.971.000,00	2.359.200,00
Progettazione Esecutiva	18	10.407.963,00	6.868.099,00
Esecuzione Lavori	5	3.350.000,00	2.021.000,00
TOTALE	34	19.143.963,00	12.283.049,00

Tabella 21 - Avanzamento procedurale del SAD VE53 al 31/12/2014

Considerando che gli interventi sono stati attivati in due momenti successivi (il secondo blocco di 11 interventi - per un importo FSC pari a € 3.468.950,00 - è stato approvato con DGR 1422 dell'agosto 2014), si ritiene che i progetti siano in linea con le aspettative. I lavori per alcuni interventi sono già iniziati ed è iniziata la rendicontazione.

Tutti gli interventi termineranno entro il 2017. In considerazione degli importi relativamente ridotti dei progetti, si prevede il picco della spesa nel 2015. Nel 2016 la maggior parte dei lavori sarà terminata, lasciando al 2017 essenzialmente le spese per il collaudo.

Sempre nell'ambito dell'attuazione di questa Linea di Intervento, a fine 2014 la Giunta regionale ha deciso il finanziamento di ulteriori 40 interventi utilizzando i rimanenti € 20.972.976,00 a disposizione, che saranno monitorati a partire dal 2015.

2.6.4. SAD VE61 e VE62 - Assistenza Tecnica

I dati sotto riportati si riferiscono ai due SAD dell'Asse 6 “Assistenza tecnica”. Per quanto riguarda il SAD con codice “**VE61**”, tre dei cinque progetti inseriti a sistema si riferiscono a personale assunto a tempo determinato per il supporto nelle operazioni di gestione, monitoraggio, certificazione e controllo relativo agli interventi del PAR. Per quanto riguarda i pagamenti,

trattandosi di stipendi per personale assunto a metà dicembre 2013, vengono valorizzati nel corso degli anni e ad oggi ammontano a € 700.307,05.

Per quanto riguarda gli ulteriori due progetti, uno destina € 15.000 per le spese di missione del personale regionale dedicato al PAR per il triennio e a fine 2014 sono stati spesi € 1.105,07.

Il secondo invece è relativo all'affidamento dell'incarico la declinazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) attraverso lo sviluppo di piste di controllo e check list al fine di dare garanzia della spesa certificata. Pur non mostrando pagamenti, il progetto è in fase di attuazione e si presume di concluderlo nel corso del 2015.

Il SAD con codice “**VE62**” si riferisce all'incarico affidato al valutatore indipendente. Come spiegato più avanti in questo Rapporto, l'attività del valutatore ha avuto inizio nel dicembre 2012 (il documento di valutazione ex ante, predisposto dallo stesso soggetto valutatore, è stato finanziato con risorse FSC 2000-2006 e di conseguenza non è oggetto di valutazione in questo RAE), pertanto i pagamenti monitorati si riferiscono alla fornitura del Disegno di valutazione mentre l'importo restante sarà erogato in concomitanza con la presentazione dei successivi prodotti.

I progetti degli Strumenti VE61 e VE62 rientrano nella categoria “Acquisizione di beni e servizi” e sono nella fase procedurale “Esecuzione fornitura”. La spesa realizzata per l'insieme dei progetti dei due Strumenti ammonta a € 750.652,57.

SAD	Numero Progetti	Costo	FSC
VE61	5	3.226.987,80	3.226.987,80
VE62	1	151.581,92	151.581,92

Tabella 22 – Piano finanziario dei SAD dell'Asse 6 “Assistenza Tecnica” al 31/12/2014

2.7. Stato di attuazione analitico delle Azioni cardine

Al fine di rendere più efficace l'utilizzo delle risorse per la coesione territoriale, la delibera CIPE 166/2007 ha previsto che nei PAR vengano identificate delle azioni "cardine", indipendentemente dal fatto che si tratti di progetti specificatamente definiti e localizzati, oppure interventi articolati in una serie di componenti progettuali distinti ma connessi e riconducibili ad un medesimo obiettivo,. Su queste Azioni, il CIPE, nel 2007, ha richiesto che venga associata una quota significativa di risorse in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi della strategia complessiva delineata dal PAR. Per questa ragione il Veneto, in sede di prima stesura del PAR, aveva stanziato oltre 315 Meuro equivalenti al 61,43% delle risorse disponibili per gli Assi del PAR stesso.

Come detto più sopra nel documento, per far fronte alla riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni, sono stati apportati dei tagli alle dotazioni FSC dei Programmi Attuativi Regionali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto tali riduzioni sono state quantificate (seppur in via provvisoria) nell'importo di ad € 163.763.681,99 e come spiegato più sopra nel paragrafo relativo alla riprogrammazione, la giunta Regionale, nel riproporzionare i relativi importi disponibili per le diverse Linee di intervento, ha tenuto anche conto della fattibilità degli interventi in relazione ai limiti temporali imposti dalla delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014.

Proprio in ragione della fattibilità degli interventi nei tempi sopra citati, la Linea di intervento relativa al SFMR è stata decurtata in modo significativo. Allo stesso tempo, in considerazione della fragilità del territorio veneto, nella riprogrammazione si è preferito aumentare lo stanziamento per la difesa del suolo, rendendo di fatto non rispettabile quanto stabilito dalla delibera CIPE 166/2007, in termini di incidenza percentuale delle Azioni cardine sul Programma.

Il PAR del Veneto prevede 4 Azioni cardine per un importo complessivo attuale di € 173.245.672,58 e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti per le Priorità 3, 5, 6 e 7.

Azione cardine	Importo	% su totale risorse PAR	Linee intervento interessate
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale	14.485.456,41	4,14	4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)
Piste ciclabili	35.000.000,00	10,01	4.4 Piste ciclabili
Qualità dell'Atmosfera (Riduzione del PM10)	79.013.585,17	22,60	1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici
			1.2 Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile
Sostegno alle iniziative di sviluppo locale	44.746.631,00	12,80	5.2 Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili
			5.3 Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio
Totale	173.245.672,58	49,55	

Tabella 23 – Azioni cardine del PAR

Come si vede nella tabella sopra riportata la percentuale dedicata alle Azioni cardine è scesa al di sotto del 50% ma anche la distribuzione delle risorse tra queste Azioni è cambiata in modo significativo. In particolare si evidenzia la riduzione delle risorse destinate al SFMR.

A fine 2014, tra gli interventi presenti nel sistema di monitoraggio, è possibile rappresentare anche interventi delle Linee 1.1 e 5.3, entrambe rientranti tra le Azioni cardine del PAR, non presenti a fine 2013. Non è pertanto ancora possibile riportare un confronto con lo stato di anni precedenti. D'altra parte, nel corso del 2014 si sono svolte attività che non è ancora possibile illustrare con dati di monitoraggio e che saranno invece presenti a fine 2015. In questo rapporto si riportano comunque delle brevi descrizioni di queste Azioni cardine al fine di inquadrarle nel contesto del documento di programmazione FSC.

2.7.1. Azione cardine “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”

Questa Azione aveva l'obiettivo di ridurre il deficit relativo alle infrastrutture di trasporto nel Veneto proseguendo alcune iniziative già avviate e in parte finanziate con la precedente programmazione FAS 2000-2006. Dal 2001 infatti sono stati sottoscritti 6 Accordi di Programma Quadro per attuare interventi infrastrutturali nel settore stradale. Questa Azione, di grandissima rilevanza strategica, interviene a supporto del sistema ferroviario del Veneto centrale non limitando gli interventi alle sole infrastrutture ferroviarie, ma con l'obiettivo di creare un sistema di trasporto con un alto grado di complementarità tra ferro e gomma, migliorando il servizio ferroviario, garantendo collegamenti

veloci e confortevoli, ma anche di riducendo significativamente la congestione delle strade, l'inquinamento atmosferico e acustico nonché il tasso di incidenti stradali.

A questa Azione il PAR aveva riservato € 100.000.000 che rappresentavano quasi un quinto dell'intero piano finanziario dello stesso. È da segnalare comunque che, in adempimento a quanto previsto dal D.L. 69/2013, la Regione del Veneto già nel 2013 ha destinato € 21.157.916,51 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per garantire il servizio di trasporto pubblico locale a tutto il 2012. Pur non trattandosi di un intervento infrastrutturale, e sebbene non previsto dal PAR, si ritiene che la destinazione di questi 21 Meuro sia pienamente coerente con le finalità dell'Azione cardine in questione.

È da ricordare che a giugno del 2014, il CIPE, con delibera 21 del 30 giugno, ha posto dei limiti temporali per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti relative agli interventi finanziati con FSC, fissandoli al 31/12/2015 o al 30/06/2016 (ma in quest'ultimo caso con una penalizzazione del 1,5%). Tali scadenze sono incompatibili con l'iter procedurale dei grandi interventi infrastrutturali identificati nel 2013. In considerazione di questa data limite, in sede di rimodulazione del piano finanziario del PAR, la DGR 2463 del dicembre 2014, pur confermando soltanto uno dei progetti presentati inizialmente al Tavolo del Partenariato, ha deciso di finanziare anche alcuni lavori di messa in sicurezza e controllo della circolazione della linea Mestre-Adria, tratta integrante del SFMR, con un contributo previsto pari a circa 10 Meuro.

2.7.2. Azione cardine “Piste ciclabili”

Anche questa Azione cardine, al pari del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, è volta a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e a decongestionare il traffico urbano promuovendo allo stesso tempo una modalità alternativa di trasporto. Oltre ai benefici appena citati, è indubbio che lo sviluppo di piste ciclabili e l'incentivazione del loro utilizzo, risponde anche ad un desiderio di mobilità alternativa, ed in particolare dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto della popolazione veneta.

Gli interventi di questa Azione potranno infatti essere attuati anche tramite la creazione di percorsi ciclabili anche extraurbani con la conseguente incentivazione di un turismo sostenibile.

Nel settembre 2014, con DGR 1724 è stato emanato un bando concernente la realizzazione di piste ciclabili con lo scopo di fornire un apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane - periurbane e costituiscano un'opportunità di sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale. Le risposte a questo bando sono state numerose e nei primi mesi del 2015 saranno individuati i relativi interventi. Per questa Azione dunque, al momento, non

sono stati avviati interventi ma in sede di ridefinizione del piano finanziario del PAR le risorse destinate a questa Azione (€ 35.000.000) sono state confermate.

Questa Azione è attuata con la sola Linea 4.3 “Piste ciclabili” che rientra nella Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità” descritta sopra.

2.7.3. Azione cardine “Qualità dell’Atmosfera (Riduzione del PM10)”

Per tutta la Pianura Padana, l’inquinamento atmosferico rappresenta ormai un problema destinato ad aggravarsi nel prossimo futuro se non si attueranno delle azioni correttive. Le fonti di inquinamento sono ormai note e a grandi linee si possono ricondurre al traffico automobilistico (urbano ed extra urbano), agli impianti di riscaldamento e alle attività produttive.

Da ciò discende la necessità di intervenire attraverso la promozione di modalità di trasporto sostenibile, riduzione dei gas degli impianti di riscaldamento nelle città e al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti. Molto importante, rispetto alla Priorità 3, è inoltre il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Per questa Azione cardine già nel 2013 sono state avviate delle attività che hanno prodotto dei risultati, seppure non rilevati nel sistema di monitoraggio e nel Rapporto dello scorso anno. A novembre 2013 sono stati infatti presentati al Tavolo di Partenariato 19 progetti, a regia regionale, in attuazione della Linea di intervento 1.1, per un contributo complessivo di 6,84 Meuro. Nel 2014 sono stati inoltre sottoposti al TdP, e successivamente finanziati, altri due interventi (nel sistema di monitoraggio uno di questi è stato suddiviso in due stralci) per l’efficientamento energetico di due grandi edifici pubblici a Verona e Padova. Su questi ultimi interventi sono state allocate risorse FSC pari a € 5.680.000. Nel sistema informatico sono ora presenti 22 interventi per un totale FSC pari a 12.524.112,13 euro.

Come riportato anche nel paragrafo di cui sopra, relativo alla Priorità 3, nel 2014 sono stati emanati due bandi per interventi di reti di illuminazione pubblica e per l’efficientamento di edifici pubblici. A inizio 2015 l’istruttoria e la selezione degli interventi si è conclusa e verranno presto inseriti nel sistema di monitoraggio progetti per oltre 33 Meuro.

Per quanto riguarda la Linea 1.2, sempre attuativa di questa Azione cardine, nel 2014 è stata avviata un’iniziativa volta a concedere un contributo per il rinnovo del parco automezzi per il trasporto pubblico nei centri urbani dei capoluoghi di provincia per un contributo pari a 10.000.000,00 euro. I dati relativi alla fase di finanziamento di questi 9 interventi (4 Meuro per 2 interventi nel settore tramviario e 6 Meuro per 7 iniziative per autobus), pur essendosi conclusa con DGR 1606 del settembre 2014, a fine 2014 non sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio e pertanto non sono riportati nelle tabelle di questo RAE.

È da segnalare che la Giunta regionale con propria delibera 2199 del dicembre 2014 ha deciso il finanziamento di automezzi anche per le linee suburbane ed extraurbane e allo stesso tempo ha ritenuto non più vincolante la destinazione di almeno il 40% agli automezzi tramviari in considerazione delle priorità del TPL del Veneto. Tale decisione è stata successivamente ratificata dal CdS del 8 gennaio 2015.

2.7.4. Azione cardine “Sostegno alle iniziative di sviluppo locale”

Lo sviluppo locale è l’insieme delle politiche che tendono a creare un contesto favorevole per la valorizzazione delle risorse del territorio. Si tratta pertanto di una Linea che può essere trasversale a molti settori e i cui stessi interventi assumono valore non tanto nella politica settoriale di riferimento bensì rispetto ad un determinato territorio.

Per l’individuazione dei relativi interventi la Regione del Veneto ha previsto un approccio “bottom-up”, offrendo la possibilità agli Enti Pubblici Locali e alle parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale attraverso le Intese Programmatiche d’Area (IPA – strumento previsto dalla L.R. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”) e formulando proposte per lo sviluppo di aree territoriali sub regionali.

Rispetto a questa modalità di programmazione, il Veneto ha sviluppato un’esperienza pluriennale mirando all’efficacia dell’impiego delle risorse e alla soddisfazione delle esigenze espresse dalle realtà locali.

In sede di ridefinizione del piano finanziario del PAR, in considerazione dei pesanti tagli alle risorse FSC regionali, la Giunta con propria DGR 2199/14 ha azzerato la Linea di intervento 5.1 “Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico” (che rispondeva alla Priorità 4 del QSN) e riducendo anche la disponibilità per le rimanenti due Linee dell’Asse 5.

Lo stanziamento per questa Azione cardine ammonta pertanto a € 44.746.631,00 con una riduzione di quasi 35,4 Meuro rispetto a quanto previsto dalla versione iniziale del PAR.

Sullo stato di attuazione di questa Azione si rimanda al paragrafo “Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo” e al paragrafo sullo Strumento SAD VE53.

2.8. Cronoprogramma di spesa FSC

Nella tabella sotto riportata viene illustrato il profilo annuale di spesa del FSC. Quanto indicato è desunto dai dati di monitoraggio presenti in SGP, pertanto le previsioni di spesa si limitano ai soli progetti degli APQ e dei SAD inseriti nel sistema informatico. Ne deriva una rappresentazione parziale che non tiene conto dei progetti che saranno inseriti nel corso del 2015.

Il cronoprogramma di spesa è stato comunicato dai Responsabili degli interventi e i relativi dati sono stati confrontati con l'iter procedurale degli stessi dimostrandone la coerenza.

È da evidenziare che la spesa sostenuta si riferisce essenzialmente agli interventi inseriti nell'APQ sottoscritto per la Difesa del suolo (Asse 2) finanziati con il FSC ma avviati in tempi precedenti alla stipula del relativo Strumento Attuativo.

Il cronoprogramma di spesa riportato sotto rispecchia l'attuazione del PAR, iniziato a fine 2012 ma che ha avuto una forte accelerazione nel 2014 anche in ragione dell'emanazione della delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 che ha individuato il 31 dicembre 2015 come data ultima per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le iniziative avviate nel 2014 dovrebbero effettivamente mostrare un significativo aumento della spesa realizzata già nel corso del 2015.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL PAR		
Anno	Costo Realizzato PAR	Costo da Realizzare PAR
2007	100.000,00	0,00
2008	12.149,70	0,00
2011	2.976,20	0,00
2012	471.499,81	0,00
2013	7.982.275,97	0,00
2014	11.034.162,73	0,00
2015	0,00	58.959.059,17
2016	0,00	60.671.117,4
2017	0,00	19.341.448,27
2018	0,00	45.175,21
Totale	19.603.064,41	139.016.800,05

Tabella 24 – Cronoprogramma di spesa del PAR alla versione di monitoraggio del 31/12/2014

2.9. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

Per il PAR del Veneto non ci sono state sanzioni. Le sanzioni previste dalla delibera CIPE 1/2009 in caso di mancato rispetto di alcune date in questa indicate, in merito ad impegni o livelli di progettazione approvata, stante il ritardo di avvio dei PAR, non sono state applicate. Come peraltro, stante il livello di attuazione degli interventi e della spesa realizzata, non sono emersi elementi da sanzionare.

2.10. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Le disposizioni inerenti il circuito finanziario, ed in particolare i trasferimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico alle regioni, descritte nel punto 7.1 della delibera CIPE 166/2007, prevedono un primo trasferimento a titolo di anticipo pari all'otto per cento del piano finanziario del PAR, mentre i successivi trasferimenti sono condizionati al raggiungimento di determinate soglie di spesa realizzata. Per la Regione del Veneto, tale trasferimento è stato quantificato in € 41.073.520 ed è stato accertato e riscosso nel mese di ottobre 2012. Questo introito, con la conseguente disponibilità delle risorse nel sistema contabile, ha reso possibile avviare procedure per assumere gli impegni a garanzia delle operazioni selezionate limitatamente alla quantità di risorse ricevute.

La ormai pluriennale e persistente crisi finanziaria, ha portato all'approvazione di norme che riducono la disponibilità delle risorse FSC per le Regioni. Alcuni "tagli" operati sulla disponibilità FSC per la Regione del Veneto sono stati adottati prima dell'approvazione finale del PAR veneto e pertanto il quadro finanziario sancito dalla delibera CIPE 9/2012 ne ha già tenuto conto riducendo la disponibilità definita dalla delibera CIPE 166/2007 in ragione di quanto approvato con successive delibere CIPE 1/2009 e 1/2011. Diverso impatto ha avuto invece il D.L. 95/2012 che ha disposto una riduzione delle risorse FSC assegnate alle Regioni a statuto ordinario con la Delibera CIPE 14/2013 che quantifica i possibili tagli alle dotazioni dei PAR stabilendo per il Veneto una riduzione di 69,4 Meuro per l'annualità 2015.

Già queste disposizioni, intervenute dopo la presa d'atto del PAR, hanno creato un clima di incertezza rispetto alle risorse disponibili che, unitamente alla mancanza di impegni contabili a favore della Regione del Veneto, ha ostacolato le operazioni di accertamento, e pertanto la possibilità di impegnare, rendendo di conseguenza impraticabile l'avvio concreto degli interventi fino al giugno 2014.

Si evidenzia, inoltre, che la delibera CIPE 21/2014, con l'obiettivo di accelerare l'utilizzo delle risorse FSC messe a disposizione per il periodo 2017-2013, ha posto come data limite per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) il 31/12/2015.

Ora, come è noto, la presa d'atto del PAR del Veneto da parte del CIPE, a differenza dei PAR di altre Regioni, è avvenuta solo a gennaio del 2012, dopo una lunga fase di negoziazione con il DPS ed è chiaro pertanto che quanto stabilito con la delibera 21/2014 ha creato una disparità di trattamento tra Regioni e una conseguente penalizzazione per il Veneto che ha avviato l'attuazione del PAR in tempi successivi rispetto ad altri Programmi.

I tagli alla dotazione finanziaria del PAR Veneto, come pure la necessità di rivedere le scelte iniziali alla luce della tempistica per l'aggiudicazione degli interventi, ha imposto alla Regione di formulare una proposta di riprogrammazione che tenga conto sia della disponibilità finanziaria aggiornata, sia della effettiva fattibilità degli interventi nei tempi richiesti.

Tale proposta di riprogrammazione, è scaturita dopo un confronto con tutte le Strutture Responsabili di Attuazione delle diverse Linee di intervento ed ha permesso di formulare non solo il nuovo piano finanziario ma anche la lista degli interventi e/o iniziative da portare a finanziamento nell'ambito del programma.

Come riportato nella parte iniziale di questo Rapporto, la Giunta Regionale ha preso atto della nuova disponibilità finanziaria al 31/12/2014 adottando la delibera 2463/2014 che è stata la base di discussione per il Comitato di Sorveglianza del 8 gennaio 2015.

2.11. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Le principali modifiche al PAR nell'ambito di attuazione sono descritte nel paragrafo che precede e nel paragrafo denominato "Rimodulazione del piano finanziario del PAR" più sopra in questo Rapporto.

Tali modifiche, resesi necessarie per il recepimento dei consistenti tagli decisi dalla normativa nazionale, e approvate in CdS del 8 gennaio 2015, hanno portato anche a riconsiderare le Azioni cardine che riducono la loro dimensione sia in termini assoluti che percentuali.

Per quanto riguarda invece gli aggiustamenti del testo del PAR, resesi necessari per procedere al finanziamento di alcune iniziative, si rimanda al capitolo sulla sorveglianza in quanto approvati in sede di CdS.

2.12. Valutazione e sorveglianza

2.12.1. Valutazione

Con DGR n. 543 del 11 marzo 2008 è stato approvato il Piano di Valutazione (PdV) della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) della Regione del Veneto 2007/2013. L'approvazione di tale PdV è stato richiesto dal QSN e dal punto 6 della delibera CIPE 166/2007.

Pertanto, anche per il Veneto la Giunta Regionale ha deciso di procedere con un PdV comprensivo dei Fondi Strutturali FSE, FESR e del Fondo FAS, che oltre ad affrontare la tematica della valutazione, ha approvato anche l'organizzazione per la Governance della Programmazione Regionale Unitaria. In questo modello di organizzazione, la Segreteria Generale della Programmazione assicurava il coordinamento e la sinergia tra le varie linee di azione. Veniva poi previsto un Gruppo permanente di lavoro con la partecipazione di tutte le AdG dei programmi interessati.

Naturalmente, ai fini della programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione della PRU venivano coinvolte anche le strutture responsabili di attuazione, la Direzione statistica (ora Sezione Sistema Statistico Regionale), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione (NUVV) oltre al valutatore esterno.

La predisposizione del PdV è stata fatta nel rispetto dei tempi stabiliti dalla delibera 166/2007 e pertanto il Piano è stato consegnato nei primi mesi successivi all'approvazione della delibera stessa. Il contesto nel quale si stavano muovendo le Amministrazioni faceva intravedere un immediato avvio della programmazione unitaria, con il FAS che affiancava la componente comunitaria della programmazione per la coesione territoriale, al contrario invece, l'avvio dei PAR, e di quello veneto in particolare, è stato differito di molto, rendendo difficile la sinergia nell'utilizzo dei diversi fondi con conseguenze anche nelle attività di governo e valutazione.

È da segnalare che, alla fine del 2013, le strutture regionali della Regione del Veneto sono state oggetto di una importante riorganizzazione, adottata con DGR 2611 del 30 dicembre, che ha interessato anche la PRU e la Gestione del PAR FSC, rendendo superato il modello organizzativo proposto nel PdV.

Come già accennato, per quanto riguarda la scelta del valutatore, la Regione del Veneto ha scelto di ricorrere ad un valutatore esterno. Tale scelta risponde alle esigenze di terzietà e indipendenza necessarie per la conduzione delle valutazioni ed è in linea con il QSN che richiede l'individuazione di valutatori esterni almeno per alcune tipologie di valutazioni.

In ottemperanza a ciò e in ragione della particolarità del FSE in rapporto agli altri fondi, si sono espletate due procedure per l'individuazione del soggetto valutatore: una per il FSE e una per il FESR e FAS.

Per quanto riguarda il FAS, il PdV prevedeva un rapporto annuale fino al 2018 e alcune valutazioni specifiche su alcune tematiche da individuare e approfondire. In ragione della mancata presa d'atto del PAR da parte del CIPE, il percorso valutativo degli interventi FSC, è iniziato con il primo rapporto di valutazione, riferito al 31/12/2013, fornito nel mese di aprile 2014. La scarsità delle azioni svolte nel 2012 non consentiva infatti di sviluppare un rapporto di valutazione significativo né per la governance del PAR stesso né per il partenariato istituzionale, economico e sociale.

I successivi rapporti di valutazione saranno forniti nei mesi di aprile 2015 e aprile 2016. Sempre nel mese di aprile 2016 sarà consegnata, da parte del valutatore anche una relazione conclusiva.

L'attività del valutatore ha portato comunque alla definizione del "Disegno di valutazione", un documento che, come già detto, definisce puntualmente i temi e le domande verso le quali si focalizzerà la valutazione nonché i metodi utilizzati e i tempi di consegna dei prodotti.

Questo Disegno di valutazione è stato predisposto dal valutatore in completa sinergia con l'AdG e contiene le Domande di valutazione nonché il contesto operativo e metodologico nel quale il valutatore opererà.

La fase embrionale della valutazione ci consente di elencare soltanto la denominazione delle Domande di valutazione, rimandando ai prossimi Rapporti osservazioni più puntuali e complete:

- D.V. 1 - L'adeguatezza della strategia del Programma rispetto alle traiettorie di sviluppo regionale;
- D.V. 2 - La capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi prefissati;
- D.V. 3 - La tutela del territorio quale fattore che garantisca stabilità, sicurezza ed attrattività;
- D.V. 4 - Lo Sviluppo locale quale leva per una maggiore attrattività regionale.

Sempre in fase di condivisione del Disegno di valutazione, l'AdG ha coinvolto le Strutture Responsabili di Attuazione per richiedere una conferma o una revisione degli indicatori già definiti nel PAR. La stesura del PAR risale infatti al 2008 e pertanto, in considerazione dell'effettivo avvio delle attività, è stato possibile ridefinire gli indicatori in modo tale che siano pertinenti rispetto agli interventi e ai fenomeni che devono descrivere e che siano effettivamente quantificabili. Sono stati inoltre ridefiniti i valori obiettivo di questi indicatori alla luce della dimensione e tipologia degli interventi che si presume ora di realizzare.

Allo scopo di coinvolgere il partenariato nel processo di valutazione, il Disegno di valutazione è stato presentato al Comitato di Sorveglianza il 26 novembre 2013, che vede tra i suoi componenti anche una rappresentanza delle parti economiche e sociali.

Si deve inoltre segnalare che il CIPE, in sede di presa d'atto del PAR del Veneto, con propria delibera n. 9/2012 ha subordinato l'avvio del PAR stesso alla presentazione al DPS della valutazione ex ante del programma e delle Azioni cardine. Tale documento di valutazione è stato redatto dal valutatore esterno e presentato al DPS il 5 luglio 2012. In considerazione del fatto che

l'Amministrazione Regionale non poteva richiedere il primo trasferimento di risorse a titolo di anticipo, il documento di valutazione ex ante è stato finanziato con risorse di Assistenza tecnica FSC del periodo di programmazione 2000-2006.

2.12.2. Sorveglianza

I compiti del Comitato di Sorveglianza (CdS) sono descritti già nel PAR e vengono ripresi anche nel Manuale SI.GE.CO. nella parte relativa alla governance.

Il CdS per il Programma Attuativo veneto è stato costituito con la DGR 725 del 28/6/2011 che ne ha definito funzioni e compiti, stabilendone la presidenza in capo al Presidente della Giunta Regionale o ad un suo delegato e delineandone una composizione, comprensiva dei responsabili delle Strutture di Attuazione, che meglio conoscono le problematiche di settore, tale da consentirgli di adottare le opportune decisioni in merito ad eventuali problematiche attuative.

La composizione del CdS prevede altresì la partecipazione del partenariato istituzionale sociale ed economico, attraverso le sue organizzazioni territoriali più rappresentative, dal quale è possibile recepire le indicazioni da parte del territorio veneto.

Come riportato nel RAE dello scorso anno, la prima riunione del CdS si è tenuta il 26 novembre 2013 che, oltre all'approvazione del Regolamento interno, ha approvato alcune integrazioni del PAR per permettere il finanziamento di alcune iniziative. In particolare ha approvato il finanziamento di interventi SFMR ricadenti nella così detta "prima fase" (non previsti in sede di approvazione PAR) e ha consentito l'utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica anche per attività volte al completamento della Programmazione 2000 – 2006, attuata tramite APQ, ed eventuali attività che si renderanno necessarie per la preparazione della programmazione FSC e Programmazione Regionale Unitaria 2014 – 2020.

In considerazione del fatto che la precedente convocazione del Comitato è avvenuta sul finire del 2013 e che nel 2014 si prospettavano significativi cambiamenti che si sono concretizzati soltanto a dicembre, lo scorso anno il CdS è stato coinvolto soltanto per l'approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione che è avvenuta con procedura scritta.

In altre parti di questo Rapporto si è ricordata la seduta del CdS del 8 gennaio 2015 (avvenuta peraltro in video conferenza con i componenti del DPS) che ha approvato il nuovo piano finanziario del PAR, che ha recepito le riduzioni FSC imposte dalla normativa nazionale.

2.12.3. Partenariato

La Regione del Veneto ha scelto già da molti anni il metodo della condivisione con il partenariato socio/economico e istituzionale quale strumento ordinario per la gestione dei Programmi Operativi. In adempimento a quanto stabilito dalla delibera CIPE 166/2007, ma soprattutto per seguire un metodo che ha portato buoni frutti, la Regione del Veneto ha adottato la DGR 1443 del 6 giugno 2008 con la quale ha istituito il Tavolo di Partenariato (TdP) per il FSC 2007-2013.

Il TdP è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto da rappresentanze delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, del terzo settore, del volontariato e del non profit come pure delle organizzazioni ambientaliste e di quelle di promozione delle pari opportunità.

Come riportato nel RAE dello scorso anno, nella fase attuativa il TdP è stato chiamato a valutare la prima serie di interventi a regia regionale proposti in attuazione degli Assi 1, 2, 3 e 4 già nel novembre del 2013.

Nel corso del 2014 il TdP è stato coinvolto per la valutazione di interventi a regia regionale proposti per le Linee di intervento 1.1 (2 significative iniziative di coibentazione ed efficienza energetica), 2.1 e 2.2 (34 interventi della difesa del suolo e della costa), 3.2 (40 interventi sui parchi nel Veneto). Al fine di snellire il procedimento di condivisione, e ridurre i tempi, il partenariato è stato coinvolto con procedura scritta.

Linea di intervento	n. progetti	costo	contributo FSC
Linea di intervento 1.1	3	6.950.000,00	5.680.000,00
Linea di intervento 2.1	28	42.750.000,00	42.750.000,00
Linea di intervento 2.2	6	13.672.900,00	10.872.900,00
Linea di intervento 3.2	40	11.407.883,31	11.307.883,31
Totali	77	74.780.783,31	70.610.783,31

Tabella 25 – Iniziative sottoposte al Tavolo di partenariato nel corso del 2014

Dei progetti sopra riportati, soltanto quelli rientranti nella Linea 1.1 sono nel sistema di monitoraggio. I rimanenti lo saranno a partire dal 2015.

2.12.4. Monitoraggio

Analogamente al precedente periodo di programmazione 2000-2006, il monitoraggio delle risorse FSC è attuato, anche per questo periodo di programmazione, tramite l'applicativo Sistema

Gestione Progetti (SGP). La base dati del Sistema contiene ora tutti quelli della programmazione 2000-2006 e si sta potenziando con i risultati della programmazione 2017-2013.

Come prescritto dalla delibera CIPE 166/2007, per il periodo 2007-2013 i dati devono essere inviati alla Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dall'IGRUE che a sua volta esige il rispetto di un protocollo che ne garantisca la qualità dei dati. Questo trasferimento avviene sempre tramite SGP. Al fine di garantire il processo di monitoraggio, riducendo errori e scarti dei dati da parte dei sistemi riceventi, l'Autorità di Gestione del PAR ha accentrato le funzioni di controllo e gestione delle utenze, la funzione di verifica dei dati inseriti e della validazione degli stessi presso i sistemi SGP e BDU, garantendo in questo modo un forte presidio del processo e fornendo allo stesso tempo tutta l'assistenza necessaria ai diversi utenti che operano presso le Strutture regionali (al momento non sono ancora stata assegnate utenze a soggetti esterni alla Regione del Veneto).

La qualità del dato è un obiettivo a cui l'AdG mira anche considerando che la certificazione delle spese e i trasferimenti di risorse dal DPS alla Regione si basa sulla coerenza della base informativa.

L'AdG è consapevole dell'importanza dell'Open Data e della pubblicazione dei dati di monitoraggio nel sito <http://www.opencoesione.gov.it>. Pertanto, anche elaborando i dati del sistema informativo, sono stati prodotti internamente dei report che consentono di "monitorare il monitoraggio" con l'obiettivo di rendere i dati sempre più completi, tempestivi e coerenti.

I sistemi utilizzati permettono di produrre report o interrogazioni estemporanee per fornire ogni informazione utile all'esercizio delle attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e valutazione e individuare problemi o stasi nelle fasi attuative degli interventi.

2.13. Attività di controllo

Il sistema di controllo e di "governance" descritto nel Programma Attuativo inoltrato al DPS, e da questo presentato con parere favorevole al CIPE, non prevedeva un'Autorità di Audit (AdA) come peraltro consentito dalla delibera CIPE 166/2007.

Il CIPE, con propria delibera di presa d'atto del PAR veneto (delibera 9/2012) ha invece espressamente richiesto l'individuazione di un'AdA, in analogia a quanto previsto per i programmi comunitari.

Con propria deliberazione n. 487 del 16 aprile 2013 la Giunta regionale ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo per definire le regole di attuazione del PAR e allo stesso tempo ha individuato come Autorità di Audit la stessa struttura regionale incaricata dei controlli di secondo livello dei POR parte FESR e FSE, Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

L'approvazione del SI.GE.CO. da parte della Giunta Regionale è stata possibile in ragione della "Valutazione preliminare di adeguatezza" trasmessa dall'UVER il 27 febbraio 2013.

Come esposto nel paragrafo sull'Assistenza tecnica, si sta ora procedendo con il completamento delle procedure e dei manuali (piste di controllo e check list) per fornire tutti gli strumenti ai soggetti incaricati dell'attuazione e monitoraggio degli interventi e del controllo e certificazione della spesa.

Allo stato attuale di realizzazione degli interventi non è possibile rendicontare sui controlli, fermo restando che le procedure adottate abitualmente dalle strutture regionali per l'erogazione di contributi a soggetti attuatori di interventi su qualsiasi linea di finanziamento, prevedono il controllo documentale su tutte le rendicontazioni di spesa e controlli in loco per la verifica dell'attuazione.

Con l'avanzamento della spesa e con la prima certificazione sarà possibile trarre eventuali indicazioni dall'attività di controllo.

2.14. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

In questa fase dell'attuazione del PAR sono emerse economie per soli € 317,24 e al momento non ci sono ipotesi di riutilizzo.

2.15. Assistenza Tecnica

Le attività di assistenza tecnica, come pure l'illustrazione dell'avanzamento finanziario, sono state illustrate nel paragrafo "2.3.6 - Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci" e nel paragrafo che riguarda gli Strumenti VE61 e VE62. Si rimanda pertanto a quelle parti del Rapporto per una esposizione più dettagliata.

Da segnalare che, con le risorse dell'Assistenza Tecnica si è conclusa la procedura per l'acquisizione di un servizio di consulenza per la predisposizione di manuali e procedure che declinino in modo più puntuale il SI.GE.CO. La documentazione ottenuta da questo servizio permetterà di codificare modalità operative non adottate nel precedente periodo di programmazione.

2.16. Informazione e pubblicità

Il PAR è attuato con il coinvolgimento dei soggetti interessati alle finalità delineate nel PAR stesso. Anche per le iniziative a regia regionale, gli interventi sono scelti con la logica di rispondere alle esigenze del territorio coinvolgendo i soggetti interessati o le categorie più rappresentative. Per i progetti a regia regionale, la fase conclusiva di condivisione delle scelte regionali è rappresentata dal Tavolo di Partenariato, convocato per la prima volta, in fase di attuazione del PAR, nel novembre 2013. Successivamente, il TdP è stato coinvolto, sempre per i progetti a regia regionale, con procedura scritta. Si rimanda al paragrafo 2.12.3 “Partenariato” per ulteriori informazioni in merito a questo evento. È da segnalare comunque che, laddove gli interventi non sono facilmente identificabili o comunque non sono già inseriti in documenti di programmazione (vedi ad es. il SFMR o gli interventi per la Difesa del suolo), la struttura regionale competente per settore ha sollecitato delle proposte di intervento ai soggetti interessati dalle iniziative attuative delle Linee di intervento. Significativa è stata la rilevazione fatta nel 2013 per la Linea 1.1 citata nel paragrafo 2.3.1 della Priorità 3 – “Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo”.

Nel 2014 è stata altresì attuata un’iniziativa (DGR 422/2014 – pubblicata nel sito regionale) per raccogliere informazioni in ordine alla dimensione economico-finanziaria di possibili progetti attuabili nell’ambito della Linea 3.1 “Beni culturali”. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di conoscere le progettualità manifestate dal territorio sui predetti interventi utili alla predisposizione di successivi bandi o regie regionali per la concessione di contributi a valere sui Fondi FSC.

Nel corso del 2014, come illustrato più sopra, sono stati emanati i bandi e individuato i progetti a regia, elencati successivamente nella DGR 2463 del dicembre 2014.

Per quanto riguarda invece l’abituale attività di informazione, per il PAR del Veneto ci sono delle pagine nel sito Internet istituzionale dedicate espressamente alle iniziative di finanziamento e pertanto dedicate alla pubblicazione di bandi e concorsi. Sono state inoltre create delle pagine espressamente dedicate alla programmazione con dei link alla programmazione unitaria e al PAR FSC: (<http://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc2007-2013>).

In queste pagine si possono trovare informazioni aggiuntive (ad es. slide di presentazione) rispetto alle iniziative attivate.

Al fine di fornire adeguati strumenti operativi ai funzionari regionali che si occupano, a diverso titolo della gestione e monitoraggio dei fondi FSC, nel sito Intranet della Regione (pertanto ad accesso controllato) ci sono delle pagine in cui i colleghi regionali possono trovare il materiale utile al loro lavoro (manuali, rapporti, bandi e modelli, ecc.).

2.17. Progetti esemplari

Nelle pagine che seguono vengono proposti alcuni esempi di schede di “progetti esemplari”, che la Regione del Veneto ha attuato.

Tali progetti vengono presentati attraverso una scheda riassuntiva sui costi e i tempi di realizzazione, descrivendo dettagliatamente gli obiettivi e i benefici del singolo intervento. I dati riportati fanno riferimento al monitoraggio del 31/12/2014.

In questo RAE sono stati presentati tre progetti attuati rispettivamente:

- Asse 1 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile
- Asse 2 - Difesa del Suolo
- Asse 5 - Sviluppo Locale

Energia

	Intesa PAR FSC Veneto	
	Priorità:	
	Linea di azione e azione: Asse I “Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile” Linea d'intervento 1.1 – Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici	
Titolo progetto: Intervento di manutenzione straordinaria di coibentazione dell'involucro dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato complesso “La Nave” in Verona		
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto Provincia: Comuni:		
CUP: F61E13000300002 Altri eventuali codici identificativi: VE11P020A		
Importo Finanziario: 3.969.100,00 €		
Fonte FSC	Importo⁴: € 3.147.716,48	Note⁵ Impegni: € : 821.383,52 Pagamenti: € 34.377,79
Data inizio lavori: 09/09/2014 - Data fine prevista: : 08/09/2015		
Soggetto programmatore: ⁶ Regione del Veneto Soggetto attuatore: ATER VERONA		

DESCRIZIONE:

L'opera è finalizzata alla riqualificazione del complesso residenziale denominato “LA NAVE” (costituito da sei palazzine complessive) ubicato in via Zancle a Verona, atte al miglioramento del confort abitativo interno ed alla riduzione del fabbisogno di energia primaria.

In particolare si prevede il rifacimento completo dell'involucro con applicazione di isolamento a cappotto.



⁴ In Euro (omettere i centesimi)

⁵ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

⁶ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

Gli interventi di riqualificazione proposti per il complesso residenziale in esame, nello specifico risultano:


- Opere preliminari alla riqualificazione energetica;
- Installazione cappotto isolante;
- Coibentazione -impermeabilizzazione copertura;
- Coibentazione -impermeabilizzazione terrazzi.

Per “opere preliminari” si intendono tutti quegli interventi necessari per rendere l'edificio predisposto all'installazione dell'isolamento a cappotto.

Gli interventi individuati sono:

- Rimozione e smantellamento cappotto esistente;
- Demolizione balconcini in laterizio e cemento armato(esistenti su vani scala);
- Rimozione e smantellamento pavimentazione e sottofondo terrazzi;
- Rimozione e smantellamento doppi serramenti esterni, verande, tettoie, tende, scossaline e tutte le strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico;
- Rimozione porte esterne, cancelli, ringhiere, basculanti garage;
- Rimozione elementi accessori quali: cassette postali, cartelli vari, scale metalliche (in copertura);
- Rimozione elementi impiantistici esterni quali: griglie di aerazione, antenne, parabole, corpi illuminanti e relative linee di alimentazione, linee di alimentazione gas, tubazioni rigide;
- Risanamento e pulizia superfici murarie esterne;
- Sistemazione e pulizia superfici metalliche esterne;
- Sistemazione e pulizia guaina esistente in copertura.

Attualmente è presente in tutte le palazzine una coibentazione “a cappotto”; le zone interessate da tale sistema sono tutte le pareti esposte a nord e l'intradosso del solaio pilotis delle sei palazzine.

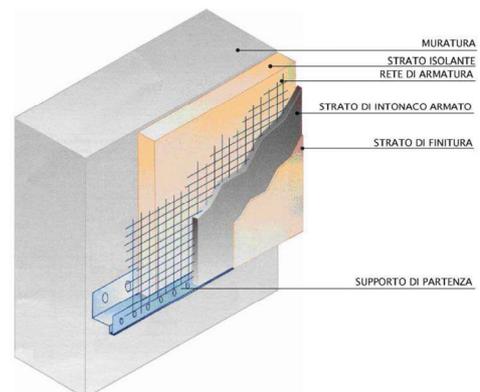

È prevista la rimozione e lo smantellamento della coibentazione esistente.

BENEFICI:

Miglioramento della classe energetica dell'edificio e riduzione dell'indice di consumo dell'energia primaria totale dell'edificio. La progettazione e l'intervento, si muovono in sintonia con la politica intrapresa già negli scorsi anni dall'Amministrazione per un approccio più ecocompatibile ed ecosostenibile delle proprie strutture.



Difesa del suolo

	Intesa PAR FSC Veneto	
	Priorità: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	
	Linea di azione e azione: Asse 2 - Difesa del Suolo Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti"	
Titolo progetto: Lavori urgenti per la realizzazione di un'opera repellente a protezione dell'imboccatura del sostegno di Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall'incile sul fiume Adige fino allo stante 17. Comuni di Cavarzere (VE) e Loreo (RO).		
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto Provincia: Venezia e Rovigo Comuni: Cavarzere (VE) e Loreo (RO)		
CUP: H89H12000130002 Altri eventuali codici identificativi: VE20P027		
Importo Finanziario: 751.000,00 €		

Fonte FSC	Importo¹: € 751.000,00	Note² : Impegni: € 751.000,00 Pagamenti: € 737.494,93 Residuo da liquidare: 12.371,40 Economie: 1.133,67 €
		Data inizio: 18/02/2013 - Data fine effettiva: 22/11/2013 - Data fine collaudo: 24/03/2014
Soggetto programmatore: ³ Regione del Veneto Soggetto attuatore: Genio civile di Rovigo, ora Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo		

¹ In Euro (omettere i centesimi)

² Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

³ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

DESCRIZIONE: L'area oggetto dell'intervento si colloca lungo il canale di Loreo, che nasce all'incile di Tornova sul fiume Adige e si sviluppa lungo un percorso di circa 8 km per confluire poi definitivamente nel Canal Bianco in località Chiavegoni, in prossimità della biconca di Volta Grimana.

Il canale è strutturato per essere intercluso all'occorrenza sia a monte, tramite la paratoia automatica del sostegno di Tornova, che a valle, per mezzo delle porte vinciane dell'impianto idrovoro di Chiavegoni.

Il canale è funzionale alle esigenze irrigue delle aree agricole di Loreo e Cavarzere, essendo ad esso collegate numerose idrovore consorziali, che da esso traggono approvvigionamento d'acqua nel periodo estivo; funge altresì da via di sfogo delle acque meteoriche in eccesso durante i periodi di forte piovosità primaverili ed autunnali, permettendo di mantenere in sicurezza il centro di Loreo con livelli idrometrici costanti.

Il canale è inoltre navigabile nel tratto compreso tra il ponte sulla strada provinciale 45 e lo sbocco in Canalbianco.

Lo stato di fatto del canale presenta un generale e progressivo "degrado idraulico" meritevole di essere preso in considerazione.

Il progetto in argomento individua tre aree principali di intervento:

- prima zona:** area di circa 2 km partendo da monte, che presenta una sezione notevolmente parzializzata a causa dei depositi alluvionali generati da sabbie e limi provenienti dal fiume Adige sui quali si è sviluppata nel corso degli anni una fitta e stabile vegetazione; tale massiccia sedimentazione, si traduce in un vero e proprio collo di bottiglia per la funzionalità del nodo idraulico in argomento poiché impedisce l'ottimale apporto d'acqua nel tratto di valle con effetti negativi sia sugli attingimenti



Prima



Durante



Dopo

consorziali nel periodo irriguo che sullo smaltimento delle acque meteoriche in eccesso durante i periodi di forte piovosità. Si prevede pertanto di rizezionare l'alveo mediante scavo del materiale terroso e riporto dello stesso sulla adiacente golena destra. Verrà ripristinata la quota di fondo ottimale di m 8,00 s.l.m. studiata e valutata sulla base dei profili longitudinali del canale, mentre la sezione complessiva di deflusso finale nel tratto in argomento risulterà variabile, per scelta obbligata, e sarà via via crescente dallo st. 2 allo st. 9 per ovvie ragioni di raccordo con l'esistente.

- **seconda zona:** collocata in destra orografica del canale, dove si prevede un modesto rialzo e ringrosso arginale eseguito a lato fiume con palificata interamente sommersa al piede e riporto di terra argillosa in scarpata.

terza zona: più a valle, in corrispondenza di un

- tratto caratterizzato da copiosi fenomeni di filtrazione localizzata e diffusa che pregiudicano fortemente la sicurezza idraulica del sito adiacente all'argine. L'intervento consiste nell'infissione di palancole per un'estesa di circa m 150 in sinistra orografica.



Prima

BENEFICI:

L'intero intervento è volto alla riduzione del rischio idrogeologico, al fine della difesa degli insediamenti lungo il Canale di Loreo.

Gli interventi previsti mirano infatti:

- al ripristino della funzionalità dell'alveo nella parte alta del Canale di Loreo;
- a restituire officiosità all'arginatura destra;
- all'eliminazione delle filtrazioni localizzate e/o diffuse presenti in più zone adiacenti agli argini.



Dopo

Sviluppo Locale

	Intesa PAR FSC Veneto	
	Priorità: 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	
	Linea di azione e azione: Asse 5 – Sviluppo Locale Linea 5.3 “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio”	
Titolo progetto: Riqualificazione urbana e viabilistica della Piazza San Giorgio		
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto Provincia: Verona Comuni: Palù		
CUP: B41B13000340003 Altri eventuali codici identificativi: VE53P001		
Importo Finanziario: € 650.000		
Fonte FSC	Importo¹: € 300.000	Note² : Impegni: € 369.602 Pagamenti: € 145.969 Spesa: € 145.969
Data inizio lavori: 09/07/2014 - Data fine prevista: 28/02/2015		
Soggetto programmatore: ³ Regione del Veneto Soggetto attuatore: Comune di Palù		

DESCRIZIONE: La piazza di Palù, baricentrica nel contesto urbano, è anche il crocevia di due assi viari extraurbani predominanti rispetto ai luoghi di aggregazione, con conseguenti problemi di sicurezza. Il risultato è un insieme degradato di luoghi di difficile lettura, insicuro e ignorato dai cittadini.
 L'intervento si propone il recupero di quest'area per farne



¹ In Euro (omettere i centesimi)

² Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

³ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

uno spazio centrale, sicuro e riconoscibile nel cuore del paese.

La piazza viene pavimentata con cubetti di porfido. Il lungo vialetto ciclo-pedonale che attraversa longitudinalmente tutta la piazza e i vialetti secondari saranno in calcestruzzo architettonico “effetto lavato” intervallati regolarmente da fasce in piastrelle di porfido.



BENEFICI:

Tale progetto rientra nell’Asse 5 - Sviluppo Locale, individuato come Azione Cardine dal PAR FSC del Veneto. In particolare il progetto è stato selezionato mediante bando regionale per la riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio, pubblicato nel 2013, il quale puntava a far emergere tutte quelle iniziative che, partendo da un’analisi del territorio, puntassero al suo sviluppo e che derivassero dal risultato di un processo concertativo con il coinvolgimento degli attori locali, con l’obiettivo di creare una cultura diffusa che permettesse di coinvolgere con maggiore consapevolezza i soggetti operanti sul territorio nel processo programmatico.

La riqualificazione della Piazza San Giorgio risponde dunque alla logica di una sua rivitalizzazione in funzione sociale ed economica di un territorio anche più ampio.

La maggiore attrattività per la collettività, svolgerà un effetto volano per l’insediamento di nuove attività commerciali e lo sviluppo di quelle esistenti.

Lo spazio principale lastricato, che dal sagrato della Chiesa si collega al cuore della Piazza, e la piazza di dimensioni minori davanti alla scuola elementare, costituiscono fondamentalmente un’area sicura per tutti.



3. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento

Allo stato attuale di avanzamento del PAR non ci sono progetti trasversali ad altre programmazioni.

Allegato

Elenco di tutti gli interventi inseriti in SGP alla versione di monitoraggio del 31/12/2014.

Report prodotti dall'AdG su dati SGP.

VE11P001 Impianto per la produzione di calore e realizzazione della rete di teleriscaldamento destinata all'alimentazione degli impianti termici

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	7.000,00	6.851,52	6.851,52	0,00	0,00	490.000,00	COMUNE DI SAPPADA (BL)
FSC PAR su costo 400.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 1% 31/12/2014 1% 1%							

VE11P002 Realizzazione di un sistema di teleselezione e telecontrollo degli impianti di produzione di energia presso gli edifici di competenza comunale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	Comune di Feltre (BL)
FSC PAR su costo 129.600,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 31/12/2014 0% 100%							

VE11P003 Impianto di produzione di calore a biomassa integrato a solare termico e fotovoltaico

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	2.516,80	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00	772.500,00	Comune di Zoldo Alto (BL)
FSC PAR su costo 695.250,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 31/12/2014 0% 0%							

VE11P004 Centrale termica alimentata a biomasse legnose e rete di teleriscaldamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	50.740,41	10.599,43	10.599,43	0,00	0,00	610.000,00	Comune di Seren Del Grappa (BL)
FSC PAR su costo 549.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 2% 31/12/2014 8% 2%							

VE11P005 Realizzazione di una rete di teleriscaldamento con la centrale termica esistente a biomasse



Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	Comune di Tambre (BL)
FSC PAR su costo 219.600,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 31/12/2014 0% 0%							

VE11P006 Completamento della rete di teleriscaldamento a produzione di energia termica con biomasse

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	7.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	Comune di Farra D'Alpago (BL)
FSC PAR su costo 182.700,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 31/12/2014 3% 0%							



VE11P007 <i>Efficientamento Scuola Primaria e installazione di nuove apparecchiature di comando e protezione a favore del nuovo impianto di riscaldamento-raffrescamento</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	141,78	141,78	141,78	0,00	0,00	95.076,66
FSC PAR su costo 85.569,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Saonara (PD)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  0%  0%  0%						

VE11P008 <i>Installazione di pompa di calore elettrica con pozzo geotermico presso istituti scolastici con previsione di realizzazione impianto fotovoltaico in aderenza alla copertura della palestra</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.227,00
FSC PAR su costo 291.742,95 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: COMUNE DI SANT'URBANO (PD)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  0%  0%  0%						

VE11P009 <i>Progetto integrato relativo all'efficientamento energetico e al risanamento dell'ex sede comunale</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FSC PAR su costo 297.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Villa Del Conte (PD)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  0%  0%  0%						

VE11P010 <i>Progetto integrato relativo all'efficientamento energetico dell'istituto scolastico presso la scuola elementare Petrarca del Comune di Limena</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	330.000,00	223.066,65	223.066,55	0,00	0,00	330.000,00
FSC PAR su costo 163.161,61 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: COMUNE DI ALIMENA (PA)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  68%  100%  68%						

VE11P011 <i>Realizzazione di impianto geotermico diretto a climatizzare il centro culturale e la biblioteca comunale</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FSC PAR su costo 54.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Codogne' (TV)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  0%  0%  0%						

VE11P012 <i>Realizzazione di impianto geotermico presso le scuole comunali</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
FSC PAR su costo 118.350,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Paderno Del Grappa (TV)						
N. vers. 4 Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
31/12/2014  0%  0%  0%						

VE11P013 *Completamento rete di teleriscaldamento attraverso la messa in opera delle condotte a servizio dei plessi scolastici comunali. L'impianto opera con immissione di fluido caldo messo a disposizione da centrale funzionante a biomassa*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Marano Vicentino (VI)	
Verificata	5.974,48	5.974,48	5.974,48	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							1.350.000,00	31/12/2014	0% 0% 0%
Economie FSC							0,00	Altro FSC	

VE11P014 *Potenziamento dell'impianto di teleriscaldamento alimentato con biomasse legnose, per consentire l'allacciamento di ulteriori n. 5 complessi edilizi*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Rosa (VI)	
Verificata	5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	752.537,27	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							677.283,55	31/12/2014	0% 1% 0%
Economie FSC							0,00	Altro FSC	

VE11P015 *Adeguamento/potenziamento Centrale Termica a biomasse attraverso installazione di nuova caldaia a cippato e ampliamento rete di Teleriscaldamento di Canove*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROANA (VI)	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							810.000,00	31/12/2014	0% 0% 0%
Economie FSC							0,00	Altro FSC	

VE11P016 *Riqualificazione impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda presso struttura Comunale, con installazione di un impianto modulare di produzione di calore in telecontrollo*


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Gazzo Veronese (VR)	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							82.800,00	31/12/2014	0% 0% 0%
Economie FSC							0,00	Altro FSC	

VE11P017 *Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e refrigerazione e produzione acqua calda presso struttura comunale, integrato con fotovoltaico, con utilizzo, quale fonte rinnovabile di energia, acqua di falda a mezzo pompa di calore*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Costermano (VR)	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.271,13	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							445.744,02	31/12/2014	0% 0% 0%
Economie FSC							0,00	Altro FSC	


VE11P018 Realizzazione di impianto geotermico con utilizzo di sorgente termale per integrazione del sistema di riscaldamento presso Istituto Scolastico Provinciale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona			
Verificata	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							139.500,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00




VE11P019 Impianto di rinfrescamento solare free cooling presso il Centro Polifunzionale comunale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sona (VR)			
Verificata	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.790,00	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							152.811,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00




VE11P020A Intervento di manutenzione straordinaria di coibentazione dell'involucro dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato complesso "La Nave" in Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	A.T.E.R. Verona ? Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Verona			
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.100,00	N. vers. 1	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							3.147.716,48	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00




VE11P020B Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione dei serramenti dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato complesso "La Nave" in Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	A.T.E.R. Verona ? Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Verona			
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.900,00	N. vers. 1	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							1.182.283,52	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00



VE11P021 Progetto di efficientamento energetico e di riqualificazione di un complesso residenziale, mediante interventi di coibentazione termica e realizzazione di impianti di riscaldamento e telegestione

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	A.T.E.R. Padova AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALI			
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 1	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							1.350.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00



N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P001		Lavori di messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in Comune di Ficarolo (RO) ? I fase ? I stralcio funzionale				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	49.836,43	49.836,43	49.836,43	0,00	0,00	1.200.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 4% 4% 4%						

VE20P002		Lavori di manutenzione delle difese spondali in frodo in sinistra fiume Po fra gli stanti 203 - 214 in tratte saltuarie in Comune di Stenta (RO) ? lotto 2				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 0% 0%						

VE20P003		Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	17.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 4% 0%						

VE20P004		Prosecuzione della sottomurazione del muro spondale in sinistra idrografica del fiume Piave ed opere accessorie				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 99% 0%						

VE20P005		Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione dell'alveo del torrente Runal, in localita Buscole in Comune di Farra d'Alpago				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	27.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 5% 0%						

VE20P006		Interventi di regimazione idraulica in localita Mugnai del Comune di Feltre (BL)				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	44.042,63	13.792,03	13.792,03	0,00	0,00	280.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione N. vers. 7 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 5% 16% 5%						



N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P007		Straordinaria manutenzione e integrazione opere longitudinali e trasversali esistenti in Comune di Gosoldo - torrente Gosolda						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	26.898,30	26.898,30	26.898,30	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P008		Adeguamento opere idrauliche e realizzazione del nuovo ponte sulla strada comunale sul torrente Chiesa in localita Retiz in Comune di Livinalongo del Col di Lana						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	421.403,00	289.104,20	289.104,20	0,00	0,00	490.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P009		Integrazione di opere di difesa idraulica sul fiume Rai nei Comuni di Ponte nelle Alpi e Puos d'Alpago						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	273.372,95	234.224,73	234.224,73	0,00	0,00	300.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		300.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P010		Completamento interventi di difesa idraulica longitudinali e trasversali sui torrenti Padola e Digion nei Comuni di San Nicolo di Cornelico e S. Stefano di Cadore ? Provincia di Belluno						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	361.956,40	355.692,07	355.692,07	0,00	0,00	400.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		338.963,46	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P011		Realizzazione opere di difesa idraulica in vari punti del fiume Piave in Comune di Sappada						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P012		Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del Comune di Camposampiero (PD)						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	577.717,43	567.969,57	567.969,57	0,00	0,00	577.717,43	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo		577.717,43	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P013		Lavori di ripresa frane lungo il canale Roncajette nei Comuni di Ponte San Nicolò, Casalserugo e Bovolenta (PD)				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014

VE20P014		Lavori di realizzazione di arginatura per l'intercettazione di infiltrazioni presenti in più tratti delle arginature del Tesina Padovano in Comune di Veggiano				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	460.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014

VE20P015		Lavori di consolidamento dell'arginatura destra del fiume Brenta in Comune di Limena				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	7
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014

VE20P016		Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frassinelle nel tratto tra Montagnana e Este				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	352.997,35	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	400.000,00	7
FSC PAR su costo		400.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014

VE20P017		Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Bisatto - Battaglia				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	373.867,59	46.338,04	46.338,04	0,00	0,00	450.000,00	7
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014

VE20P018		Lavori di intercettazione di infiltrazioni del corpo arginale del fiume Gorzone a valle dello sbarramento del Buoro (Comuni di Cavarzere e Chioggia)				Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.
Verificata	473.954,59	467.085,20	467.085,20	0,00	0,00	473.954,59	7
FSC PAR su costo		473.954,59	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014



N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P019		Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Frassine dal ponte delle Caselle in Comune di Ospedaletto al ponte della S.S.10 in Comune di Este						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	478.814,82	471.298,56	471.298,56	317,24	0,00	478.814,82	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		478.814,82	Economie FSC	317,24	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P020		Lavori di rialzo e ringrosso del corpo arginale del fiume Fratta nel territorio dei Comuni di Merlara e Castelbaldo della provincia di Padova						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	442.391,46	395.068,48	395.068,48	0,00	0,00	442.391,46	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		442.391,46	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P021		Intervento di sistemazione di un tratto della sponda, in erosione, in sinistra idraulica del fiume Bacchiglione, in località Bassanello del Comune di Padova						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	369.134,09	363.180,50	363.180,50	0,00	0,00	369.134,09	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		369.134,09	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P022		Rialzo e risagomatura dell'argine dx del fiume Bacchiglione in località Creola in Comune di Saccolongo e Selvazzano Dentro e rifacimento presidio di sponda in località Tencarola in Comune di Selvazzano						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	500.000,00	490.137,46	490.137,46	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		500.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P023		Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della Roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - Secondo lotto funzionale						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P024		Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal ripristino del petto arginale destro						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 7	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE20P025 *Lavori urgenti per la sistemazione di gravi dissesti diffusi sulla sponda sinistra del Canalbianco lungo la S.P. 45, nel tratto compreso fra il ponte dell'Amolara e la localita' Colafonda in Comune di Adria (RO). 1 stralcio LOTTO A*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Verificata	399.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 400.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014	

VE20P026 *Lavori di sistemazione dell'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 303-306 in Comune di Cavarzere*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Verificata	1.000.000,00	981.267,33	981.267,33	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014	

VE20P027 *Lavori urgenti per la realizzazione di un'opera repellente a protezione dell'imboccatura del sostegno di Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall'incile sul fiume Adige fino allo stante 17. Comu di Cavarzere (VE) e Loreo (RO)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Verificata	751.000,00	749.866,33	737.494,92	0,00	0,00	751.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 751.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014	

VE20P028 *Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a servizio dell'impianto idrovo di Chiavegani in Comune di Loreo (RO)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Verificata	328.825,70	328.825,70	328.825,70	0,00	0,00	329.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 329.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014	

VE20P029 *Lavori di ripristino dell'ufficiosa dei corsi d'acqua demaniali, classificati e non classificati, della sinistra Piave in comuni vari della provincia di Treviso*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	176.951,84	174.091,12	174.091,12	0,00	0,00	176.951,84	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 176.951,84 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014	

N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P030		Lavori di sistemazione idraulica del bacino del torrente Muson e del torrente Curogna in comuni vari della provincia di Treviso				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	200.000,00	196.017,06	196.017,06	0,00	0,00	200.000,00
FSC PAR su costo		200.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						

VE20P031		Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idraulica dell'alveo del fiume Piave con movimentazione e asporto materiale litoidi, compreso il sito storico dell'Isola dei Morti				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	224.149,19	191.444,00	106.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
FSC PAR su costo		1.200.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						

VE20P032		Lavori di sistemazione del fiume Monticano mediante rialzi e sistemazione di argini, ripresa di erosioni e funzionalità idraulica della gola nel tratto tra Conegliano e Fontanelle				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	681.153,32	665.460,00	665.460,00	0,00	0,00	681.153,32
FSC PAR su costo		681.153,32	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						

VE20P033		Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borriola in Comune di Fontanelle				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	48.595,04	0,00	22.330,88	0,00	0,00	1.800.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						

VE20P034		Interventi di diaframatura e consolidamento arginale lungo il fiume Livenza in Comune di Meduna di Livenza - 5? stralcio				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	956.108,06	822.001,96	822.001,96	0,00	0,00	956.108,06
FSC PAR su costo		956.108,06	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						

VE20P035		Lavori per la realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari				
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	58.680,73	17.509,44	17.509,44	0,00	0,00	1.000.000,00
FSC PAR su costo		0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00
<p>Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione</p> <p>N. vers. 7</p> <p>31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p>						



VE20P036 *Lavori per il ripristino dell'efficienza idraulica degli scoli e delle chiaviche in gola del fiume Piave ubicate nei Comuni di Ponte di Piave, Breda di Piave, S.Biagio di Callata e Zenson di Piave in provinci di Treviso*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	404.643,57	397.319,56	397.319,56	0,00	0,00	404.643,57	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	404.643,57	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P037 *Interventi di sistemazione idraulica canale scolmatore del fiume Giavera di via Pola in Comune di Ponzano Veneto*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	356.974,02	350.630,35	350.630,35	0,00	0,00	356.974,02	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	356.974,02	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P038 *Sistemazione dell'alveo e delle arginature del canale Malgher e messa in sicurezza dei manufatti di regolazione idraulica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	250.000,00	246.026,09	246.026,09	0,00	0,00	250.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	250.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P039 *Sistemazione argini Canali Taglio di Mirano e Novissimo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	300.000,00	288.964,57	288.964,57	0,00	0,00	300.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	300.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P040 *Ripristino di tratti arginali in destra e sinistra fiume Serraglio in varie località tra i Comuni di Stra e Mira*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	453.633,42	445.471,79	445.471,79	0,00	0,00	453.633,42	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	453.633,42	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P041 *Interventi di manutenzione straordinaria su canali scaricatori del tratto terminale del Naviglio Brenta*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	500.000,00	456.637,02	456.637,02	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	500.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	



VE20P042 Interventi diffusi di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso e la sicurezza arginale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	8.247,20	8.088,60	8.088,60	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	2% 2% 2%

VE20P043 Riordino delle sezioni idrauliche del fiume Sile con risonzionamento, rialzo e consolidamento di sponda

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	16.938,48	13.322,40	13.322,40	0,00	0,00	600.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	2% 3% 2%

VE20P044 Ripristino e consolidamento di sponda in destra e sinistra nel basso tronco del Naviglio Brenta nei Comuni di Mira e Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	239.222,68	235.272,03	235.272,03	0,00	0,00	239.222,68	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	239.222,68	239.222,68	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	98% 100% 98%

VE20P045 Ripresa frange arginali ed erosioni spondali sul fiume Tagliamento, in Comune di San Michele al Tagliamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	1.250.000,00	1.208.484,40	1.208.484,40	0,00	0,00	1.250.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	1.000.000,00	1.000.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	97% 100% 97%

VE20P046 Interventi di sistemazione e di ricostruzione di tratti saltuari di platee e muri di sponda interessanti i torrenti Avesa, Fumane, Gaza, Marano e Quinzano in comuni vari della provincia di Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	750.000,00	738.181,27	738.181,27	0,00	0,00	750.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	750.000,00	750.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	98% 100% 98%

VE20P047 Interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla prosecuzione ed al completamento di interventi eseguiti nell'ambito della O.P.C.M. n. 3906/2010 sui corpi idrici interessati dall'evento di piena del novembre 2010

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	1.070.000,00	870.616,74	870.616,74	0,00	0,00	1.070.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	1.070.000,00	1.070.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	81% 100% 81%

N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P048		Lavori di sistemazione idraulica nel sottobacino del torrente Fumane nei Comuni di Fumane, San Pietro in Cariano e Pescantina - 2° stralcio						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	497.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	31/12/2014	

VE20P049		Interventi di sistemazione e di ricostruzione di tratti salinari di platee e muri di sponda del torrente Valpantena nei Comuni di Grezzana e Verona						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	630.000,00	616.314,79	616.314,79	0,00	0,00	630.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	630.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P050		Interventi di messa in sicurezza idraulica del sistema Alpone, Chiampo, Aldega nel tratto immediatamente a valle del ponte della ferrovia MI-VE a San Bonifacio - 1° Stralcio funzionale						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P051		Completamento dei lavori di sistemazione idraulica (diaframatura) dell'argine sinistro del fiume Adige in localita' Begosso e Nichesola del Comune di Terrazzo						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	520.000,00	508.390,88	508.390,88	0,00	0,00	520.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	520.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P052		Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona ? ? Stralcio funzionale						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	4.824,79	4.824,79	4.824,79	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

VE20P053		Lavori di sistemazione idraulica inerenti il completamento delle opere intraprese con l'O.P.C.M. n. 3906/2010 e finanziati con le successive Ordinanze Commissariali, non potuti completare per mancanza di fondi ? 2° stralcio						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Verificata	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	

N. interv. nello Strumento: 65 S.R.A.: Sezione Difesa del Suolo Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

VE20P060		Realizzazione e ripristino difese spondali e platee, sistemazione alveo sul torrente Leogra nei Comuni di Schio e Torrebelficino						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	480.000,00	268.400,00	268.400,00	0,00	0,00	480.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	400.000,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	

VE20P061		Interventi di sistemazione idraulica con adeguamento della sezione di deflusso e consolidamento opere idrauliche del sistema Agno e Chiampo a monte di Montebello Vicentino						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	494.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	

VE20P062		Interventi di sistemazione idraulica del fiume Bacchiglione a salvaguardia dell'abitato di Vicenza						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	397.131,68	16.697,41	16.697,41	0,00	0,00	450.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	

VE20P063		Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza - Stralci funzionali in prosecuzione delle opere avviate nell'ambito dell'O.P.C.M. n. 3906/2010						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Verificata	950.000,00	900.203,02	900.203,02	0,00	0,00	950.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	950.000,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	

VE20P064		Interventi urgenti e indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia (VE) al fine di prevenire eventuali esondazioni del canale Busiola a seguito di piene del Fiume Brenta. Progetto per rialzo della sommità arginale del cana						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Delta del Po
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	

VE20P065		Progetto di riqualificazione ambientale e turistica e riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza ? IV stralcio ? Opere strutturali in comune di Caorle						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Verificata	1.662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo	0,00	Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00	0,00	0,00	31/12/2014	



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: RepPAR - Reportistica per il PAR

VE31P001

Centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi all'interno di Forte Marghera ? Primo stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	INSULA SPA	5	0%
FSC PAR su costo	551.000,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	0%

VE31P002

Centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi all'interno di Forte Marghera ? Il stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	INSULA SPA	5	0%
FSC PAR su costo	1.340.000,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	0%

VE31P003

Intervento di restauro e valorizzazione funzionale dell'intero corpo di fabbrica denominato scuderie monumentali del Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) ? Primo stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	67.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Regione del Veneto	5	0%
FSC PAR su costo	1.200.000,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	6%

VE31P004

Intervento di restauro e valorizzazione funzionale dell'intero corpo di fabbrica denominato scuderie monumentali del Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) - Il stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Regione del Veneto	5	0%
FSC PAR su costo	400.000,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	0%

VE31P005

Restauro e adeguamento funzionale della chiesa di Santa Margherita per la valorizzazione e la pubblica fruizione della Collezione Salce a Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.913,30	DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICID	5	0%
FSC PAR su costo	1.500.000,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00		31/12/2014	0%

VE31P006

Grandi Gallerie dell'Accademia di Venezia ? Complesso della Carita: restauro, adeguamento funzionale e allestimento del complesso museale del primo e secondo piano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	6.998.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICID	5	4%
FSC PAR su costo	0,00		Economie FSC	0,00	Altro FSC	7.000.000,00		31/12/2014	78%

N. interv. nello Strumento: 29 S.R.A.: Sezione Mobilita Tipo Strumento: **Strumenti di Attuazione diretta**

VE42P001 Realizzazione seggiovia esaposto a.a. Ponte Vauz-La Viza A.1.45M - Area sciabile Pordoi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.129,63	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 29% 0%	

VE42P002 Realizzazione seggiovia quadriposto a.f. Arabba Fly

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.552,96	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 35% 0%	

VE42P004 Sostituzione scivola Taisa III - Cima Sappada

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 166.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 50% 0%	

VE42P005 Realizzazione cabinovia 8 posti Prada Costabella

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 30% 0%	

VE42P006 Realizzazione seggiovia quadriposto a.f. Le Buse-Campo Scuola - Falcade

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 44% 0%	

VE42P007 Realizzazione seggiovia quadriposto a.f. Paloni

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.906,65	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							31/12/2014 48% 0%	

Tipo Strumento: **Strumenti di Attuazione diretta**

S.R.A.: **Sezione Mobilita**

N. interv. nello Strumento: **29**

VE42P008 Realizzazione della seggiovia quadriposto a.f. Belamont-Col dei Baldi - Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

VE42P009 Realizzazione seggiovia esaposto a.a. Rifugio Verenessa-Monte Verena

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

VE42P010 Realizzazione cabinovia 8 posti a.a. Arabba-Portadoss

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301.100,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

VE42P011 Realizzazione della seggiovia quadriposto a.a. Malga Ciapela-Capanna Bill

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.600,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

VE42P012 Realizzazione sciovia (manovia) Orthal - Asiago

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 68.200,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

VE42P013 Realizzazione sciovia Le Erte - Nevegal Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	436.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	872.613,02	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 436.306,51 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014	

Tipo Strumento: **Strumenti di Attuazione diretta**

S.R.A.: **Sezione Mobilita**

N. interv. nello Strumento: **29**

VE42P014 *Realizzazione seggiovia quadriposto a.f. Val Formica-Cima Larici - Asiago*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 28% 0%	

VE42P015 *Realizzazione seggiovia 4 posti a.f. Valle delle Lanze-Forcella delle Lanze - Fiorentini Folgaria*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 43% 0%	

VE42P016 *Realizzazione nastro trasportatore Miramonti - Kaberlaba Asiago*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 82.500,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 50% 0%	

VE42P017 *Realizzazione nastro trasportatore Campomulo - Gallo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 127.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 50% 0%	

VE42P018 *Sostituzione scivola Creta Forata - Sappada*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 166.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 50% 0%	

VE42P020 *Revisione speciale seggiovia quadriposto a.a. Bai de Dones-Alpe Potor H.1,66M; Averau - Cortina*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	22.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.110,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo 22.822,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00							 31/12/2014 0% 20% 0%	

N. interv. nello Strumento: 29 S.R.A.: Sezione Mobilita

Tipo Strumento: **Strumenti di Attuazione diretta**

VE42P021 <i>Ammodernamento funivia Seraut-Punta Roca - Marmolada</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						352.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		50%	0%

VE42P022 <i>Revisione generale ed ammodernamento seggiovia quadriposto a.a. Lezuo-Belvedere - Pordoi</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	797.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.904,82	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						797.452,41	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		50%	0%

VE42P024 <i>Rinnovo di vita tecnica della sciovia Campetti Santa Lucia 3 DX - Sappada</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						163.500,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		50%	0%

VE42P025 <i>Revisione generale seggiovia biposto a.f. Eiben-Col dei Mughi - Sappada</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						193.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		50%	0%

VE42P026 <i>Ammodernamento funivia Cortina-Col Druscie - Tofana</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	159.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.760,00	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						159.776,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		10%	0%

VE42P027 <i>Revisione generale seggiovia biposto Palfavera-Pioda</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto		
Verificata	520.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.160,00	N. vers.	2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
FSC PAR su costo						520.080,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC
						0,00		50%	0%

Tipo Strumento: **Strumenti di Attuazione diretta**

S.R.A.: **Sezione Mobilita**

N. interv. nello Strumento: **29**

Revisione generale seggiovia quadriposto a.a. Sotto Crepa-Son de Prade - Tofana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo 139.200,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00
FSC PAR su costo 139.200,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00

Revisione generale della funivia Ra Valles-Cima Tofana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	234.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo 234.900,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00

Ammodernamento seggiovia triposto a.f. Col dei Pez-Faverghera - Nevegal

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.580,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo 27.790,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00

Revisione generale sciovvia Baby-Kaberlabla

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo 8.250,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00

Revisione speciale sciovvia Kaberlabla Est

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo 43.250,00							Economie FSC 0,00	Altro FSC	0,00

VE53P001 *Riqualficazione urbana e viabilistica della Piazza San Giorgio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Palu' (VR)				
Verificata	369.602,45	145.969,95	145.969,95	0,00	0,00	650.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							300.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										22%		57%
										22%		22%

VE53P002 *Riqualficazione del centro urbano del capoluogo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Costabissara (VI)				
Verificata	24.438,36	24.438,36	24.438,36	0,00	0,00	810.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							405.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										3%		3%
										3%		3%

VE53P003 *Sistemazione aree pubbliche pedonali e parcheggi collocate ad est e ad ovest della chiesa di Caselle di Altivole*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Altivole (TV)				
Verificata	567.639,92	556.719,03	556.719,03	0,00	0,00	630.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							441.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										88%		90%
										88%		88%

VE53P004 *Completamento dell'anello pedonale a servizio del centro urbano*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Santa Margherita D'Adige (PD)				
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							201.550,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										0%		0%
										0%		0%

VE53P005 *Riqualficazione centro urbano Piazza Carlo Ederle a Grezzana - primo stralcio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Grezzana (VR)				
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							600.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										0%		0%
										0%		0%

VE53P006 *Opere di completamento di percorsi pedonali, arredo urbano, aree verdi e illuminazione pubblica nel centro storico*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Crespadoro (VI)				
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							200.160,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00	
										0%		0%
										0%		0%

VE53P007 Riqualficazione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale con interventi finalizzati al risparmio energetico

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	381.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Comune di Castelmassa (RO)
FSC PAR su costo 240.000,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P008 Il territorio di Tiziano e di Cima da Conegliano: le comunita', l'arte ed i luoghi della fede

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	Comune di San Fior (TV)
FSC PAR su costo 588.000,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P009 Recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	36.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	Comune di Gazzo (PD)
FSC PAR su costo 304.000,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P010 Sistemazione e riqualficazione viaria della Piazza di Ponte Crepaldo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	16.885,00	2.976,20	2.376,20	0,00	0,00	400.000,00	Comune di Eraclea (VE)
FSC PAR su costo 240.000,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P011 Riqualficazione urbana nei Centri Dolomiti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	55.839,62	28.313,76	28.313,76	0,00	0,00	799.963,00	Comunita Montana Della Valle del Boite
FSC PAR su costo 591.173,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P012 Riqualficazione centro storico e Piazza della Pieve a Coste - Secondo stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	39.217,98	39.217,98	39.217,98	0,00	0,00	460.000,00	Comune di Maser (TV)
FSC PAR su costo 345.000,00							N. vers. 5
Economie FSC 0,00							31/12/2014
Altro FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VE53P013 *Riqualficazione di Piazza Roma e aree paesaggistiche contigue al centro storico di Quinto di Treviso - Terzo stralcio - Piazza Roma*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	72.264,32	25.129,21	25.129,21	0,00	0,00	857.000,00	Comune di Quinto Di Treviso (TV)
<p>FSC PAR su costo 514.200,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 3% 8% 3%</p>							

VE53P014 *Secondo stralcio centro storico - Sistemazione pavimentazioni e arredi: riqualficazione della porta Sud*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	18.491,97	18.491,97	18.491,97	0,00	0,00	600.000,00	Comune di Valdagno (VI)
<p>FSC PAR su costo 360.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 3% 3% 3%</p>							

VE53P015 *Intervento di riqualficazione del centro urbano del capoluogo di Bressanvido nell'area adibita a funzioni pubbliche*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	Comune di Bressanvido (VI)
<p>FSC PAR su costo 525.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 0% 0%</p>							

VE53P016 *Completamento e qualficazione dei percorsi di collegamento fra i centri urbani di Valsanzibio, Galzignano e Battaglia*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	Comune di Galzignano Terme (PD)
<p>FSC PAR su costo 200.016,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 0% 0%</p>							

VE53P017 *Riqualficazione del centro di Signoressa con miglioramento della sicurezza - Secondo stralcio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	847.856,20	306.968,09	306.968,09	0,00	0,00	920.000,00	Comune di Trevignano (TV)
<p>FSC PAR su costo 600.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 33% 92% 33%</p>							

VE53P018 *L'agro centuriato del Camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	50.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	Federazione dei Comuni del Camposampierese
<p>FSC PAR su costo 580.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00</p> <p>N. vers. 5 31/12/2014</p> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 6% 0%</p>							



Riqualficazione della Piazza del Comune						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	750.000,00	91.978,76	91.978,76	0,00	0,00	750.000,00
FSC PAR su costo 440.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Creazzo (VI) N. vers. 5 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

Riqualficazione dei centri urbani nell' Area pedemontana del Brenta						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	42.988,32	42.988,32	42.988,32	0,00	0,00	825.000,00
FSC PAR su costo 495.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Cassola (VI) N. vers. 2 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

Riqualficazione del centro urbano						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FSC PAR su costo 224.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Conco (VI) N. vers. 5 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

Riqualficazione degli spazi centrali del centro urbano di Gruaro: sistemazione pavimentazioni e arredo urbano Piazza San Giusto						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FSC PAR su costo 210.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: COMUNE DI GRUARO (VE) N. vers. 5 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

Completamento del riordino urbanistico del centro storico						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FSC PAR su costo 210.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Orgiano (VI) N. vers. 2 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

Lavori di riqualficazione del centro urbano di Pegolotte di Cona						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	2.642,64	2.642,64	2.642,64	0,00	0,00	300.000,00
FSC PAR su costo 240.000,00 Economie FSC 0,00 Altro FSC 0,00						
Attuatore: Comune di Cona (VE) N. vers. 2 31/12/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						

VE53P025 *Intervento di recupero e riqualficazione aree esterne di pertinenza di Villa Farsetti*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	29.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Comune di Santa Maria Di Sala (VE)	2	0%	
FSC PAR su costo						600.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0%

VE53P026 *Riqualficazione urbana ed architettonica di Piazza S.Barolomeo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Comune di Fosso' (VE)	2	0%	
FSC PAR su costo						350.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0%

VE53P027 *Nuove prospettive urbane in sinistra Piave Mel-Lentiai-Vas: Interventi di riqualficazione del costruito per una maggiore attrattivita sociale ed economica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	100.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	Comune di Mel (BL)	2	0%	
FSC PAR su costo						600.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	11%

VE53P028 *Completamento, miglioramento dell'arredo urbano e messa in sicurezza della viabilita del centro storico di S.Germano dei Berici*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	Comune di San Germano Dei Berici (VI)	2	0%	
FSC PAR su costo						204.750,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0%

VE53P029 *Riqualficazione di Piazza Marconi*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Comune di Isola Rizza (VR)	2	0%	
FSC PAR su costo						240.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0%

VE53P030 *Lavori di sistemazione e completamento Piazza Italia*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	Comune di Villafranca Padovana (PD)	2	0%	
FSC PAR su costo						214.200,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0%



VE53P031 *Riqualficazione urbanistica Piazza di Santa Maria Assunta*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Campolongo Maggiore (VE)			
Verificata	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							285.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00

VE53P032 *Realizzazione di portico pedonale tra Via Schiavonia e Via Roma lungo la s. n. 13 progressiva lato destro da km 14+745 a km 14+820*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Preganziol (TV)			
Verificata	56.822,66	13.313,87	13.313,87	0,00	0,00	370.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							205.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00

VE53P033 *Progetto di sviluppo del centro abitato di San Pietro - 3? stralcio. Riqualficazione del Parco dell'Emigrante - Parco dell'Emigrante Vicentina*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Valdagno (VI)			
Verificata	14.295,14	14.295,14	14.295,14	0,00	0,00	250.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							200.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00

VE53P034 *Riqualficazione Corso Mazzini da Via Roma a Via Serena*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Montebelluna (TV)			
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
FSC PAR su costo							330.000,00	Economie FSC	0,00	Altro FSC	0,00

VE61P001 Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell'ambito del PAR FSC 2007/2013

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto				
Verificata	1.200.000,00	636.806,71	636.806,71	0,00	0,00	2.250.000,00	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							2.250.000,00	Economie FSC	0,00	31/12/2014	Altro FSC	0,00

VE61P002 Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato ad oggetto Programma Attuativo Regionale PAR FSC programmazione 2007-2013 Beni Culturali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto				
Verificata	65.000,00	34.475,06	34.475,06	0,00	0,00	130.000,00	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							130.000,00	Economie FSC	0,00	31/12/2014	Altro FSC	0,00

VE61P003 Servizio di Assistenza tecnica per le attività di competenza dell'AdG del PAR Veneto 2007-2013 del FSC

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto				
Verificata	121.987,70	11.578,41	0,00	0,00	0,00	121.987,80	N. vers. 4	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							121.987,80	Economie FSC	0,00	31/12/2014	Altro FSC	0%

VE61P004 SPESE MISSIONI PERSONALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto				
Verificata	5.000,00	1.105,07	1.105,07	0,00	0,00	15.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							15.000,00	Economie FSC	0,00	31/12/2014	Altro FSC	0,00

VE61P005 Assunzioni a tempo determinato nell'ambito del PAR FSC 2007/2013 per le Linee di intervento 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 5.3 e 6.1 e chiusura attività FSC 2000-2006

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto				
Verificata	160.000,00	29.025,28	29.025,28	0,00	0,00	710.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
FSC PAR su costo							710.000,00	Economie FSC	0,00	31/12/2014	Altro FSC	0,00

VE62P001 Valutazione strategica e operativa del Programma Attuativo Regionale - PAR FSC Veneto 2007-2013

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Verificata	151.581,92	68.040,67	68.040,67	0,00	0,00	151.581,92	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
FSC PAR su costo							151.581,92	Economie FSC	0,00
Altro FSC							0,00		
N. vers. 10							31/12/2014		
									45%
									45%
									100%

