



REGIONE DEL VENETO

Sviluppo Locale

Programmazione Decentrata

Cofinanziamento di interventi infrastrutturali
(l.r. 13/1999 - periodo 2004/2010)

Indice

| | |
|--|---------|
| <i>Introduzione</i> | 5 |
| PARTE I | |
| <i>Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali :</i> | 7 |
| <i>Annualità 2004</i> | 9 |
| <i>Annualità 2005</i> | 19 |
| <i>Annualità 2006</i> | 25 |
| <i>Annualità 2007</i> | 33 |
| <i>Annualità 2008</i> | 43 |
| <i>Annualità 2009</i> | 57 |
| <i>Annualità 2010</i> | 69 |
| PARTE II | |
| <i>Intese Programmatiche d'Area nel territorio veneto</i> | 81 |
| PARTE III | |
| <i>Tipologie di intervento finanziate e stato di avanzamento dei lavori - dati e grafici</i> | 109 |
| <i>Conclusione</i> | 121 |

Introduzione

La Programmazione decentrata

In questa pubblicazione vengono rappresentati gli interventi infrastrutturali proposti dai tavoli di concertazione locale, finanziati con le risorse destinate dalla Regione Veneto alla LR 13/1999 “Interventi regionali per i Patti territoriali” nel periodo dal 2004 al 2010, che costituiscono l'applicazione concreta della programmazione decentrata, metodo che la Regione ha scelto per rapportarsi con il territorio nell'ambito dello sviluppo locale.

L'Intesa Programmatica d'Area

L'Intesa Programmatica d'Area (IPA) è uno strumento di programmazione decentrata introdotto dalla L.R. 35/2001 “Nuove norme sulla Programmazione”, derivante dalla regionalizzazione del metodo adottato nella precedente esperienza dei Patti territoriali; rappresenta momenti di concertazione tra soggetti pubblici e parti economiche e sociali, con funzioni di analisi e di proposta delle azioni di sviluppo prioritarie per l'area di appartenenza.

Le Intese programmatiche d'area, in sostanza, costituiscono ambiti territoriali di programmazione: per mezzo di esse, la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale, attraverso accordi e proposte finalizzate allo sviluppo economico e sociale di aree territoriali sub-regionali.

Con DGR n. 2796/2006 sono stati stabiliti i principi per la formazione e la gestione dell'IPA.

Il cofinanziamento di interventi infrastrutturali

La Regione Veneto, sulla base delle modifiche apportate dalla legge finanziaria regionale del 2003 alla LR 13/1999, ha favorito la regionalizzazione dei Patti territoriali attivati nel territorio per mezzo di Intese programmatiche d'area, mediante il sostegno alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisetoriali di sviluppo locale.

La legge finanziaria regionale del 2004 ha ulteriormente modificato la L.R. 13/1999, permettendo di includere, tra le tipologie di intervento finanziabili, gli interventi infrastrutturali presentati dai tavoli di concertazione delle Intese programmatiche d'area.

Alla luce di ciò, nel periodo dal 2004 al 2010 con il metodo della programmazione decentrata sono stati complessivamente assegnati contributi regionali per circa 82 milioni di euro per la realizzazione di 87 interventi infrastrutturali, dichiarati strategici dai soggetti responsabili delle Intese programmatiche d'area a seguito di decisioni assunte nei rispettivi tavoli di concertazione locale.

Si tratta di opere pubbliche inerenti le principali linee di intervento riconducibili allo sviluppo locale (sviluppo turistico, beni culturali, valorizzazione delle risorse paesaggistiche, riqualificazione centri urbani, etc.). I progetti sono stati istruiti dalla Direzione Programmazione con il supporto di pareri tecnici delle competenti Direzioni di settore e della valutazione complessiva del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), nel rispetto dei contenuti previsti dai bandi annuali.

Questi sono i provvedimenti con i quali la Giunta Regionale ha deliberato i relativi finanziamenti:

DGR n. 4410 del 29/12/2004, contributi per € 10.000.000,00;

DGR n. 4197 del 30/12/2005, contributi per € 5.000.000,00;

DGR n. 3898 del 12/12/2006, contributi per € 5.828.374,96;

DGR n. 3671 del 20/11/2007, contributi per € 10.128.838,24;

DGR n. 4081 del 30/12/2008, contributi per € 21.920.000,00;

DGR n. 3955 del 22/12/2009, contributi per € 18.000.000,00;

DGR n. 3535 del 30/12/2010, contributi per € 11.292.450,00.


Nella presente pubblicazione si illustra lo stato di attuazione al 31/12/2014 delle iniziative finanziate .

PARTE I

PROGRAMMAZIONE DECENTRATA

Cofinanziamento di interventi infrastrutturali

annualità 2004



Sistema Polesine
Dolomiti Venete
Chioggia Cavarzere Cona
Bassa Padovana
Ovest Vicentino
Riviera del Brenta
Altopiano dei Sette Comuni
Montagna Veronese
Basso Veronese e Colognese

Anno 2004 - DGR n. 3039 e DGR n. 4410

DGR n. 3039 del 01/10/2004 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/99 e art. 25 LR 35/2001)”.



Risorse a disposizione: 10 milioni di euro.

Tipologie ammissibili: opere e infrastrutture pubbliche nei settori dello sviluppo locale e turistico, compresi i beni culturali.

Istruite 16 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 59 progetti.

DGR n. 4410 del 29/12/2004 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 3039/2004”.

Individuati 9 interventi finanziabili, con impegno di tutte le risorse stanziare (10 milioni di euro). Altri 8 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziabili; non ammissibili i rimanenti 42.

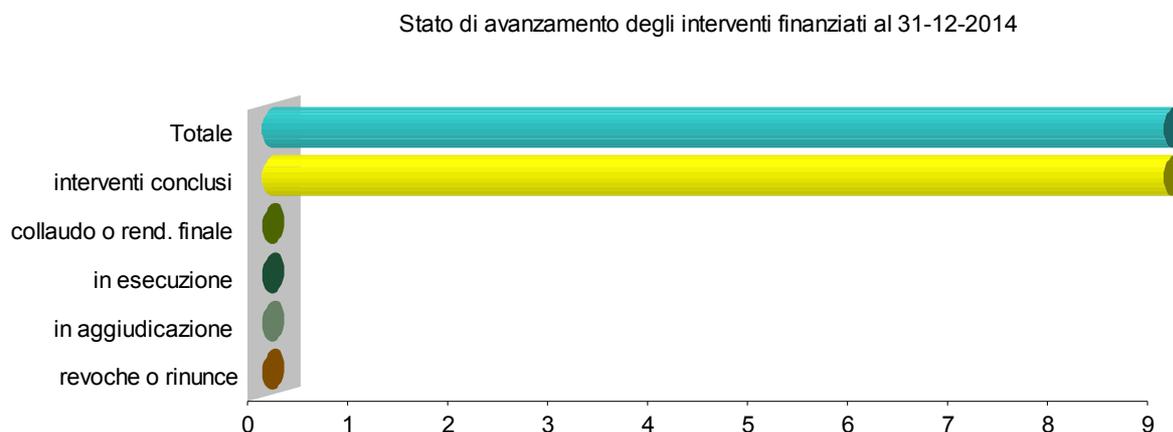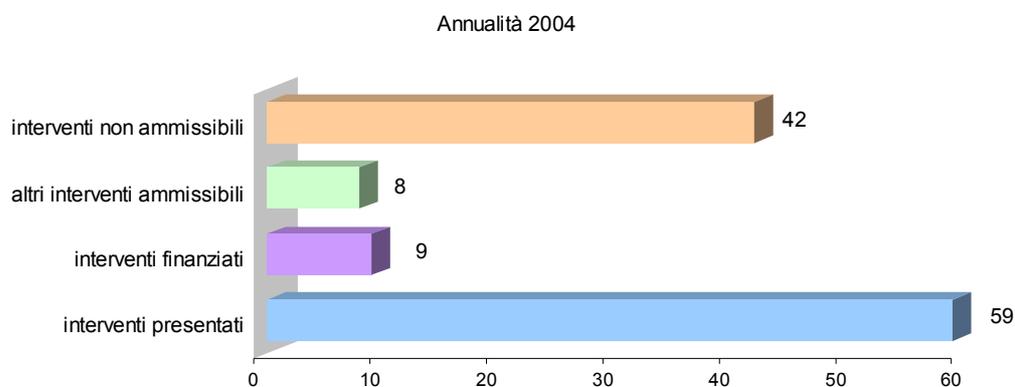

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Sistema Polesine | Comune di Pincara | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco- Po di Levante | 3.050.000 | 1.423.500 | concluso |
| Dolomiti Venete | U.M. Cadore Longaronese Zoldo | Progetto integrato: valorizzazione turistico-ambientale del territorio | 1.860.093 | 1.423.500 | concluso |
| Chioggia Cavarzere Cona | Comune di Chioggia | Realizzazione di un polo agroalimentare con ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Brondolo | 3.746.175 | 1.349.600 | concluso |
| Bassa Padovana | Cosecon s.p.a. | Opere di urbanizzazione Area PIP Casale di Scodosia | 1.000.000 | 664.400 | concluso |
| Ovest Vicentino | Comune di Chiampo | Viabilità di collegamento tra la nuova zona industriale e la SP Val di Chiampo in zona Pieve Bassa | 1.285.000 | 915.000 | concluso |
| Riviera del Brenta | Comune di Mira | Restauro Villa Contarini 1° - 3° stralcio | 4.180.000 | 1.423.500 | concluso |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Foza | Restauro e riqualificazione dell'ex sede municipale con destinazione d'uso a museo | 1.050.479 | 887.200 | concluso |
| Montagna Veronese | Comune di Bosco Chiesanuova | Realizzazione di strutture turistico-sportive polifunzionali ricreative Monti Lessini | 2.010.000 | 1.335.500 | concluso |
| Basso Veronese e Colognese | Comune di Albaredo d'Adige | Recupero dell'ex casa del fascio quale centro socio-culturale del territorio | 1.150.886 | 577.800 | concluso |
| totale | | | 19.332.633 | 10.000.000 | |

Soggetto attuatore: *Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo*

Titolo: Valorizzazione turistico ambientale del territorio

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Castello Lavazzo, Comune di Cibiana, Forno di Zoldo, Pralongo-Ospitale di Cadore, Soerverzene, Zoldo Alto, Pian-Zoppè di Cadore, Riva del Ponte-Zoppè di Cadore,

Costo complessivo iniziale: 1.860.093

Fonte regionale: 1.423.500

Fonte comunale: 436.593

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Direzione Turismo

CUP: E74F06000000002

CONCLUSO

Nel 2004 all' **Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo** è stato finanziato il progetto integrato di "*Valorizzazione turistico ambientale del territorio*" con un contributo di € 1.423.500 su un costo complessivo di € 1.860.093. Il progetto, per la sua fase attuativa, è stato suddiviso in 16 interventi per consentire una miglior rilevazione delle fasi di avanzamento.

La progettazione delle opere è durata complessivamente 16 mesi, l'aggiudicazione è durata circa un mese per ogni singolo intervento, l'esecuzione dei lavori circa 34 mesi; il collaudo per ogni singolo intervento è durato circa un mese. L'intervento nel suo insieme ha avuto una durata complessiva di 52 mesi, con gli ultimi lavori terminati in febbraio e collaudati in marzo 2009.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Turismo n. 58 del 09/7/2009.

1) Percorso storico archeologico e naturalistico della Gardona - Castello Lavazzo - (contributo € 71.139)

Sistemazione dei percorsi esistenti in un itinerario ad anello che va a toccare tutte le emergenze di maggior rilievo, con creazione di aree di sosta per gli autoveicoli, pulitura e messa in sicurezza della torre e del muro difensivo della Gardona.

Intervento collaudato in data 31/12/2007.



2) Parcheggio a servizio della rete sentieristica a Podenzoi - Castello Lavazzo - (contributo € 61.922)

Creazione di una zona di sosta per veicoli (almeno 10), strutturata in modo da consentire facile accesso in un luogo strategicamente importante, quale punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici.

Intervento collaudato in data 15/11/2007.



3) Completamento e miglioramento del collegamento viario Stavel-Pianezze, ai fini della valorizzazione turistico-ambientale della Borgata di Pianezze - Comune di Cibiana - (contributo € 179.146)

Sistemazione del collegamento che si diparte dall'attuale Strada Provinciale per l'accesso alla borgata di Pianezze (abitato di origini antiche situato a monte dell'asse viario) in forma compatibile con il delicato contesto ambientale del percorso.

Intervento collaudato in data 23/02/2009.



4) Lavori per la realizzazione di un'area ricreativa a Forno di Zoldo (contributo € 176.016)

Opere di trasformazione di una zona ad immediata accessibilità turistica in area a verde attrezzato polifunzionale, con creazione di area per il gioco dei bambini, spazio centrale con tribuna per piccoli spettacoli, parcheggio veicolare e tracciato ciclo-pedonale lungo l'argine.

Intervento collaudato in data 15/11/2007.



5) Manutenzione straordinaria fabbricato Pian dei Pez - Forno di Zoldo - (contributo € 101.705)

Adeguamento funzionale (impianto elettrico, idro-termosanitario e locale cucina nonché servizi) di un fabbricato utilizzato come casa-campeggio, per lo svolgimento di settimane bianche e verdi da parte delle scolaresche. Intervento collaudato in data 13/7/2007.



6) Interventi di sistemazione della rete sentieristica a Forno di Zoldo (contributo € 22.918)

Ripristino di percorsi pedonali mediante sistemazione dei sentieri esistenti, con realizzazioni ex-novo ove non presenti. Creazione di scalinate in legname nei tratti di maggiore pendenza e inserimento di arredi quali panchine, frecce direzionali, tabelle e pannelli illustrativi. Intervento collaudato in data 31/12/2007.



7) Interventi di adeguamento, ripristino e ricomposizione ambientale in località Pralongo - Ospitale di Cadore - (contributo € 42.705).

Riqualificazione di un'area utilizzata come campo scuola estivo con recupero del corpo fabbricato principale per cucina, magazzini e altri servizi. Inoltre, realizzazione di un parco giochi, miglioramento dei sentieri esistenti e creazione di un'area di sosta attrezzata con tavoli e panchine. Intervento collaudato in data 31/12/2007.



8) Valorizzazione turistico-ambientale della frazione di Davestra: sistemazione rete sentieristica e recupero zona archeologica di Paluch - Ospitale di Cadore - (contributo € 62.349).

Realizzazione di un'area attrezzata per bambini e di un parcheggio, ripulitura di uno spiazzo nei pressi del sito archeologico (per miglior fruibilità) e collegamento della forgia di epoca medievale con l'abitato mediante una rete sentieristica. Intervento collaudato in data 31/12/2007.




9) Sistemazione della rete sentieristica di Soverzene (contributo € 43.559).

Recupero di un percorso esistente e delle emergenze storiche (vedetta di epoca romana e fornace da calce), con posizionamento lungo i sentieri di panchine, tavoli nei punti sosta panoramici, tabelle e cartelli descrittivi del percorso e delle emergenze storiche. Intervento collaudato in data 31/12/2007.



10) Sistemazione area camper e parcheggi in località Palafavera - Zoldo Alto - (contributo € 142.350)

Creazione di un'area attrezzata con 20 aree di sosta per camper, 44 posti auto, passerella pedonale di collegamento ed inserimento di elementi quali le piantumazioni arbustive ed arboree, prese dell'acquedotto, vasche per lo scarico e punti luce. Intervento collaudato in data 21/11/2008.

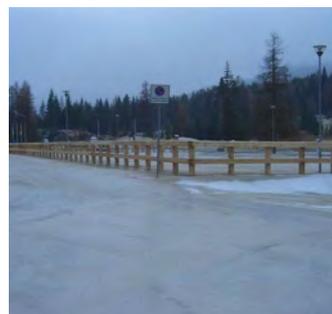

11) Ripristino della funzionalità del sentiero Mas di Sa-be Iral Ru sech - Zoldo Alto (contributo € 30.249).

Collegamento, anche ciclabile, con punti di elevato interesse naturalistico. Le opere riguardano la miglior percorribilità nonché il posizionamento di arredi quali panchine, tabelle illustrative e frecce direzionali.

Intervento collaudato in data 31/12/2007.



12) Realizzazione di un'area ricreativa turistica in loc. Pian - Zoppè di Cadore (contributo € 20.071)

Creazione di un luogo di sosta e svago con recinzione e inserimento di elementi di arredo quali tavoli, panche, posti fuoco e piccolo parcheggio (3 posti auto). Spazio particolarmente adatto per chi utilizza il tratto di strada adiacente per raggiungere i luoghi di partenza di percorsi di montagna.

Intervento collaudato in data 31/12/2007.



13) Recupero mediante ricostruzione di un mulino ad acqua in loc. Riva del Ponte - Zoppè di Cadore - (contributo € 146.905).

Ripristino di un mulino di tipo bi-albero andato distrutto con le alluvioni del 1890 e del 1966, che merita di essere valorizzato a scopo prevalentemente culturale e didattico divulgativo, in quanto elemento di rilievo dell'economia locale dei secoli scorsi.

Intervento collaudato in data 31/12/2007.



14) Completamento piazzola attrezzata eliporto - Zoldo Alto - (contributo € 83.702).

L'abilitazione al volo notturno dell'elisuperficie esistente, messa a norma, permette di usufruire di tempestive operazioni di soccorso, oltre alla disponibilità di un punto attrezzato per voli turistici in una zona dotata di maggior offerta di escursioni, con maggior margine di sicurezza.

Intervento collaudato in data 11/12/2008.



15) Interventi di sistemazione della rete sentieristica a Zoppè di Cadore (contributo € 60.641)

Opere per la fruibilità, agli abitanti del luogo e ai turisti, di alcuni sentieri di rilievo anche naturalistico e paesaggistico, che collegano le frazioni limitrofe ed i boschi che le circondano. Inserimento di tabelle descrittive e panchine.

Intervento collaudato in data 31/12/2007.



16) Cadore-Longarone-Zoldo: segnaletica e cartellonistica per la valorizzazione turistico-ambientale del territorio - Castello Lavazzo - Forno di Zoldo - Ospitale di Cadore - Soverzene - Zoldo Alto - Zoppè di Cadore - (contributo € 178.121)

Installazione di bacheche all'ingresso di ogni centro abitato per la descrizione di luoghi e servizi, cartelli indicatori della sentieristica, tabelloni a carattere storico-culturale nei punti notevoli e scritte mobili per disponibilità ricettiva e di attrezzature turistiche (piste e parcheggi).

Intervento collaudato in data 12/3/2009.



Soggetto attuatore: *Comune di Pincara*

Titolo: Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Pincara, Polesella, Trecenta, Villamarzana

Costo complessivo iniziale: 3.050.000

Fonte regionale: 1.423.500

Fonte comunale: 1.626.500

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: F21B05000500004

CONCLUSO

L'intervento è finalizzato al miglioramento e alla realizzazione di strutture turistico ricettive lungo l'asta fluviale del Canalbianco. Si prevede l'adeguamento della banchina esistente per l'attracco di imbarcazioni turistiche, la realizzazione di aree sosta camper e di percorsi turistici di interesse storico naturalistico.

I lavori si sono conclusi in data 31/7/2009, il collaudo è stato effettuato il 30/11/2010. La progettazione nel suo complesso è durata 30 mesi, l'aggiudicazione 3 mesi, l'esecuzione dei lavori circa 22 mesi. Il collaudo, avviato in corso d'opera, è durato in tutto 38 mesi; di 14 mesi è il periodo trascorso dalla fine dei lavori al termine del collaudo. La durata complessiva dalla data di assegnazione del contributo alla rendicontazione finale, presentata a luglio 2009, è stata di 78 mesi. Il costo finale è aumentato rispetto a quello iniziale di circa € 4.870 (0,2 %).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 213 del 20/9/2011.

contributo regionale erogato: € 1.423.500
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Mira*

Titolo: Restauro Villa Contarini dei Leoni 1° - 3° stralcio

IPA: Riviera del Brenta

Localizzazione: Mira

Costo complessivo iniziale: 4.180.000

Fonte regionale: 1.423.500

Fonte comunale: 2.756.500

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: C53G05000030004

CONCLUSO

Intervento di valorizzazione e conservazione della villa con restauro e protezione dei manufatti, degli elementi di decoro e delle finiture, con l'obiettivo di permettere la destinazione a centro culturale polivalente.

Nel complesso l'intervento è durato 54 mesi. La fase esecutiva, di circa 23 mesi, si è chiusa in data 20/5/2008; il collaudo è terminato il 20/3/2009.

La spesa totale sostenuta è risultata inferiore a quella prevista inizialmente, determinando economie sul contributo regionale pari ad € 45.614,84.

Intervento concluso con Decreto della Direzione LLPP n. 1064 del 31/8/2009.

contributo regionale erogato: € 1.377.885,17
avanzamento della spesa: 96,8%



Soggetto attuatore: *Comune di Chioggia***Titolo:** Realizzazione di un polo agroalimentare con ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Brondolo**IPA:** Chioggia Cavarzere Cona**Localizzazione:** Chioggia**Costo complessivo iniziale:** 3.746.175**Fonte regionale:** 1.349.600**Fonte comunale:** 2.396.574,80**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Prod. Agroalimentari**CUP:** I95C04000030006**CONCLUSO**

L'intervento prevede la riorganizzazione della struttura del mercato, in termini di edifici (per il miglior sfruttamento dell'impianto) di funzionamento operativo (ampliamento della gamma merceologica trattata), con spazi adeguati per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli a bassi costi gestionali.

Complessivamente l'intervento è durato 63 mesi, 48 dei quali per la progettazione e l'aggiudicazione, 15 per l'esecuzione dei lavori e il collaudo.

Nel corso dei lavori il costo dell'opera è aumentato del 6,6% per un totale definitivo di € 3.992.676,86 (maggiorazione di spesa a carico del Comune, il cui cofinanziamento è aumentato ad € 2.643.076,86).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 14 del 14/4/2010.

contributo regionale erogato: € 1.349.600
avanzamento della spesa: 100%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Bosco Chiesanuova***Titolo:** Realizzazione di strutture turistico sportive polifunzionali ricreative Monti Lessini**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Bosco Chiesanuova**Costo complessivo iniziale:** 2.010.000**Fonte regionale:** 1.335.500**Fonte comunale:** 674.500**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** H49B02000000004**CONCLUSO**

L'intervento consiste nella ristrutturazione dell'ex cinema-teatro ad uso sala convegni, di sostegno ai progetti di qualificazione dell'offerta turistica invernale (trasporti a fune, piste, innevamento programmato) e collaborazione per itinerari di trekking e ciclo-turismo. E' stato suddiviso in 4 stralci: 1) demolizione e scavo, 2) strutture metalliche e opere edili, 3) strutture metalliche, 4) opere edili e completamento impianti.

Nel suo complesso l'intervento ha avuto una durata di 78 mesi. Nel corso dei lavori si è verificato un aumento del costo iniziale pari all'85,8 %. La spesa complessivamente sostenuta ammonta ad € 3.734.329,32 (la maggiorazione di spesa è rimasta a carico del Comune).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1706 dell'11/11/2011

contributo regionale erogato: € 1.335.500
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Foza***Titolo:** Restauro e riqualificazione dell'ex sede Municipale con destinazione d'uso a Museo**IPA:** Altopiano dei Sette Comuni**Localizzazione:** Foza**Costo complessivo iniziale:** 1.050.479,35**Fonte regionale:** 887.200,00**Fonte comunale:** 163.279,35**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D27E06000030002**CONCLUSO**

L'intervento riguarda la ristrutturazione del fabbricato esistente, creando spazi idonei alla destinazione d'uso per il servizio pubblico culturale e per la conversione a museo, recuperando le parti architettoniche originali di maggiore importanza.

Complessivamente l'intervento è durato 60 mesi, 32 dei quali per l'esecuzione dei lavori (ultimati in data 30/10/2009) e il collaudo.

La spesa sostenuta è risultata inferiore di € 3.894,71 a quella inizialmente prevista, con economia regionale di € 3.289,87.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1739 del 17/11/2010.

contributo regionale erogato: € 883.910,13.
avanzamento della spesa: 99,6%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Albaredo d'Adige***Titolo:** Recupero dell'ex Casa del fascio quale Centro socio culturale del territorio**IPA:** Basso Veronese e Colognese**Localizzazione:** Albaredo d'Adige**Costo complessivo iniziale:** 1.150.886**Fonte regionale:** 577.800**Fonte comunale:** 573.086**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** B79I04000000006**CONCLUSO**

L'intervento prevede il recupero dell'edificio già sede municipale e la ristrutturazione del retrostante ex cinema-teatro. Prevede inoltre la creazione di un parcheggio, di una serie di percorsi che introducono ai nuovi accessi secondari e la sistemazione a verde attrezzato.

Complessivamente l'intervento è durato 48 mesi, dei quali circa 22 per la fase di esecuzione dei lavori.

Nel corso dei lavori il costo complessivo è aumentato del 42%, per un importo finale di € 1.637.058,46 (maggiorazione a carico del Comune).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1063 il 31/8/2009

contributo regionale erogato: € 577.800
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Chiampo*

Titolo: Viabilità di collegamento tra la nuova zona industriale e la SP Val di Chiampo in zona di Pieve Bassa

IPA: Ovest Vicentino

Localizzazione: Chiampo

Costo complessivo iniziale: 1.285.000

Fonte regionale: 915.000

Fonte comunale: 370.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: E81B06000060009

CONCLUSO

L'intervento consiste nella sistemazione della rete viaria con rotatoria urbana, nell'allargamento della sede stradale e nell'adeguamento del Ponte "Grumello" per consentire un'adeguata capacità, a fronte del previsto aumento del traffico e per il passaggio in sicurezza di pullman di pellegrini che si recano al locale Santuario.

Complessivamente l'intervento è durato 42 mesi, di cui 13 per la fase di esecuzione dei lavori (ultimati in data 22/10/2007). Il collaudo è terminato il 19/3/2008.

Il costo complessivo dell'opera è aumentato ad € 1.319.461,31 (maggiorazione della spesa a carico del Comune).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 203 del 08/9/2008.

contributo regionale erogato: € 915.000
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Cosecon S.p.a.*

Titolo: Opere di urbanizzazione Area PIP Casale di Scodosia

IPA: Bassa Padovana

Localizzazione: Casale di Scodosia

Costo complessivo iniziale: 1.000.000

Fonte regionale: 664.400

Fonte comunale: 335.600

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Artigianato

CUP: B14I05000040007

CONCLUSO

Si tratta di opere per il consolidamento e l'implementazione di insediamenti produttivi (PMI) per favorire lo sviluppo di attività economiche e servizi reali in ambito locale con implicazioni positive per le aree residenziali.

L'importo complessivo del progetto era di € 2.635.000, ma il contributo regionale è stato assegnato a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 1.000.000,00

L'esecuzione dei lavori è terminata il 31/3/2008. Certificato di collaudo e relazione generale acclarante, relativi alle opere di urbanizzazione, sono stati approvati in data 19/6/2009.


La spesa totale sostenuta, come da certificato di collaudo relativa alle opere di urbanizzazione, è di € 2.103.600,65.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Artigianato n. 40 del 05/5/2010.

contributo regionale erogato: € 664.400
avanzamento della spesa: 100%



annualità 2005



Sistema Polesine
Dolomiti Venete
Pedemontana del Grappa e dell'Asolano
Basso Veronese Colognese
Altopiano dei Sette Comuni

Anno 2005 - DGR n. 1848 e DGR n. 4197

DGR n. 1848 del 19/7/2005 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001).”



Risorse a disposizione: 5 milioni di euro.

Tipologie ammissibili: sviluppo turistico, beni culturali, valorizzazione di risorse paesaggistiche.

Istruite 16 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 48 progetti.

DGR n. 4197 del 30/12/2005 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1848/2005”.

Individuati 6 interventi finanziabili, con impegno di tutte le risorse stanziare (5 milioni di euro).
Altri 23 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 19.

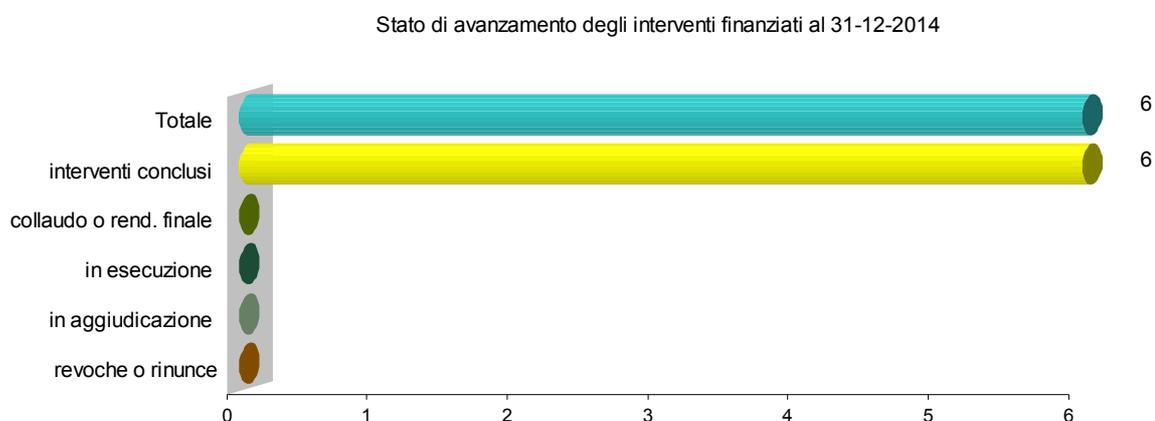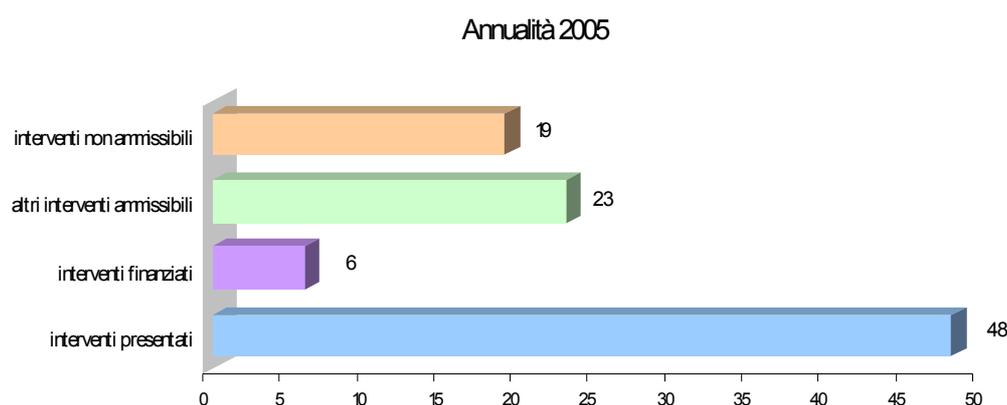

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|
| Dolomiti Venete | Comune di Auronzo di Cadore | Riqualificazione Comprensorio sciistico Monte Agudo. Realizzazione impianto di risalita Taiarezze-Malon | 2.925.000 | 1.500.000 | concluso |
| Dolomiti Venete | Comune di Comelico Superiore | Ampliamento e ammodernamento area sciabile in Padola di Comelico Superiore. Pista da sci denominata Campo | 1.005.402 | 754.050 | concluso |
| Sistema Polesine | Provincia di Rovigo | Lavori di ampliamento dell'istituto alberghiero di Adria | 1.200.000 | 629.920 (566.928) | concluso |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Fondazione Canova di Possagno | Osservatorio Canoviano della cultura della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | 800.000 | 592.000 | concluso |
| Basso Veronese e Colognese | Comune di Legnago | Realizzazione percorso ciclabile "dalle Alpi all'Adriatico" tratto VR sud | 1.208.760 | 906.530 | concluso |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Asiago | Adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio del ghiaccio | 950.000 | 617.500 | concluso |
| totale | | | 8.089.162 | 5.000.000 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Possagno*

Titolo: Osservatorio Canoviano e della cultura della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

IPA: Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Localizzazione: Possagno

Costo complessivo iniziale: 800.000

Fonte regionale: 592.000

Fonte comunale: 208.000

Classificazione: nuovo intervento

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: F87I06000030002

CONCLUSO

L'intervento intende valorizzare, con un Osservatorio, il Centro Studi Canoviano (dapprima ubicato sopra la pinacoteca), spostandolo all'interno dell'aggregato denominato "Casa Rossa" (ex edificio abbandonato), mediante ristrutturazione.

La durata complessiva dell'intervento è stata di 64 mesi, di cui 12 per l'esecuzione lavori.

Costo totale di poco inferiore (€ 787.612,34) a quello previsto inizialmente, che ha comportato un'economia sul contributo regionale di € 9.166,87.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1719 del 15/11/2011, poi rettificato con ulteriore Decreto n. 462 del 01/3/2012.

contributo regionale erogato: € 582.833,13
avanzamento della spesa: 98%



Soggetto attuatore: *Provincia di Rovigo*

Titolo: Lavori di ampliamento dell'Istituto Alberghiero di Adria

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Adria

Costo complessivo iniziale: 1.200.000

Fonte regionale: 629.920

Fonte comunale: 570.080

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G34F05000010004

CONCLUSO

L'intervento riguarda l'ampliamento del corpo aule sviluppato su tre piani, servizi bagno, deposito, ascensore. Cucina e ristorante capace di 80-90 posti a sedere con zona bar. Collegamento alla parte esistente tramite un ponte-corridoio al piano terra.

I lavori si sono conclusi in data 24/02/2010. Tuttavia, a causa di un prolungamento nell'operazione di collaudo, non si è chiusa la contabilità dell'opera con la rendicontazione finale entro i termini consentiti dalla norma regionale di contabilità (7 anni dall'assegnazione del contributo e dall'impegno regionale di spesa). Pertanto non è stata erogata la somma residua di € 62.992, pari al 10% del contributo (saldo).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 486 del 21/03/2013.

contributo regionale erogato: € 566.928
avanzamento della spesa: 90%



Soggetto attuatore: *Comune di Auronzo di Cadore*

Titolo: Riqualificazione Comprensorio sciistico Monte Agudo.
Realizzazione impianto di risalita Taiarezze-Malon

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Auronzo di Cadore

Costo complessivo iniziale: 2.925.0000

Fonte regionale: 1.500.000

Fonte comunale: 1.425.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Mobilità

CUP: B31I06000010004

CONCLUSO

L'intervento riguarda la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico nel comprensorio sciistico del Monte Agudo, opera ritenuta strategica per il rilancio del turismo invernale nel Cadore Centrale, dove Auronzo rappresenta l'elemento di traino da valorizzare.

Complessivamente l'intervento è durato 51 mesi (progettazione e aggiudicazione 18 mesi, lavori e collaudo 31 mesi, rendicontazione 2 mesi).

Il costo finale è incrementato ad € 6.350.000, con un ulteriore finanziamento di € 1.367.586 su fondi statali di cui alla delibera Cipe n. 40/2004.

Intervento concluso in data 24/02/2010.

contributo regionale erogato: € 1.500.000
avanzamento della spesa: 100%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Comelico Superiore*

Titolo: Ampliamento e ammodernamento area sciabile in Padola di Comelico Superiore. Pista da sci denominata Campo

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Comelico Superiore

Costo complessivo iniziale: 1.005.402,44

Fonte regionale: 754.050,00

Fonte comunale: 251.352,44

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Mobilità

CUP: D39B08000060006

CONCLUSO

L'intervento punta al miglioramento dell'offerta turistica invernale con l'ampliamento dell'attuale area sciistica di Padola, con un progetto che mira a soddisfare le esigenze tecniche di percorribilità e sicurezza contenendo e riducendo l'impatto dell'opera sull'ambiente. E' strettamente collegato con un altro intervento riguardante l'innevamento artificiale della pista, oggetto di altro finanziamento.


Alcuni imprevisti hanno determinato un notevole ritardo per l'approvazione della progettazione in Provincia.

Complessivamente l'intervento è durato 82 mesi, di cui ben 46 per la progettazione; esecuzione lavori e collaudo ultimati in 12 mesi.

Il costo complessivo, rispetto a quello iniziale, è diminuito ad € 967.392,36. Si è quindi registrata un'economia sul contributo regionale pari ad € 28.506,76.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Mobilità n. 310 del 07/11/2012.

contributo regionale erogato: € 725.544,24
avanzamento della spesa: 96,2%

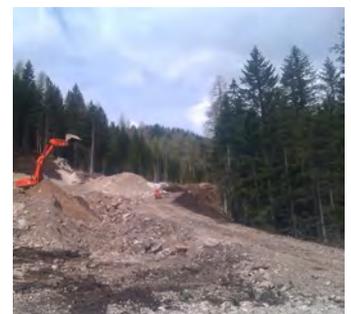

Soggetto attuatore: *Comune di Asiago***Titolo:** Adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio del Ghiaccio**IPA:** Altopiano dei Sette Comuni**Localizzazione:** Asiago**Costo complessivo iniziale:** 950.000**Fonte regionale:** 617.500**Fonte comunale:** 332.500**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D48C05000020001**CONCLUSO**

L'intervento intende rendere la struttura polivalente idonea a scopi anche diversi dalla pratica sportiva, ampliando i servizi offerti al turismo dell'Altopiano. I lavori prevedono la modifica dell'impianto di ventilazione e deumidificazione, il risanamento acustico, la dotazione di un palco e il completamento locali - bar.

Complessivamente l'intervento è durato 58 mesi, di cui 26 per la fase di esecuzione dei lavori (ultimati il 23/4/2010); collaudato in data 30/6/2010.

Sostenuta una spesa di poco inferiore rispetto alla previsione iniziale, che ha determinato una corrispondente economia sul contributo regionale.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1733 del 17/11/2010.

contributo regionale erogato: € 616.409,77
avanzamento della spesa: 99,8%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Legnago***Titolo:** Realizzazione percorso ciclabile "Dalle Alpi all'Adriatico" tratto VR sud**IPA:** Basso Veronese e Colognese**Localizzazione:** Angiari, Castagnaro, Legnago, Roverchiara, Villa Bartolomea**Costo complessivo iniziale:** 1.208.759,66**Fonte regionale:** 906.530**Fonte comunale:** 302.229,66**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Infrastrutture**CUP:** B31B05000350009**CONCLUSO**

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso per ciclisti e pedoni di circa 25 km lungo il fiume Adige, immerso nella natura e quindi ad elevato carattere naturalistico, collegato alla viabilità ordinaria e alle altre infrastrutture ciclabili e pedonali già esistenti. Si prevede anche la posa di elementi di arredo come panchine e cestini.

Complessivamente l'intervento è durato 72 mesi, di cui 34 per la progettazione, 2 per l'aggiudicazione, 24 per l'esecuzione dei lavori (ultimati in data 20/6/2011), 12 per il collaudo e la rendicontazione finale.





Il costo totale è diminuito ad € 1.195.568,46, con economia sul contributo regionale di € 9.892,97.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n.137 del 24/7/2012 .

contributo regionale erogato: 896.637
avanzamento della spesa: 99%



annualità 2006



Sistema Polesine
Altopiano dei Sette Comuni
Prealpi Bellunesi
Bassa Padovana
Pedemontana del Grappa e dell'Asolano
Basso Veronese e Colognese
Chioggia Cavarzere Cona

Anno 2006 - DGR n. 1113 e DGR n. 3898

DGR n. 1113 del 18/04/2006 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001)”.



Risorse a disposizione: 5.828.374,96 euro.

Tipologie ammissibili: sviluppo turistico, beni culturali, valorizzazione di risorse paesaggistiche.

Istruite 16 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 43 progetti.

DGR n. 3898 del 12/12/2006 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1113/2006”.

Individuati 7 interventi finanziabili, con impegno di tutte le risorse stanziare (5.828.374,96 euro).
Altri 12 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 24.

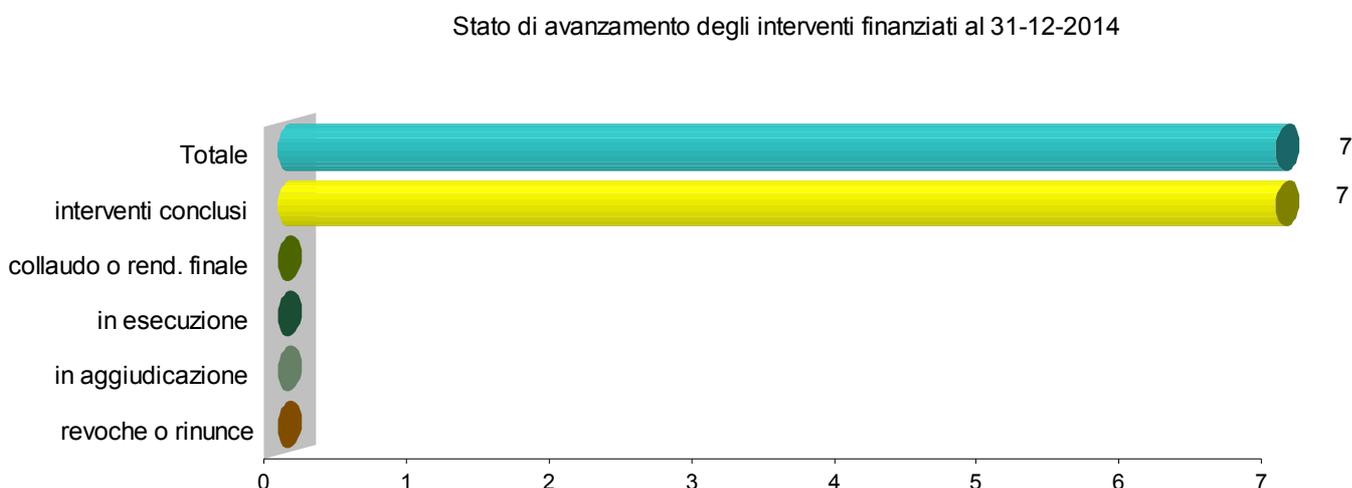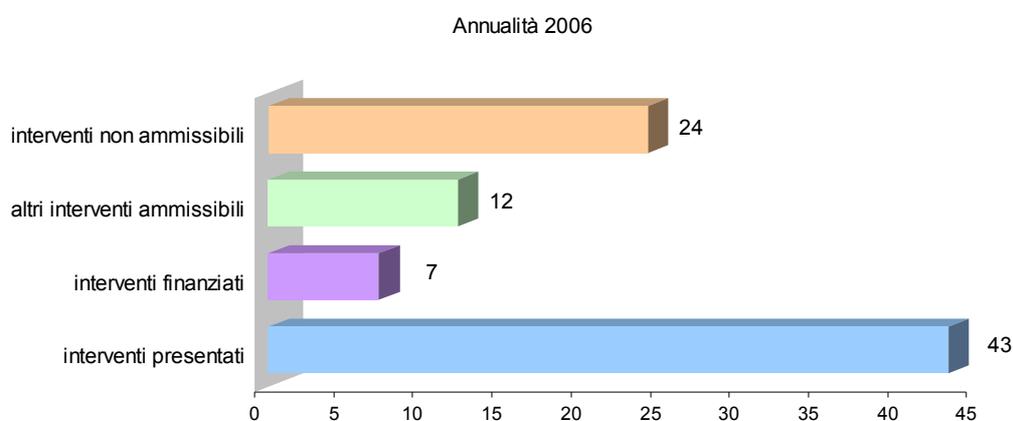

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|---------------------------------------|--|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| Sistema Polesine | Comune di Occhiobello | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della sinistra Po | 2.798.000 | 1.399.000 | concluso |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Gallio | Sistemazione e messa in sicurezza della strada turistica "Gallio - Melette - Monte Ortigara" | 892.371 | 633.371 | concluso |
| Prealpi Bellunesi | Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville | Progetto per la realizzazione di un centro culturale a Quero | 750.000 | 540.000 | concluso |
| Bassa Padovana | Comune di Pozzonovo | Lavori di ristrutturazione di Villa Centanini per trasformazione in museo della civiltà rurale-ostello- attività turistico ambientali | 1.200.000 | 900.000 | concluso |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Comune di San Zenone degli Ezzelini | Recupero della torre di Ezzelino a San Zenone degli Ezzelini | 800.000 | 600.000 | concluso |
| Basso Veronese e Colognese | Comune di Cerea | Valorizzazione delle potenzialità turistiche e congressuali dell'area fieristica della ex perfosfati di Cerea | 1.100.000 | 800.030 | concluso |
| Chioggia Cavarzere Cona | ASPO Chioggia | Riqualificazione area vecchio porto di Chioggia di Isola Saloni - Area filtro servizi logistici e supporto all'autostrada del mare | 1.850.000 | 955.974 | concluso |
| totale | | | 9.390.371 | 5.828.375 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Occhiobello***Titolo:** Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della sinistra Po**IPA:** Sistema Polesine**Localizzazione:** Bergantino, Calto, Canaro, Castelmasa, Castelnuovo Bariano, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Guarda Veneta, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Stienta, Villanova Marchesana**Costo complessivo iniziale:** 2.798.000**Fonte regionale:** 1.399.000**Fonte comunale:** 1.399.000**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D23G07000030006**CONCLUSO**

L'intervento è stato suddiviso in 2 parti: la prima parte consiste in opere ingegneristiche su acqua, la seconda in lavori stradali e segnaletica.

Nel complesso l'intervento è durato circa 57 mesi. L'aggiudicazione è avvenuta in data 30/11/2008 con ritardi dovuti alle tempistiche richieste dalla Conferenza dei Servizi e dalla Soprintendenza. Per la fase esecutiva sono occorsi 21 mesi (lavori ultimati il 22/8/2010).

La spesa finale sostenuta è inferiore di € 85.485,42 rispetto alla previsione iniziale; di conseguenza il contributo regionale è diminuito di € 42.742,71.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1709 del 11/11/2011.

contributo regionale erogato: € 1.356.257,28
avanzamento della spesa: 97%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Cerea***Titolo:** Valorizzazione delle potenzialità turistiche e congressuali dell'area fieristica della ex polifosfati di Cerea**IPA:** Basso Veronese e Colognese**Localizzazione:** Cerea**Costo complessivo iniziale:** 1.100.000**Fonte regionale:** 800.030**Fonte comunale:** 299.970**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** G95H07000000005**CONCLUSO**

L'intervento prevede opere di urbanizzazione e realizzazione di un'area attrezzata. Il progetto, attraverso infrastrutture di collegamento e servizio, valorizza le aree già completate o in fase di realizzazione che comprendono il centro fieristico Area Expo, il centro storico di Cerea, il parco naturale delle Vallette e il percorso delle Ville.

La durata complessiva dell'intervento è stata di 56 mesi. L'aggiudicazione è avvenuta il 06/3/2008. Per la fase esecutiva sono occorsi 24 mesi (lavori ultimati il 25/5/2010).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1708 del 11/11/2011.

contributo regionale erogato: € 800.030
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Gallio*

Titolo: Sistemazione e messa in sicurezza della strada turistica "Gallio-Melette-Monte Ortigara"

IPA: Altopiano dei Sette Comuni

Localizzazione: Asiago, Foza, Gallio, Roana, Rotzo

Costo complessivo iniziale: 892.370,64

Fonte regionale: 633.370,64

Fonte comunale: 259.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: B14E06000150006

CONCLUSO

Si tratta dell'unica vera strada di accesso alla zona più a nord dell'Altopiano dei Sette Comuni. L'opera interessa direttamente diversi altri comuni dell'altopiano, le cui proprietà (malghe, boschi e pascoli) possono essere raggiunte solo mediante tale arteria.

La durata complessiva dell'intervento è di stata di 50 mesi. Aggiudicazione avvenuta a dicembre del 2007. Per la fase esecutiva sono occorsi circa 18 mesi (lavori ultimati il 13/11/2009). Leggero aumento in corso dei lavori del costo dell'opera, fino ad € 897.456,99 (maggiorazione a carico del Comune).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 85 del 28/3/2011.

contributo regionale erogato: € 633.370,64
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *ASPO Chioggia*

Titolo: Riqualificazione area vecchio porto di Chioggia di Isola Saloni - Area filtro servizi logistici e supporto all'autostrada del mare

IPA: Chioggia Cavarzere Cona

Localizzazione: Chioggia

Costo complessivo iniziale: 1.850.000

Fonte regionale: 955.974,32

Fonte comunale: 894.025,68

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: I91G07000000008

CONCLUSO

Il progetto consiste nella ristrutturazione dell'attuale area servizi portuali, con lo spostamento della stessa e adeguamento in ampliamento mediante una nuova palazzina su 2 piani, adibita a servizi portuali e uffici amministrativi. L'intervento è mirato a favorire lo sviluppo del porto per il traffico marittimo a corto raggio.

La durata complessiva dell'intervento è stata di circa 22 mesi. I lavori si sono conclusi in 7 mesi (ultimazione il 15/5/2008). Collaudo in data 24/7/2008. Il costo complessivo dell'opera è aumentato ad € 2.197.460,94 (maggiorazione della spesa a carico del soggetto attuatore).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 245 del 01/10/2008.

contributo regionale erogato: € 955.974,32
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di S. Zenone degli Ezzelini*

Titolo: Recupero della Torre di Ezzelino a San Zenone degli Ezzelini

IPA: Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Localizzazione: San Zenone degli Ezzelini

Costo complessivo iniziale: 800.000

Fonte regionale: 600.000

Fonte comunale: 200.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Beni Culturali

CUP: C44D08000000006

CONCLUSO

Il progetto riguarda il restauro strutturale ed il consolidamento della Torre (sec. XV - compendio storico-monumentale del Castellaro), finalizzato alla realizzazione di una struttura museale espositiva con valenza sovracomunale dotata di pannelli didattici per i visitatori.

La durata complessiva dell'intervento è stata di circa 61 mesi. Aggiudicati i lavori il 04/6/2008 con ritardi dovuti al necessario adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza. Per la fase esecutiva dei lavori sono occorsi circa 38 mesi (ultimati in data 30/9/2011).

La spesa sostenuta, risulta inferiore di € 1.937,35 rispetto alla previsione iniziale (economie regionali di € 1.453,02).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Beni Culturali n. 35 del 15/3/2012.

contributo regionale erogato: € 598.546,98

avanzamento della spesa: 99,8%



Soggetto attuatore: *Unione dei Comuni Basso Feltrino Sette Ville*

Titolo: Progetto per la realizzazione di un centro culturale a Quero

IPA: Prealpi Bellunesi

Localizzazione: Quero

Costo complessivo iniziale: 750.000

Fonte regionale: 540.000

Fonte comunale: 210.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: B38F05000020006

CONCLUSO

L'intervento riguarda l'adeguamento di un fabbricato già esistente, un tempo adibito a cinema, con creazione di un centro culturale di promozione turistica, di valorizzazione organica del territorio con realizzazione di eventi, per chi si accinge a visitare la provincia di Belluno a Nord e di Treviso a Sud.

La durata complessiva dell'intervento è stata di 26 mesi. Per la fase esecutiva dei lavori sono occorsi 11 mesi (ultimati in data 26/9/2008).

Intervento concluso con Decreto della Direzione lavori Pubblici n. 1074 del 31/8/2009.

contributo regionale erogato: € 540.000

avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Pozzonovo*

Titolo: Lavori di ristrutturazione Villa Centanini per trasformazione in museo della civiltà rurale - ostello - attività turistico ambientali

Cod: VENR3AR3P019

IPA: Bassa Padovana

Localizzazione: Pozzonovo

Costo complessivo iniziale: 1.200.000

Fonte regionale: 900.000

Fonte comunale: 300.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Beni Culturali

CUP: E13J07000200004

CONCLUSO

L'intervento è mirato alla valorizzazione di un edificio storico di notevole pregio architettonico per la realizzazione di un impianto turistico-museale, con funzione di volano alle attività di fruizione del territorio rurale nel rispetto dei caratteri ambientali.

In fase di esecuzione dal 15/01/2009, l'intervento ha subito dei ritardi a causa del fallimento della ditta aggiudicataria, che ha determinato una sospensione dei lavori dal 30/12/2010. In data 22/12/2011 è stato firmato il contratto con la ditta 2° classificata per la prosecuzione dei lavori. Con Decreto della Direzione Beni Culturali n. 157 del 11/11/2011 concessa proroga dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale. Con ulteriore Decreto della Direzione beni Culturali n. 78 del 01/07/2013, concessa nuova proroga per rendicontazione finale entro ottobre 2013 (dilazione complessiva di circa 4,5 anni rispetto alla previsione iniziale).




Intervento concluso con Decreto della Direzione Beni Culturali n. 142 del 07/11/2013.

contributo regionale erogato: € 900.000,00

avanzamento della spesa: 100%



annualità 2007



*Prealpi Bellunesi
Dolomiti Venete
Sistema Polesine
Camposampierese
Area Berica
Castellana
Montagna Veronese
Chioggia Cavarzere Cona*

Anno 2007 - DGR n. 347 e DGR n. 3671

DGR n. 347 del 20/02/2007 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). Anno 2007”.

Risorse a disposizione: 8.500.000,00 euro.

Tipologie ammissibili: sviluppo turistico, beni culturali, valorizzazione di risorse paesaggistiche.



Istruite 20 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 51 progetti.

DGR n. 3671 del 20/11/2007 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR 347/2007”.

Individuati 11 interventi finanziabili.

Incrementata la somma messa a disposizione con DGR n. 347/2007 di ulteriori 1.628.838,24 euro, per un totale di risorse finanziarie assegnate pari a 10.128.838,24 euro.

Altri 8 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 32 .

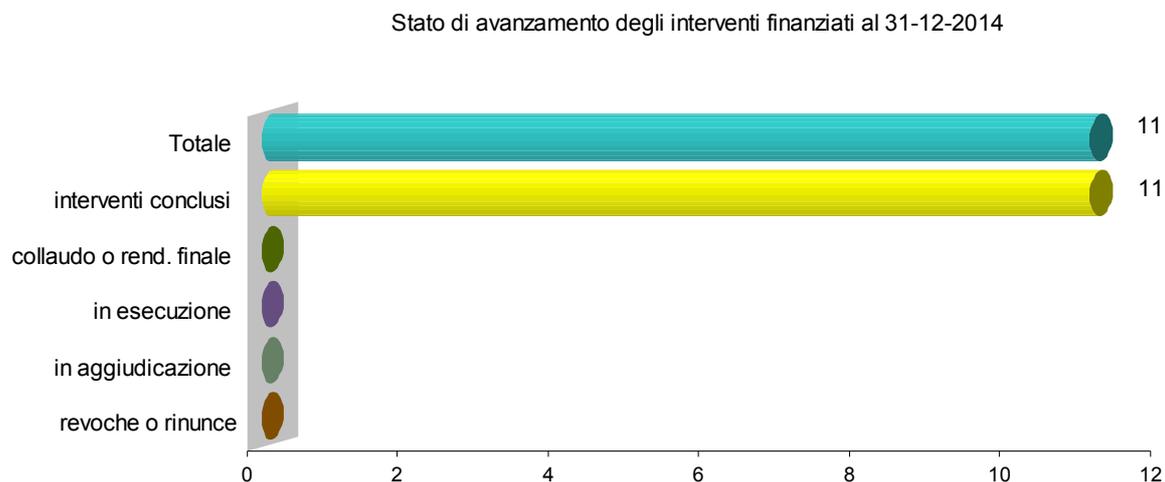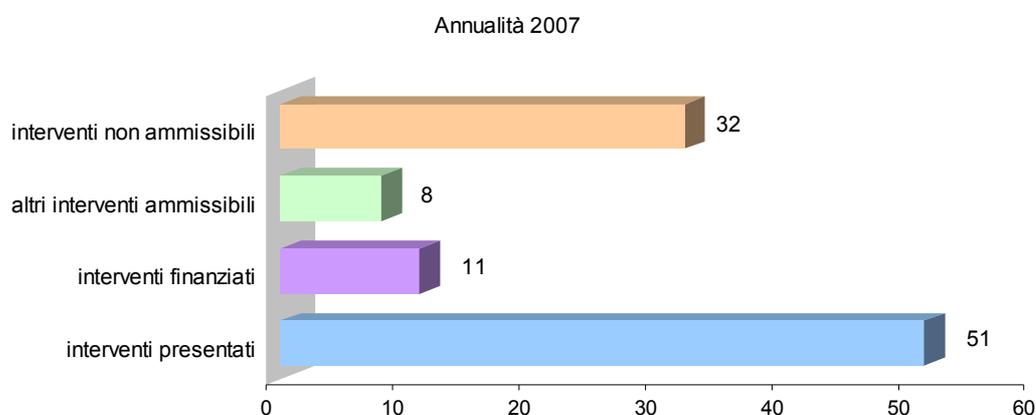

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|-------------------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Prealpi Bellunesi | Comune di Pedavena | Progetto di impianti sportivi e strutture ricettivo-turistiche in località Boscherai | 2.400.000 | 900.000 | concluso |
| Dolomiti Venete | Comune di Selva di Cadore | Realizzazione di un fabbricato da destinare a centro servizi polifunzionale finalizzato allo sviluppo turistico del territorio dell'Alto Agordino | 900.000 | 585.000 | concluso |
| Sistema Polesine | Comune di Fratta Polesine | Itinerario ciclabile intercomunale fra Adige e Po - 2° stralcio a completamento | 2.800.000 | 1.500.000 | concluso |
| Campo-sampierese | Provincia di Padova | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale - lotto A | 1.872.048 | 872.048 | concluso |
| Area Berica | Comune di Villaga | Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano del Pozzolo | 840.000 | 620.000 | concluso |
| Castellana | Comune di Castello di Godego | Realizzazione di un itinerario turistico lungo il fiume Muson denominato "Sui sentieri degli Ezzelini" | 1.570.000 | 1.077.500 | concluso |
| Montagna Veronese | Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella | Completamento recupero di Villa Bassani Brenzoni per alta formazione nel comparto della lavorazione lapidea | 700.000 | 525.000 | concluso |
| Chioggia Cavarzere Cona | Comune di Cavarzere | Restauro Palazzo Barbiani- sede municipale | 2.750.000 | 1.500.000 | concluso |
| Area Berica | Comune di Arcugnano | Pista ciclabile pedonale dal Lago di Fimon al Tormeno | 980.000 | 730.000 | concluso |
| Dolomiti Venete | Unione Montana della Valle del Boite | Completamento itinerario ciclo-pedonale "La lunga via delle Dolomiti" di collegamento tra i Comuni di Vodo di Cadore, Borca di Cadore, S.Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo - 3° stralcio | 1.017.630 | 819.290 | concluso |
| Sistema Polesine | Comune di Porto Viro | Collettore Padano Polesano - Progetto per la riqualificazione paesaggistico- ambientale e riuso strategico, finalizzato alla funzione turistica ricreativa delle aree coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso connessi | 2.000.000 | 1.000.000 | concluso |
| totale | | | 17.829.678 | 10.128.838 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Castello di Godego***Titolo:** Realizzazione di un itinerario turistico lungo il fiume Muson denominato "Sui sentieri degli Ezzelini"**IPA:** Castellana**Localizzazione:** Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X**Costo complessivo iniziale:** 1.570.000**Fonte regionale:** 1.077.500**Fonte comunale:** 492.500**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Infrastrutture**CUP:** E31B08000190004**CONCLUSO**

L'intervento riguarda la realizzazione di un percorso attrezzato lungo il corso d'acqua del Muson e del Muson dei Sassi, che attraversa i territori dei Comuni di Riese Pio X, Loria, Castello di Godego, Castelfranco Veneto e Resana. La lunghezza complessiva è di circa 19 km.

Ottenuti tutti i pareri sulla progettazione definitiva, conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per lievi modifiche apportate al tracciato. Suddivisione dei lavori in 2 stralci (lavori del 1° stralcio aggiudicati il 30/01/2010, lavori del 2° stralcio aggiudicati il 09/12/2010). Ultimazione dei lavori avvenuta in maggio 2012. Sostenuta una spesa finale di € 1.680.689,97, superiore a quella prevista inizialmente, la cui maggiorazione è rimasta a carico del Comune.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 256 del 22/11/2012.

contributo regionale erogato: € 1.077.500
avanzamento della spesa: 100%


**Soggetto attuatore:** *Comune di Villaga***Titolo:** Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano del Pozzolo**IPA:** Area Berica**Localizzazione:** Villaga**Costo complessivo iniziale:** 840.000**Fonte regionale:** 620.000**Fonte comunale:** 220.000**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D42G08000110006**CONCLUSO**

L'intervento prevede il recupero paesaggistico di un'area al centro dei Colli Berici, mediante il restauro di un vecchio fabbricato scolastico dismesso per adibirlo a centro di promozione delle attività turistiche, la sistemazione di percorsi naturalistici, il posizionamento di cartellonistica dei sentieri e la realizzazione di aree di soste e parcheggi.

A seguito di una rivisitazione della progettazione, per volontà dell'Amministrazione Comunale e oneri a carico della stessa, è aumentato il costo ad € 888.111,19 (fermo restando il contributo concesso). I lavori, iniziati il 28/09/2010, sono stati ultimati il 25/9/2012. A causa di un ritardo dovuto a rinuncia del collaudatore incaricato, su richiesta del comune nel mese di ottobre 2012, è stata concessa una proroga al 30/06/2014 con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 532 del 02/04/2013. L'opera è stata collaudata il 26/06/2014.

Intervento concluso con Decreto della Sezione Lavori Pubblici n. 942 del 09/09/2014.

contributo regionale erogato: € 620.000
avanzamento della spesa: 100%

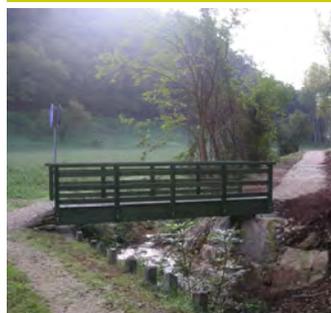

Soggetto attuatore: *Comune di Selva di Cadore*

Titolo: Realizzazione di un fabbricato da destinare a Centro servizi polifunzionale (kinderheim, bar-ristoro, attività logistico amministrativa e servizi di supporto alle attività sportive) finalizzato allo sviluppo turistico del territorio dell'Alto Agordino

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Selva di Cadore

Costo complessivo iniziale: 900.000

Fonte regionale: 585.000

Fonte comunale: 315.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: J63E1000090006

CONCLUSO

L'intervento costituisce parte di un progetto generale di riqualificazione del complesso sportivo esistente; è un'iniziativa di interesse sovracomunale nel settore dello sviluppo turistico e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche, che coinvolge i comuni limitrofi (in particolare Santa Lucia e Zoldo Alto).

L'intervento ha subito dei ritardi a causa di varianti, sia nella fase progettuale che in corso d'opera. L'aggiudicazione si è conclusa il 16/12/2010. I lavori, con sospensioni nei periodi invernali, sono stati effettuati dal 16/12/2010 al 19/12/2013. L'opera è stata collaudata il 06/08/2014. La Sezione Turismo ha concesso delle proroghe per la presentazione della rendicontazione finale, il cui ultimo termine è stato fissato 20/8/2014.

Intervento concluso con Decreto della Sezione Turismo n. 50 del 07/10/2014.

contributo regionale erogato: € 585.000
avanzamento della spesa: 100%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Cavarzere*

Titolo: Restauro Palazzo Barbiani - sede municipale

IPA: Chioggia Cavarzere Cona

Localizzazione: Cavarzere

Costo complessivo iniziale: 2.750.000

Fonte regionale: 1.500.000

Fonte comunale: 1.250.000 iniziale

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: H74D08000020004

CONCLUSO

Il progetto riguarda il restauro architettonico e dei particolari decorativi, basato sui documenti esistenti dell'immobile di proprietà del Comune (sede municipale), realizzando la modifica nella destinazione da sede di uffici esclusivamente istituzionali a sede anche di ambienti per attività culturali.

Complessivamente l'intervento è durato 59 mesi. Lavori aggiudicati in data 06/7/2009. Per la fase esecutiva sono occorsi 14 mesi (ultimazione il 19/11/2011), il collaudo è stato effettuato il 22/5/2012. Sostenuta una spesa finale di € 2.760.684,73, superiore a quella prevista inizialmente, la cui maggiorazione è rimasta a carico del Comune.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1441 del 19/11/2012.

contributo regionale erogato: € 1.500.000
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella*

Titolo: Completamento recupero di Villa Bassani Brenzoni per alta formazione nel comparto della lavorazione lapidea

IPA: Montagna Veronese

Localizzazione: Sant'Ambrogio di Valpolicella

Costo complessivo iniziale: 700.000

Fonte regionale: 525.000

Fonte comunale: 175.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Industria e Artigianato

CUP: I79G09000010002

CONCLUSO

L'intervento prevede l'adeguamento funzionale di alcune sale ai piani primo e secondo di Villa Bassani-Brenzoni (3° lotto), ai fini della candidatura a diventare la sede di un polo di eccellenza per l'alta formazione a servizio del distretto del marmo e delle pietre del Veneto.

In corso d'opera sono state apportate delle modifiche, ritenute necessarie e dovute in parte a cause impreviste e imprevedibili in fase di redazione del progetto, in parte a variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. Con DDR n. 43 del 23/3/2011, la Direzione Industria e Artigianato (acquisito il parere della Direzione LLPP) ha concesso il nulla osta per l'adozione della perizia suppletiva di variante. Complessivamente l'intervento è durato 54 mesi, di cui circa 13 dedicati all'esecuzione dei lavori (ultimati il 20/5/2011).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Industria e Artigianato n. 134 del 16/5/2012.

contributo regionale erogato: € 525.000

avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Fratta Polesine*

Titolo: Itinerario ciclabile intercomunale tra Adige e Po - 2° stralcio a completamento

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Arquà Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Pincara, Polesella, Villamarzana, Villanova del Ghebbo

Costo complessivo iniziale: 2.800.000

Fonte regionale: 1.500.000

Fonte comunale: 1.300.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: H26F08000010007

CONCLUSO

Completamento della pista ciclabile tra Adige e Po, per un percorso complessivo di 44 km. Il progetto coinvolge 8 comuni: Lendinara, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine (capofila), Pincara, Arquà Polesine, Villamarzana, Frassinelle, Polesella.

L'intervento è stato suddiviso in 3 appalti, in base alla tipologia delle opere (lavori stradali, illuminazione pubblica, segnaletica turistica). Esecuzione dei lavori avviata il 03/10/2011, giunta al termine il 31/12/2012. Con Decreto n. 262 del 03/12/2012 la Direzione Infrastrutture ha concesso proroga a gennaio 2013 per la presentazione della rendicontazione finale. Con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 35 del 08/5/2013 concessa ulteriore proroga. Opera collaudata il 22/4/2013. La spesa complessiva è stata inferiore (€ 2.755.459,12) rispetto alla previsione iniziale, generando un'economia a favore della Regione.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 219 del 07/10/2013.

contributo regionale erogato: € 1.476.138,92

avanzamento della spesa: 98,4%



Soggetto attuatore: *Comune di Porto Viro*

Titolo: Collettore Padano Polesano - Progetto per la riqualificazione paesaggistico-ambientale e riuso strategico, finalizzato alla fruizione turistico-ricreativa delle aree coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso connessi

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Porto Viro

Costo complessivo iniziale: 2.000.000

Fonte regionale: 1.000.000

Fonte comunale: 1.000.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: C31F08000010006

CONCLUSO

L'intervento riguarda la realizzazione di un percorso di visitazione ciclopedonale su entrambi i lati del canale per circa 12 km. Lungo i tracciati previste piazzole di sosta, lampioni fotovoltaici, segnaletiche turistiche e piante autoctone per la valorizzazione del paesaggio.

La fase attuativa ha subito un notevole ritardo rispetto al previsto; numerose proroghe sono state concesse dalla Direzione Infrastrutture. Lavori aggiudicati in data 29/03/2013, iniziati il 13/5/2013 e ultimati il 09/10/2014. L'opera è stata collaudata il 28/10/2014. Con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 40 del 08/03/2013 è stato fissato al 31/08/2014 il termine ultimo per la rendicontazione, poi ulteriormente prorogato con DDR n. 207 del 23/9/2014 al 31/10/2014. Sostenuta complessivamente una spesa leggermente inferiore al previsto (€ 1.970.082,26), con proporzionale riduzione del contributo.

Intervento concluso con Decreto della Sezione Infrastrutture n. 255 del 12/11/2014.

contributo regionale erogato: 985.041,13

avanzamento della spesa: 98,5%

**Soggetto attuatore:** *Provincia di Padova*

Titolo: Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lotto A

Cod: VENR5AR5P033

IPA: Camposampierese

Localizzazione: Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, San Giorgio d. Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe

Costo complessivo iniziale: 1.872.048

Fonte regionale: 872.048

Fonte provinciale: 1.000.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: G43D09000080003

CONCLUSO


Il progetto prevede la realizzazione di un percorso per bicicletta lungo il tratto dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia nell'area nord-est del territorio padovano (Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese e Trebaseleghe) con funzione di asse portante per tutti gli altri percorsi ecoturistici circostanti.

Modificato il cronoprogramma originario causa le diverse tempistiche per gli espropri. Aggiudicazione conclusa il 07/9/2011. Lavori eseguiti nel periodo dal 26/10/2011 al 12/7/2012. Sono stati poi eseguiti anche lavori di miglioria, con l'utilizzo di economie, per i quali, con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 253 del 15/11/2012, è stata concessa proroga per la rendicontazione finale a settembre 2013.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 293 del 25/11/2013.

contributo regionale erogato: 872.048

avanzamento della spesa: 100%

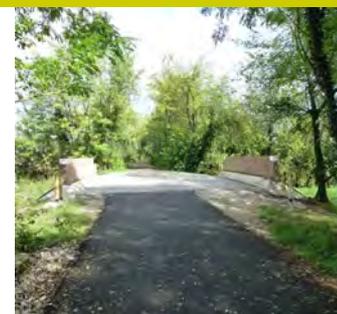

Soggetto attuatore: *Unione Montana Valle del Boite*

Titolo: Completamento itinerario ciclo-pedonale "La lunga via delle Dolomiti" di collegamento tra i comuni di Vodo di Cadore, Borca di Cadore, S. Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo - 3° stralcio

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Borca di C., San Vito di C., Vodo di C.

Costo complessivo iniziale: 1.017.630

Fonte regionale: 819.290

Fonte comunale: 198.340

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: E36G08000220007

CONCLUSO

Il progetto migliora la rete di servizi ai turisti in contesti di valenza ambientale e culturale mediante la realizzazione di tratti ciclo-pedonali e collegamenti di percorsi già esistenti. Il tracciato complessivo, disegnato lungo il percorso della vecchia ferrovia delle Dolomiti, parte dalla Stazione di Calalzo (veduta delle Marmarole) per entrare nella Valle del torrente Boite (vista dell'Antelao e del Pelmo); la pista prosegue verso la valle di Borca di Cadore e San Vito (sfondo delle Tofane), per poi correre tra i prati di Cortina d'Ampezzo, attraversare il valico di Cima Banche ed entrare nell'Alto Adige (veduta del Cristallo e poi delle Tre Cime di Lavaredo) e concludersi alla Stazione di Dobbiaco.

Complessivamente l'intervento è durato 48 mesi, 13 dei quali sono occorsi per l'esecuzione dei lavori (ultimati il 27/7/2009). Intervento concluso con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 294 del 23/11/2011.

contributo regionale erogato: € 819.290,24
avanzamento della spesa: 100%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Arcugnano*

Titolo: Pista ciclabile-pedonale dal Lago di Fimon al Tormeno

IPA: Area Berica

Localizzazione: Arcugnano

Costo complessivo: iniziale 1.319.936

Fonte regionale: 730.000

Fonte comunale: 589.936

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: F11B07000340004

CONCLUSO

L'intervento riguarda un tratto della lunghezza di circa km. 2,8 che si snoda dall'area naturalistica del Lago di Fimon alle vicinanze del semaforo di Tormeno. Rappresenta un itinerario turistico di collegamento tra la rete del Comune di Vicenza (connessa con la pista ciclabile della Riviera Berica) ed il Lago di Fimon.

Intervento suddiviso in 3 stralci. I lavori del 1° stralcio si sono conclusi il 30/11/2009; quelli del 2° stralcio (prorogati con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 94 del 23/5/2012) si sono conclusi il 01/06/2012; quelli del 3° stralcio si sono conclusi il 01/12/2011. Il 22/05/2014 l'opera è stata infine collaudata. In corso d'opera è stato rivisto il costo complessivo dell'intervento, che è aumentato da € 980.000 ad € 1.285.000 ed in seguito ad € 1.319.936 (la maggiorazione dei costi è carico del Comune, con aumento della quota di cofinanziamento proprio). Con Decreto della Direzione Infrastrutture n. 94 del 13/05/2013 è stata fissata al 30/05/2014 la data di rendicontazione finale. Intervento concluso con Decreto della Sezione Infrastrutture n. 129 del 02/07/2014.

contributo regionale erogato: € 730.000
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *comune di Pedavena***Titolo:** Progetto di impianti sportivi e strutture ricettivo-turistiche in località Boschera**IPA:** Prealpi Bellunesi**Localizzazione:** Pedavena**Costo complessivo iniziale:** 2.400.000**Fonte regionale:** 900.000**Fonte comunale:** 1.500.000**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici - S. Sport**CUP:** J65G06000050006**CONCLUSO**

Il progetto prevede la creazione di un polo sportivo-turistico che interessi l'intero comprensorio feltrino: realizzazione di campo di calcio e rugby in manto erboso con spogliatoi, palestra per allenamenti invernali, campi di allenamento.


Complessivamente l'intervento è durato 60 mesi, 33 dei quali sono occorsi per l'esecuzione dei lavori.

La spesa totale sostenuta è leggermente inferiore a quella prevista inizialmente (determinando un'economia sul contributo regionale di € 2.532,96).

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 1474 del 22/11/2012.

contributo regionale erogato: € 897.467,04**avanzamento della spesa:** 99,7%

annualità 2008



*Dolomiti Venete
Sistema Polesine
Montagna Veronese
Ovest Vicentino
Bassa Padovana
Altopiano dei Sette Comuni
Terre Alte della Marca Trevigiana
Venezia Orientale*

*Pedemontana del Grappa e dell'Asolano
Medio Brenta
Alto Vicentino*

Anno 2008 - DGR n. 953 e DGR n. 4081

DGR n. 953 del 06/05/2008 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). Anno 2008”.

Risorse a disposizione: 15 milioni di euro.

Tipologie ammissibili: sviluppo turistico, promozione e diffusione di prodotti tipici locali, beni culturali, valorizzazione di risorse paesaggistiche, progetti integrati di riqualificazione urbana (percorsi o aree pedonali, accessibilità e sosta per i centri storici), ulteriori progetti integrati di area vasta (centri polifunzionali e altri impianti o infrastrutture).



Istruite 24 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 73 progetti.

DGR n. 4081 del 30/12/2008 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 953/2008”.

Individuati 19 interventi finanziabili.

Incrementata della somma messa a disposizione con la DGR 953/2008 di ulteriori 6.920.000,00 euro, derivanti da risorse inizialmente riservate alle attività di programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, per un totale di risorse finanziarie assegnate pari a 21.920.000,00 euro.

Altri 8 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 46.

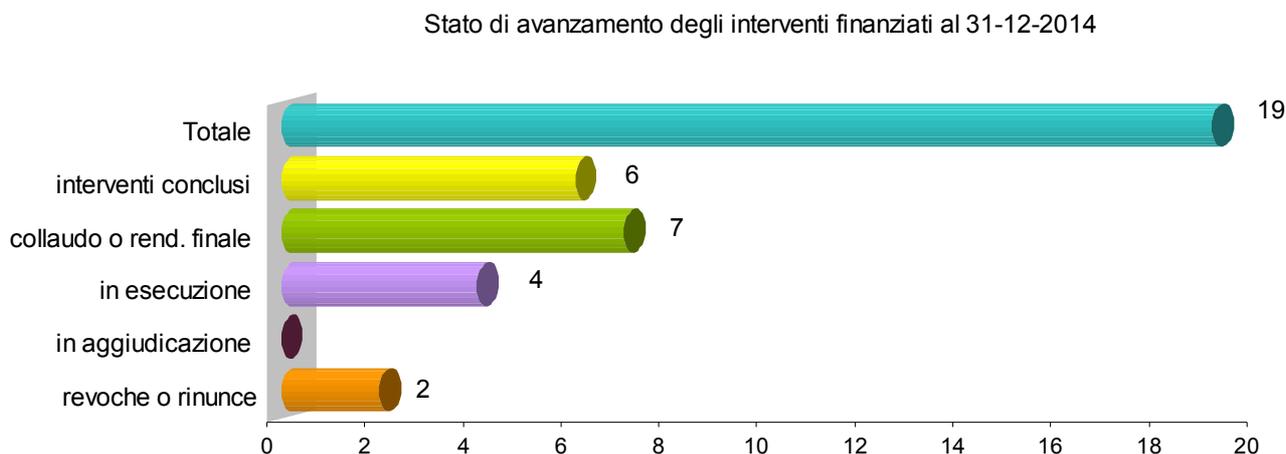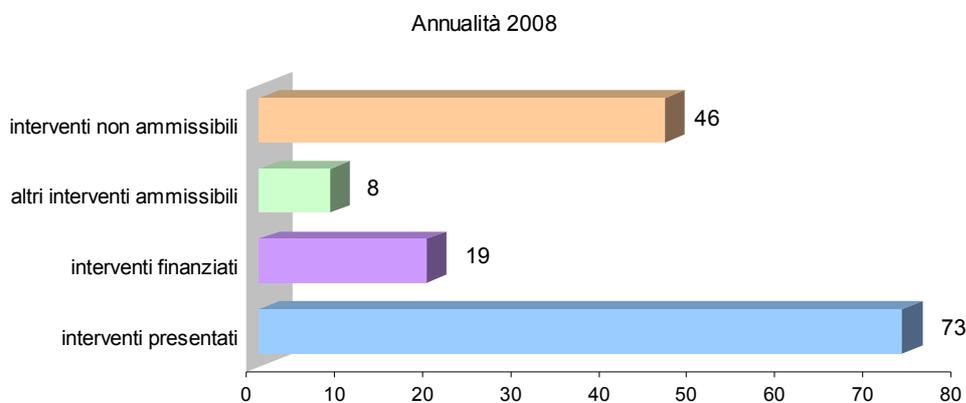

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Dolomiti Venete | Comune di Sappada | Opere di riqualificazione ambientale e valorizzazione antichi nuclei abitativi di Sappada | 2.750.000 | 1.483.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Sistema Polesine | Camera di Commercio di Rovigo | Adeguamento edile, impiantistico e restauro del "Salone del grano" e dei locali annessi per adibirli ad attività a supporto dell'economia locale | 4.628.240 | 1.483.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Montagna Veronese | Comune di Brentino Belluno | Recupero antica viabilità sul versante orientale del Monte Baldo | 668.000 | 540.000 | Concluso |
| Montagna Veronese | Comune di Brenzone | Recupero e valorizzazione storico-culturale, paesaggistica, turistica e ambientale di Brenzone - località Campo | 760.000 | 633.000 | In esecuzione |
| Ovest Vicentino | Comune di Gambellara | Recupero delle barchesse di Palazzo Cera: centro servizi per la promozione dell'attività vitivinicola e Strada del vino | 1.130.535 | 821.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Bassa Padovana | Comune di Piacenza d'Adige | Centro di Educazione Naturalistica e Ambientale per la valorizzazione paesaggistica nell'area della Golena dell'Adige denominata "Il Bosco" | 2.500.000 | 1.483.000 | CONTRIBUTO REVOCATO |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Lusiana | Completamento del centro servizi sportivi denominato Fontanella Bike Resort | 1.134.000 | 897.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Dolomiti Venete | Comune di Valle di Cadore | Nuovo centro coperto per il mercato comprensoriale dei prodotti tipici del territorio | 2.291.079 | 1.483.000 | CONTRIBUTO REVOCATO |
| Terre Alte della Marca Trevigiana | Comune di Sarnede | Palazzo mostra internazionale per l'infanzia | 1.721.875 | 1.446.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Venezia Orientale | Comune di Caorle | Realizzazione parcheggio ingresso Caorle | 1.500.000 | 1.261.000 | Concluso |
| Dolomiti Venete | U.M. Cadore Longaronese Zoldo | Progetto integrato di sviluppo locale - Percorso dei Sagrati Storico Religiosi - Comuni di Castellavazzo, Colle S. Lucia, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Soverzene, Taibon Agordino, Zoppè di Cadore | 1.726.200 | 1.451.000 | Concluso |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Comune di Fonte | Realizzazione itinerario turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" lungo il Muson e il Lastego | 1.320.000 | 1.110.000 | In esecuzione |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Rotzo | Elettrificazione dei comprensori turistici di Campolongo in Comune di Rotzo e di Monte Verena in Comune di Roana | 1.480.000 | 998.750 | In fase di rendicontazione finale |
| Medio Brenta | Provincia di Padova | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale - Lotto B | 1.833.557 | 1.269.000 | In fase di rendicontazione finale |
| Sistema Polesine | Comune di Trecenta | Recupero polifunzionale di un bene culturale, ex scuole elementari di Sariano, con destinazione ad uso turistico ricettivo - ostello per la gioventù | 1.665.000 | 1.215.250 | Concluso |
| Alto Vicentino | Comune di Schio | Recupero dell'edificio di archeologia industriale "Shed" per il potenziamento delle attività del Centro per il trasferimento tecnologico Demotech | 2.045.520 | 1.091.000 | Concluso |
| Alto Vicentino | Comune di Thiene | Restauro e rifunzionalizzazione del complesso denominato Villa Fabris - sede Centro Europeo per i Mestieri della Conservazione del Patrimonio Culturale | 1.758.480 | 1.335.000 | In esecuzione |
| Dolomiti Venete | Comune di Agordo | Realizzazione di un impianto comprensoriale di atletica leggera in località Polane del Comune di Agordo | 700.000 | 584.500 | Concluso |
| Terre Alte della Marca Trevigiana | Comune di Fregona | Interventi strutturali per la realizzazione del parco delle grotte del Caglieron | 1.600.000 | 1.335.500 | In fase di rendicontazione finale |
| totale | | | 33.212.486 | 21.920.000 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Sappada*

Titolo: Opere di riqualificazione ambientale e valorizzazione degli antichi nuclei abitativi di Sappada

Cod: VENR8AR8P034

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Sappada

Costo complessivo iniziale: 2.750.000

Fonte regionale: 1.483.000

Fonte comunale: 1.267.000

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: D47H10002110006

L'intervento tende alla valorizzazione delle potenzialità turistiche, commerciali e culturali, con recupero del tessuto urbano e restauro degli spazi pubblici, con particolare interesse alla vecchia strada di collegamento dei nuclei abitativi (materiali: pietra e legno) e alla riqualificazione degli elementi di degrado a ridosso degli stessi.

Aggiudicazione dei lavori in data 18/4/2011. Avvio in ritardo (settembre 2011), a causa dell'approvazione da parte della Soprintendenza ai beni ambientali delle campionature dei materiali per le pavimentazioni e lavorazioni principali. Con Decreto della Direzione LLPP n. 434 del 13/3/2013 rilasciato un nulla osta regionale alla perizia di variante suppletiva. Lavori ultimati il 30/08/2013. L'opera è stata collaudata il 20/11/2014. La rendicontazione finale è prevista entro il 20/05/2015 in seguito a proroga concessa con Decreto della Sezione LLPP n. 274 del 17/03/2014.

contributo regionale erogato: € 1.101.971,46

avanzamento della spesa: 87,6%

**Soggetto attuatore:** *Comune Piacenza d'Adige*

Titolo: Centro di Educazione Naturalistica e Ambientale per la valorizzazione paesaggistica nell'area della Golena dell'Adige denominata "il Bosco"

IPA: Bassa Padovana

Localizzazione: Piacenza d'Adige

Costo complessivo iniziale: 2.500.000

Fonte regionale: 1.483.000

Fonte comunale: 1.017.000

Stato attuazione: non realizzato (revoca contributo)

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: B26H08000160006

Progetto di recupero, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio lato ovest della Golena "Il Bosco" per realizzazione sala polivalente, area verde e parcheggio, area verde nel centro comunale per il tempo libero e lo sport, ristrutturazione di un edificio polifunzionale con funzione di centro cottura.

Nel dicembre 2010 sorge la necessità di modificare il progetto originario, a causa dell'indisponibilità delle aree ma, nonostante diverse proroghe, non sono stati avviati i lavori.

Con DGR n. 259 del 22 febbraio 2012 è stata disposta la revoca del contributo regionale.

REVOCATO

contributo regionale erogato: € 0

avanzamento della spesa: 0%



Soggetto attuatore: *Comune di Valle di Cadore*

Titolo: Nuovo centro coperto per il mercato comprensoriale dei prodotti tipici del territorio

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Valle di Cadore

Costo complessivo iniziale: 2.291.079

Fonte regionale: 1.483.000

Fonte comunale: 808.079

Stato attuazione: non realizzato (revoca contributo)

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G67J07000010005


Progetto di recupero di un'area in posizione centrale, con il riadattamento di un impianto sportivo ricreativo polivalente in degrado trasformato in ampio spazio attrezzato per un mercato coperto, parcheggio, percorsi pedonali e terrazze panoramiche.

Nel luglio 2011 il comune in difficoltà a reperire le risorse finanziarie per la copertura della quota di cofinanziamento dell'opera, dichiara la propria incapacità a dare esecuzione all'intervento e comunica l'intenzione di abbandonare il progetto originario.

Con DGR n. 1589 del 04 ottobre 2011 è stata disposta la revoca del contributo regionale.

REVOCATO

contributo regionale erogato: € 0
avanzamento della spesa: 0%

**Soggetto attuatore:** *Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo*

Titolo: Progetto integrato di sviluppo locale - Percorsi dei Sacrali Storico Religiosi - Comuni di Castellavazzo, Colle S. Lucia, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Soverzene, Taibon Agordino, Zoppè di Cadore

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Castellavazzo, Colle S.ta Lucia, Forno di Z., La Valle Agordina, (Soverzene,) Taibon Agordino, Zoppè di C.

Costo complessivo iniziale: 1.726.200

Fonte regionale: 1.450.354

Fonte comunale: 275.087

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: E48C08000090001

CONCLUSO

Intervento di recupero dei centri storici e urbani, rivolto alle aree pubbliche centrali, che coincidono con le principali chiese, aree deputate a molteplici funzioni essenziali per il mantenimento delle popolazioni sui territori montani e per lo sviluppo locale.

L'intervento ha subito modifiche per la parte di intervento del Comune di Soverzene, la relativa quota dei costi è stata assorbita dagli altri Comuni. Concesso da Direzione LLPP il frazionamento dell'intervento in 2 stralci, con due procedimenti distinti, per difficoltà logistiche determinate dalla dislocazione dei cantieri in area montana.

Aggiudicazione il 23/9/2011, avvio lavori il 31/10/2011; richiesta proroga il 21/12/2012 (causa ritrovamenti archeologici), concessa con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 433 del 13/03/2013. Lavori ultimati il 05/09/2013, effettuato collaudo in data 08/10/2013.

Intervento concluso con Decreto della Direzione LLPP n. 1564 del 13/11/2013.

contributo regionale erogato: € 1.294.849,55
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Fregona***Titolo:** Interventi strutturali per la realizzazione del parco delle grotte del Caglieron**Cod:** VENR8AR8P052**IPA:** Terre Alte della Marca Trevigiana**Localizzazione:** Fregona**Costo complessivo iniziale:** 1.600.000**Fonte regionale:** 1.335.500**Fonte comunale:** 264.500**Stato attuazione:** in fase di rendicontazione finale**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** C23E09000030002

L'intervento prevede la creazione di un parco pluritematico per la valorizzazione del territorio e la fruibilità turistica dello stesso, con sistemazione dell'accessibilità da Via Ronzon, realizzazione di passerelle e percorsi pedonali sul torrente Caglieron, sistemazione delle grotte n. 6-8, ricostruzione del Borgo dello Scalpellino e creazione di aree di sosta temporanee.

Lavori affidati in parte ai Servizi Forestali regionali (€ 90.000), il resto in carico al Comune. Avviati i lavori il 08/8/2011. In settembre 2012 concesso nulla osta regionale a perizia di variante e suppletiva, con utilizzo delle economie ottenute dal ribasso d'asta per la relativa esecuzione.

Concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori al 31/8/2013, poi differita al 31/01/2014 ed anche per la rendicontazione finale al 31/12/2013, poi differita con Decreto della Sezione LLPP n. 27 del 28/01/2014 al 31/12/2014.

contributo regionale erogato: € 1.062.261,13**avanzamento della spesa:** 99,9%**Soggetto attuatore:** *Comune di Caorle***Titolo:** Realizzazione parcheggio ingresso Caorle**IPA:** Venezia Orientale**Localizzazione:** Caorle**Costo complessivo iniziale:** 1.500.000**Fonte regionale:** 1.261.000**Fonte comunale:** 239.000**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D61B09000220009**CONCLUSO**

L'intervento consiste nella realizzazione di un parcheggio situato all'ingresso di Caorle su un'area attualmente privata e a destinazione agricola, limitrofa alle principali arterie di accesso alla città. Previsti oltre 1.000 posti auto a supporto di un'area con significative infrastrutture pubbliche.

L'intervento ha avuto in fase attuativa diverse criticità a causa di varianti progettuali proposte e poi ritirate dal Comune, che hanno determinato un notevole ritardo nella fase progettuale. Concesse più proroghe per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori.

Lavori aggiudicati il 27/03/2013, iniziati il 03/06/2013, ultimati il 23/11/2013. Collaudo avvenuto il 23/12/2013, come da Determina comunale n. 286. Rendicontazione finale avvenuta il 20/05/2014.

Intervento concluso con Decreto della Sezione LLPP n. 599 del 10/06/2014.

contributo regionale erogato: € 1.051.532,18**avanzamento della spesa:** 100%

Soggetto attuatore: *Comune di Fonte***Titolo:** Realizzazione itinerario turistico "Sui sentieri degli Ezze-
lini" lungo il Muson e il Lastego**Cod:** VENR8AR8P045**IPA:** Pedemontana del Grappa e dell'Asolano**Localizzazione:** Asolo, Crespano del Grappa, Fonte, Paderno
del Grappa**Costo complessivo iniziale:** 1.320.000**Fonte regionale:** 1.110.000**Fonte comunale:** 490.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Infrastrutture**CUP:** B79D09000130006

L'intervento prevede di realizzare una rete di percorsi ciclopeditoni (Km 21,26 circa) lungo i torrenti Muson e Lastego in grado di collegare, attraverso l'acqua, la laguna Veneta con il Monte Grappa tra borgate rurali e aziende agrituristiche, con realizzazione di infrastrutture e aree attrezzate.

Intervento in stato di criticità, in quanto la progettazione esecutiva, approvata in data 30/10/2013, ha subito forti ritardi a causa di difficoltà nel reperire i fondi per gli espropri, per varianti al progetto definitivo e per acquisizione primi accordi bonari.


Aggiudicazione definitiva dei lavori avvenuta il 16/12/2013, inizio dei lavori il 30/12/2013, prevista fine lavori il 03/04/2015 e rendicontazione finale entro il 30/09/2015.

contributo regionale erogato: € 302.925**avanzamento della spesa:** 28,6%**Soggetto attuatore:** *Comune di Rotzo***Titolo:** Elettificazione dei comprensori turistici di Campolongo
in Comune di Rotzo e di Monte Verena in Comune di Roana**Cod:** VENR8AR8P046**IPA:** Altopiano dei Sette Comuni**Localizzazione:** Roana, Rotzo**Costo complessivo iniziale:** 1.480.000 - finale 1.165.000**Fonte regionale:** iniziale 998.750 - finale 943.000**Fonte comunale:** iniziale 481.250 - finale 222.000**Stato attuazione:** in fase di rendicontazione finale**Struttura regionale responsabile:** Difesa del Suolo**CUP:** F35J08000010002

Il progetto prevede l'elettificazione delle strutture turistiche estive ed invernali di Rotzo (Campolongo) e di Roana (Monte Verena), con l'obiettivo di dotare le strutture interessate di un sistema di alimentazione caratterizzato da continuità, garantendo un miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Con DGR n. 4173/2009, a seguito di una ricognizione della spesa e alla riduzione del costo complessivo dell'intervento ad € 1.165.000, è stato ricalcolato il contributo regionale in € 943.000.

Sono state approvate due perizie suppletive e di variante che non hanno portato modifiche sostanziali al progetto originario. Avvio lavori il 28/6/2011, ultimazione il 07/9/2012. Concluso collaudo in data 09/09/2013, in fase di rendicontazione finale.

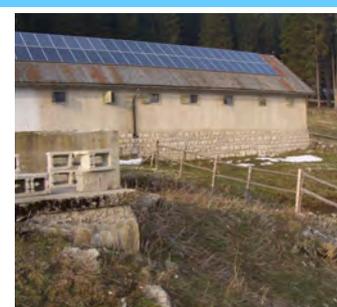
contributo regionale erogato: € 819.270**avanzamento della spesa:** 99%

Soggetto attuatore: *Comune di Brenzone***Titolo:** Recupero e valorizzazione storico-culturale, paesaggistica, turistica e ambientale di Brenzone - loc. Campo**Cod:** VENR8AR8P037**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Brenzone**Costo complessivo iniziale:** 760.000**Fonte regionale:** 633.000**Fonte comunale:** 127.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** F71B07000450006

L'intervento prevede il recupero a fini turistici e storico culturali della zona montana orientale del Comune di Brenzone, il restauro filologico delle strutture architettoniche rurali e la valorizzazione delle emergenze botaniche, storiche ed antropologiche.

Inizio lavori ritardato a seguito di integrazioni al progetto richieste dalla Soprintendenza di Verona. Lavori affidati al Servizio Forestale regionale tramite convenzione tra Comune e Regione. Avvio esecuzione il 01/10/2011, prevista fine il 30/04/2015; sono stati sospesi i lavori dal 20/07/2012 al 24/03/2013, causa esaurimento dei fondi a disposizione. E' stata approvata una perizia di variante con DGC n. 61 del 05/06/2013. Con DGR n. 971 del 05/06/2013 è stato prorogato il termine di rendicontazione finale al 30/06/2015.

contributo regionale erogato: € 481.713,70
avanzamento della spesa: 71,9 %

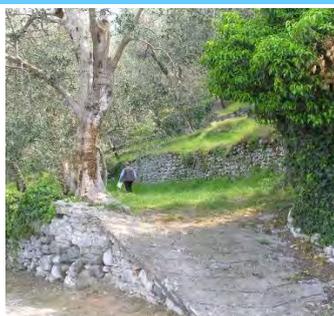**Soggetto attuatore:** *Comune di Brentino Belluno***Titolo:** Recupero antica viabilità sul versante orientale del Monte Baldo**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Brentino Belluno, Ferrara di Montebaldo**Costo complessivo iniziale:** 668.000**Fonte regionale:** 540.000**Fonte comunale:** 128.000**Stato attuazione:** concluso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** E62F08000040007


CONCLUSO

L'intervento prevede il recupero a fini turistici e storico culturali della zona montana orientale del Monte Baldo nel Comune di Brentino Belluno, raccordi con Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese e Avio (TN). Previsti inoltre il restauro delle strutture architettoniche della viabilità rurale, la valorizzazione per il cicloturismo, il torrentismo e la sentieristica.

Lavori assegnati al Servizio Forestale regionale per la sentieristica e al Comune per la cartellonistica. L'assegnazione al Servizio Forestale è avvenuta con convenzione tra Comune e Regione del 30/7/2009, mentre per la parte a carico del Comune l'aggiudicazione è del 25/9/2009. Ultimati i lavori per la sentieristica in data 31/12/2010, mentre per la cartellonistica i lavori sono iniziati il 01/10/2009 e finiti il 31/01/2011.

Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 580 del 09/04/2013. La spesa complessivamente sostenuta dal Comune ammonta a 668.064,67 euro, di cui spese in delega al Servizio Forestale di Verona per 362.950,65 euro.

contributo regionale erogato: € 540.000
avanzamento della spesa: 100%

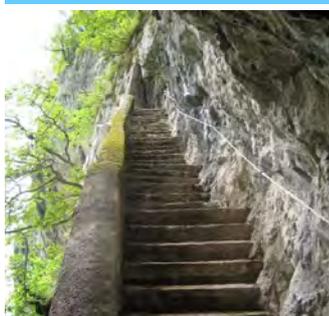

Soggetto attuatore: *Camera di Commercio di Rovigo*

Titolo: Adeguamento edile, impiantistico e restauro del "Salone del grano" e dei locali annessi per adibirli ad attività a supporto dell'economia locale

Cod: VENR8AR8P035

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Rovigo

Costo complessivo iniziale: 4.628.240

Fonte regionale: 1.483.000

Fonte comunale: 3.145.240

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: B16D07000340009

Si prevede un intervento di adeguamento edile e impiantistico, con restauro del locale "Salone del Grano" e dei locali adiacenti per adibirli ad attività congressuali (216 posti a sedere) e attività fieristiche. Nel complesso si tratta di una valorizzazione architettonica dell'intera struttura.

Eseguite 2 revisioni sulla progettazione esecutiva in fase di rilascio delle autorizzazioni; incrementata dell'8,5% circa la previsione del costo complessivo, ora pari ad € 5.020.000 (maggiorazione dei costi a carico del soggetto attuatore).

Lavori eseguiti dal 20/06/2011 al 02/12/2013. Sospensioni per bonifica copertura amianto dal 30/5/2012 al 24/7/2012 e per ritardato rilascio dei permessi di allaccio alla fognatura dal 15/10/2013 al 07/11/2013. Opera collaudata il 28/04/2014.

La Direzione Lavori Pubblici con Decreto n.1551 del 19/12/2012 ha prorogato il termine di rendicontazione finale al 30/6/2014; ha inoltre rilasciato un nulla osta all'utilizzo di economie ottenute dal ribasso d'asta per nuove opere, utili al perseguimento della funzionalità dell'intervento principale. Con successivo Decreto della Sezione LLPP n. 665 prorogato ulteriormente al 31/10/14 il termine di rendicontazione.

contributo regionale erogato: € 1.334.700

avanzamento della spesa: 100%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Sarmede*

Titolo: Palazzo mostra internazionale per l'infanzia

Cod: VENR8AR8P042

IPA: Terre Alte della Marca Trevigiana

Localizzazione: Sarmede

Costo complessivo iniziale: 1.721.875

Fonte regionale: 1.446.000

Fonte comunale: 275.875

Stato attuazione: rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: D59H09000190006


Il progetto consiste nel realizzare una nuova struttura per le attività della mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia, comprensiva di spazio espositivo, scuola internazionale d'illustrazione e archivio per raccogliere il materiale di 25 anni di rassegna. Riordino del centro storico con aspetti di risparmio energetico.

Avvio lavori il 28/6/2011, sospesi dal 20/10/2012 al 24/01/2013 a causa di una perizia di variante, ultimati in data 30/01/2013, collaudati in data 07/06/2013. Attualmente è in fase di rendicontazione finale, il cui termine ultimo è stato prorogato prima al 30/12/2014 con Decreto della Direzione LLPP n. 652 del 23/04/2013, poi al 30/06/2015 con Decreto LLPP n. 1253 del 18/12/2014.

Autorizzato dalla Direzione Lavori Pubblici l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta per la realizzazione di un'opera complementare (parcheggio per 20 posti auto) a servizio del centro culturale.

contributo regionale erogato: € 1.132.142,92

avanzamento della spesa: 91,6%

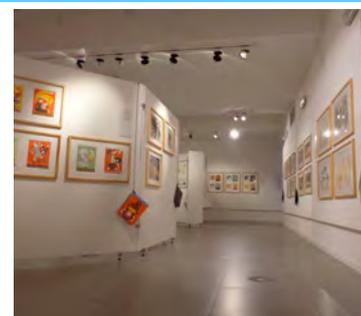

Soggetto attuatore: *Comune di Thiene*

Titolo: Restauro e rifunzionalizzazione del complesso denominato Villa Fabris - sede Centro Europeo per i Mestieri della Conservazione del Patrimonio Culturale

Cod: VENR8AR8P050

IPA: Alto Vicentino

Localizzazione: Thiene

Costo complessivo iniziale: 1.758.480

Fonte regionale: 1.335.000

Fonte comunale: 423.480

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Industria-Artigianato

CUP: E14B08000020002

Il progetto è uno stralcio funzionale a completamento della ristrutturazione di Villa Fabris, per dare seguito a un intervento di recupero già parzialmente effettuato sulle facciate esterne e sulle barchesse, con l'obiettivo della restituzione alla piena funzionalità del complesso.

La diversa tipologia delle lavorazioni ha determinato, previo accordo tra Comune e Direzione regionale Industria e Artigianato, l'esigenza di suddividere i lavori in due stralci: il primo per la parte edile e gli impianti, il secondo per le superfici decorate. Con Decreto della Direzione Industria e Artigianato viene concesso l'utilizzo della somma di € 384.484,00 (previsto inizialmente per il restauro di superfici decorate della villa) per eseguire altri lavori di completamento ritenuti urgenti (progetto definitivo approvato con DGC n. 118 del 09/10/2013 e progetto esecutivo approvato con Determina n. 830 del 27/10/2014). I lavori relativi alle opere edili ed impianti, già aggiudicati il 04/4/2011, sono in esecuzione dal 15/7/2011. I lavori principali di Villa Fabris sono stati collaudati in data 21/10/2013. Per i lavori di completamento si prevede la fine entro giugno 2015.

contributo regionale erogato: € 959.361,33

avanzamento della spesa: 82%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Trecenta*

Titolo: Recupero polifunzionale di un bene culturale (ex scuole elementari di Sariano) con destinazione ad uso collettivo e turistico ricettivo (ostello per la gioventù)

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Trecenta

Costo complessivo iniziale: 1.665.000

Fonte regionale: 1.215.250

Fonte comunale: 449.750

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G72F09000020006

CONCLUSO

L'intervento consiste nel recupero polifunzionale di un immobile con destinazione in parte a struttura ricettiva in ambito turistico (ostello per la gioventù) e in parte a centro polifunzionale a disposizione della popolazione dei Comuni che gravitano nell'area dell'Alto Polesine.

Lavori avviati il 26/9/2011, ultimati il 29/6/2012 e collaudati il 18/6/2013. La Direzione Lavori Pubblici ha rilasciato il nulla-osta ad una perizia di variante, autorizzando l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta per l'esecuzione delle relative opere complementari.

Intervento concluso con Decreto della Direzione LLPP n. 1097 del 26/07/2013.

contributo regionale erogato: € 1.215.250,00

avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Schio*

Titolo: Recupero dell'edificio di archeologia industriale "Shed" per il potenziamento delle attività del Centro per il trasferimento tecnologico Demotech

IPA: Alto Vicentino

Localizzazione: Schio

Costo complessivo: iniziale 2.045.520

Fonte regionale: 1.091.000

Fonte comunale: iniziale 954.520

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: F52I08000070004

CONCLUSO


L'intervento prevede il risanamento conservativo dell'edificio Shed, già interessato da lavori di restauro, ora oggetto di lavori di manutenzione degli spazi coperti, Shed e lucernari, strutture metalliche, rifacimento infissi, impianti elettrici e riscaldamento. E' compresa anche la sistemazione di un fabbricato adiacente da acquisire.

L'acquisto della palazzina adiacente ha determinato un aumento del costo complessivo dell'intervento (€ 2.435.520), la cui spesa è a carico del Comune. Operata una suddivisione dei lavori in due stralci: i lavori del 1° stralcio sono iniziati in maggio 2010 e ultimati ad ottobre 2010; i lavori del 2° stralcio sono iniziati in giugno 2011 e ultimati a luglio 2012. Collaudo eseguito in data 15/5/2013.

Intervento concluso con Decreto della Sezione LLPP n. 137 del 20/02/2014.

contributo regionale erogato: € 1.091.000

avanzamento della spesa: 100%

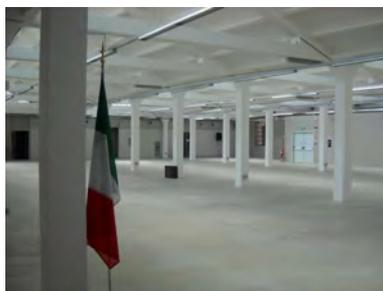**Soggetto attuatore:** *Comune di Lusiana*

Titolo: Completamento del centro servizi sportivi denominato Fontanella Bike Resort

Cod: VNR8AR8P040

IPA: Altopiano dei Sette Comuni

Localizzazione: Lusiana

Costo complessivo iniziale: 1.134.000

Fonte regionale: 897.000

Fonte comunale: 237.000

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: D49B09000160006

L'intervento prevede il completamento del centro servizi sportivi Fontanella Bike Resort per il supporto alle attività di sci di fondo, cicloturismo e trekking. Realizzazione, inoltre, di una struttura a magazzino-deposito, piccola officina, punto informativo e di spazi per parcheggio e sosta.

Ritardo iniziale dovuto a variazione progettuale inerente l'ubicazione dell'opera: rilasciato a tal fine parere positivo regionale su nuovo progetto esecutivo con diversa localizzazione intervento. Una perizia di variante per opere di completamento (consolidamento del pendio e realizzazione di deposito interrato per biciclette) è stata approvata dalla Direzione Lavori Pubblici, finanziata dal comune con l'utilizzo di economie.

Lavori sospesi per l'approvazione della perizia di variante e affidamento dei lavori dal 23/02/2012 al 22/08/2012; poi, per avverse condizioni climatiche dal 07/12/2012 al 08/01/2013, dal 14/01/2013 al 30/01/2013 e dal 12/02/2013 al 11/3/2013. Conclusione lavori in data 13/12/2013. Il collaudo è stato effettuato il 31/12/2014.

Con Decreto della Sezione LLPP n. 865 del 13/08/2014 è stata concessa proroga per la rendicontazione finale al 31/01/2015.

contributo regionale erogato: € 807.300

avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: *Comune di Gambellara*

Titolo: Recupero della barchessa di Palazzo Cera: centro servizi per la promozione dell'attività vitivinicola e Strada del vino

Cod: VENR8AR8P038

IPA: Ovest Vicentino

Localizzazione: Gambellara

Costo complessivo iniziale: 1.130.535

Fonte regionale: 821.000

Fonte comunale: 309.535

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Turismo


CUP: E22I09000080006

L'intervento consiste nel completamento del recupero delle Barchesse di Palazzo Cera, al fine di realizzare un centro servizi per la promozione dell'attività vitivinicola. Previsti nel fabbricato 1 i servizi di informazione e promozione turistica, nel fabbricato 2 i servizi di promozione dell'attività vitivinicola, nel fabbricato 3 la sala convegni.

Sopraggiunte difficoltà in fase di progettazione, dovute al parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, hanno determinato diverse dilazioni dei termini di aggiudicazione ed esecuzione lavori. Avvio dei lavori il 25/5/2011, ultimati il 28/01/2013. In data 02/4/2013 è stato rilasciato un nulla osta a variante e utilizzo economie. Collaudo avvenuto il 18/11/2013, conto finale dei lavori approvato l' 11/12/2013. Apertura al pubblico del centro servizi avvenuta il 1/04/2014. Trasmissione della rendicontazione finale alla Sezione Turismo avvenuta il 4/4/2014. La Sezione Turismo in data 04/12/2014 ha rideterminato il contributo da € 821.000 ad € 774.094,83. In via di predisposizione il Decreto di chiusura dell'intervento.

contributo regionale erogato: € 567.943,29

avanzamento della spesa: 94,2%

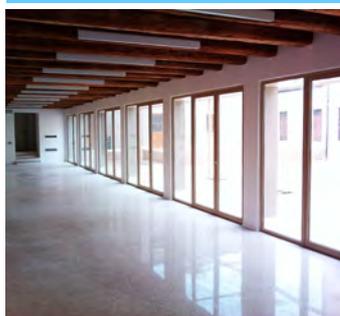**Soggetto attuatore:** *Comune di Agordo*

Titolo: Realizzazione di un impianto comprensoriale di atletica leggera in località Polane del Comune di Agordo

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Agordo

Costo complessivo iniziale: 700.000

Fonte regionale: 584.500

Fonte comunale: 115.500

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici - S. Sport

CUP: H79B10000020006

CONCLUSO

Le opere consistono nella realizzazione di un impianto comprensoriale di atletica leggera presso l'attuale campo di calcio comunale, con l'obiettivo di attrarre turismo anche di natura sportiva (ritiri estivi di società di calcio, hockey o altro), anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di livello nazionale e provinciale.


La progettazione è stata redatta dall'ufficio tecnico comunale. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta il 09/6/2011, i lavori si sono conclusi il 30/4/2012, con qualche mese di anticipo rispetto alle previsioni (seppure con sospensione nel mese di novembre 2011, a causa di una perizia suppletiva di variante).

Rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione il 05/04/2013.

Intervento concluso con Decreto della Direzione LLPP n. 1091 del 25/7/2013.

contributo regionale erogato: € 572.119,40

avanzamento della spesa: 100%

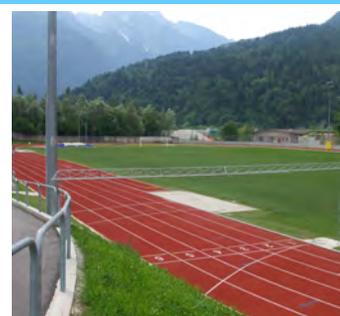

Soggetto attuatore: *Provincia di Padova***Titolo:** Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale - Lotto B**Cod:** VENR8AR8P047**IPA:** Medio Brenta**Localizzazione:** Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, Piazzola sul Brenta**Costo complessivo:** 1.883.557**Fonte regionale:** 1.269.000**Fonte comunale:** 564.557**Stato attuazione:** in fase di rendicontazione finale**Struttura regionale responsabile:** Infrastrutture**CUP:** G53D09000080003


Il progetto prevede il completamento del recupero e della valorizzazione dell'ex linea ferroviaria Treviso - Ostiglia per la parte insita nella parte sud-ovest del territorio padovano, con la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che consente di collegare una molteplicità di centri storico-culturali e beni paesaggistici, creando opportunità turistiche.

Procedura di aggiudicazione conclusa il 15/02/2012. In esecuzione dal 28/5/2012, i lavori hanno subito rallentamenti dovuti a sospensioni dei lavori per bonifica bellica dal 29/5/2012 al 03/7/2012, per fresatura e asfalto (sospensione parziale) dal 26/11/2012 al 03/5/2013, per condizioni meteo avverse dal 22/02/2013 al 26/3/2013, per variante spostamento linea Telecom (sospensione parziale) dal 10/7/2013 al 09/9/2013, per attesa approvazione variante dal 07/10/2013 al 07/01/2014. I lavori sono stati ultimati il 22/02/2014. L'opera è stata infine collaudata il 27/11/2014. Sono in fase di trasmissione gli atti per la rendicontazione finale.

In corso d'opera il costo complessivo dell'intervento è aumentato da € 1.833.557 ad € 2.200.000 (con maggiorazione a carico del soggetto attuatore).

contributo regionale erogato: € 1.142.100**avanzamento della spesa:** 93,9%

annualità 2009

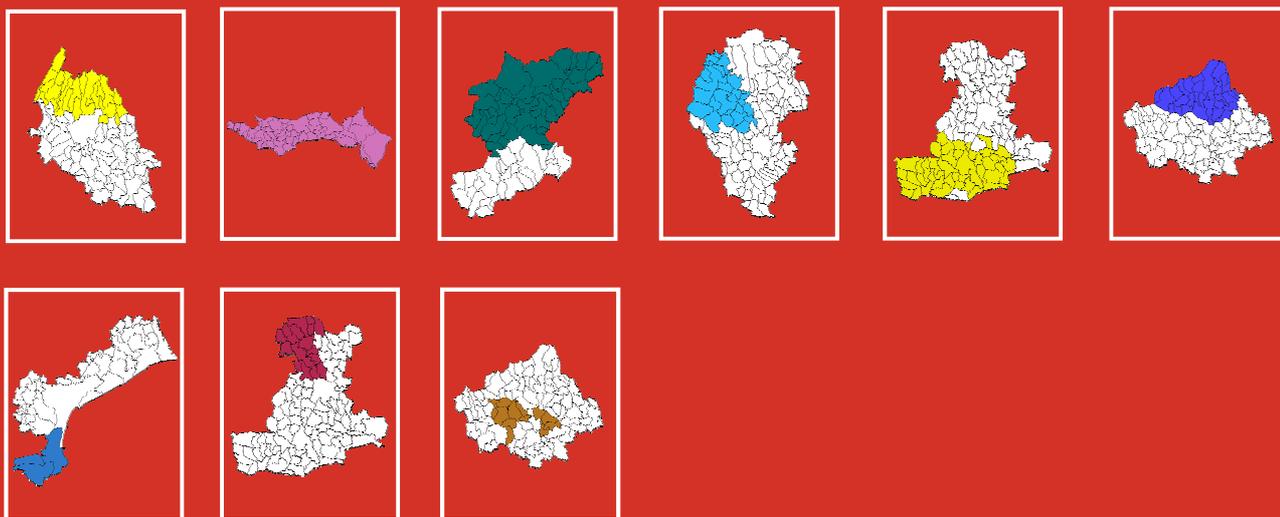

Montagna Veronese
Sistema Polesine
Dolomiti Venete
Alto Vicentino
Bassa Padovana
Terre Alte della Marca Trevigiana
Chioggia Cavarzere Cona
Medio Brenta
Montello Piave Sile

Anno 2009 - DGR n. 1598 e DGR n. 3955

DGR n. 1598 del 26/5/2009 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). Anno 2009”.

Risorse a disposizione: 15 milioni di euro.

Tipologie ammissibili: sviluppo turistico, promozione e diffusione di prodotti tipici locali, beni culturali, valorizzazione di risorse paesaggistiche, progetti integrati di riqualificazione urbana (percorsi o aree pedonali, accessibilità e sosta per i centri storici), ulteriori progetti integrati di area vasta (centri polifunzionali e altri impianti o infrastrutture). E' stata poi introdotta tra gli interventi ammissibili di contributo regionale una “*azione pilota*”, che prevede il finanziamento di iniziative private per l'avvio o l'ammodernamento di attività di affittacamere e bed & breakfast in Comuni la cui vocazione turistica non è ancora sufficientemente sviluppata.



Istruite 21 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 73 progetti.

DGR n. 3955 del 22/12/2009 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1598/2009”.

Individuati 17 interventi finanziabili, di cui 13 infrastrutture pubbliche (come da allegato A alla delibera) e 4 iniziative di “*azione pilota*” (come da allegato C alla delibera).

Incrementata la somma messa a disposizione con la DGR 1598/2009 di ulteriori 3 milioni di euro, derivanti da risorse inizialmente riservate alle attività di programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, per un totale di risorse finanziarie assegnate pari a 18.000.000,00 euro.

Altri 27 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 29.

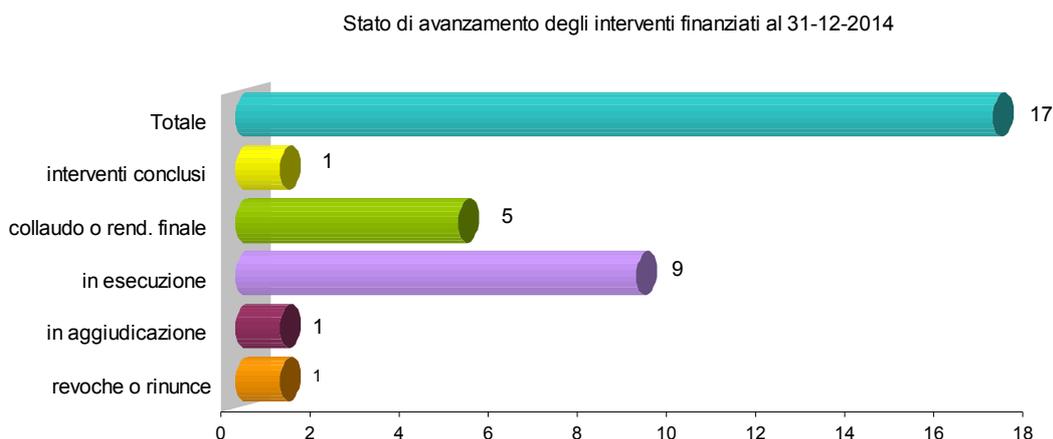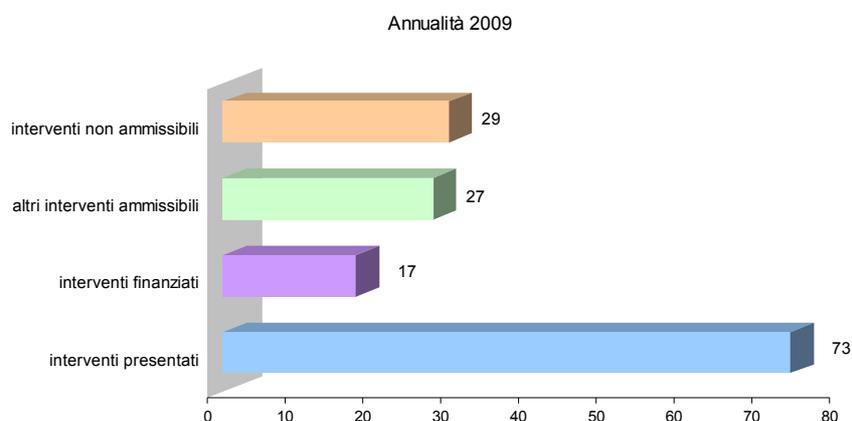

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Montagna Veronese | Unione Montana della Lessinia | Sistema della sentieristica della Lessinia: valorizzazione turistica area Valpolicella e Corno d'Aquilio | 1.793.989 | 1.236.950 | In fase di rendicontazione finale |
| Sistema Polesine | Comune di Porto Tolle | Valorizzazione dell'area Largo Europa e attracco fluviale ex tragheto | 1.500.000 | 1.122.900 | In fase di rendicontazione finale |
| Dolomiti Venete | Comune di Lozzo di Cadore | La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica. | 1.829.270 | 1.477.500 | In esecuzione |
| Dolomiti Venete | Comune di Colle Santa Lucia | Il Sito minerario del "Fursil": recupero a fini turistico culturali della galleria mineraria Breda e realizzazione del centro visita | 1.580.000 | 1.477.500 | In esecuzione |
| Montagna Veronese | Comune di Bosco Chiesanuova | Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio | 2.182.000 | 1.477.500 | CONTRIBUTO REVOCATO |
| Alto Vicentino | Comune di Tonezza d. Cimone | Completamento struttura copertura polivalente al fine della pratica del pattinaggio su ghiaccio | 720.000 | 638.300 | In fase di rendicontazione finale |
| Bassa Padovana | Comune di Monselice | Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico, integrazione impianti tecnologici e restauro affreschi di Villa Pisani | 1.301.700 | 833.400 | In fase di rendicontazione finale |
| Terre Alte della Marca trevigiana | Azienda Speciale Santa Lucia Fiere | Ristrutturazione e sistemazione dell'area ex filanda "Ancillotto" | 2.140.000 | 1.477.500 | In fase di rendicontazione finale |
| Chioggia Cavarzere Cona | Comune di Chioggia | Progetto di sistemazione e arredo di Corso del Popolo - La Piazza di Chioggia | 2.139.500 | 1.428.250 | In esecuzione |
| Sistema Polesine | Comune di Ariano nel Polesine | Valorizzazione di Santa Maria in Punta e delle sue golen nel Comune di Ariano Polesine | 600.000 | 504.000 | concluso |
| Medio Brenta | Comune di Fontaniva | Sistemazione Villa Borromeo per museo agricolo - II° stralcio | 1.960.000 | 1.477.500 | In esecuzione |
| Sistema Polesine | Comune di Loreo | Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro "Zago" | 1.300.000 | 1.083.500 | In corso di aggiudicazione lavori |
| Montello Piave Sile | Comune di Istrana | Restauro di Villa Lattes per la nuova sede del museo della Collezione Lattes: automi, carrillons, dipinti | 1.750.000 | 1.465.200 | In esecuzione |
| subtotale | | | 20.769.459 | 15.700.000 | |

Altri interventi - Azioni pilota

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Alto Vicentino | Comune di Valli del Pasubio | "Soggiornare nelle antiche valli dei conti e dei signori" | 0 | 575.000 | In esecuzione |
| Sistema Polesine | Comune di Taglio di Po | "La ricchezza del fiume , il calore dell'accoglienza" | 0 | 575.000 | In esecuzione |
| Prealpi Bellunesi | Comune di Feltre | "Feltre. Camere con vista" | 0 | 575.000 | In esecuzione |
| Montagna Veronese | Comune di Fumane | "AP per la riqualificazione degli elementi urbani del centro storico di Molina" | 0 | 575.000 | In esecuzione |
| subtotale | | | 0 | 2.300.000 | |
| Totale | | | 20.769.459 | 18.000.000 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Lozzo di Cadore*

Titolo: La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico, culturale, naturalistica

Cod: VENR9AR9P055

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Auronzo, Calalzo, Domegge di C., Lorenzago, Lozzo di C., Perarolo di C., Pieve di C., Valle di C., Vigo di C.

Costo complessivo iniziale: 1.829.270

Fonte regionale: 1.477.500

Fonte comunale: 351.770

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Difesa del Suolo

CUP: J33E09000050002

Il progetto intende creare un percorso unitario a bassa quota da Auronzo a Valle di Cadore lungo sentieri, mulattiere e strade già esistenti. Sistemazione di percorsi e loro messa in sicurezza, posizionamento della segnaletica, apertura di punti panoramici, zone parcheggio e luoghi per la sosta temporanea lungo l'itinerario.


Con la progettazione definitiva/esecutiva sono state individuate tre distinte categorie di lavori da appaltare: 1) lavori relativi al percorso (categoria prevalente), 2) lavori relativi ai fabbricati, 3) lavori per la cartellonistica e segnaletica in legno.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato il 20/6/2012. Affidati in delega ai Servizi Forestali di Belluno parte dei lavori (per € 970.000) previsti nel progetto; per i rimanenti lavori è stato stipulato il contratto il 01/9/2012.

Lavori iniziati il 12/11/2012, si prevede siano ultimati entro il 20/12/2015. Si sono rese necessarie sospensioni dei lavori per condizioni climatiche avverse, dal 07/12/2012 al 07/3/2013 e dal 28/11/2014 fino presumibilmente al 07/03/2015.

contributo regionale erogato: € 721.832,70

avanzamento della spesa: 38,6%

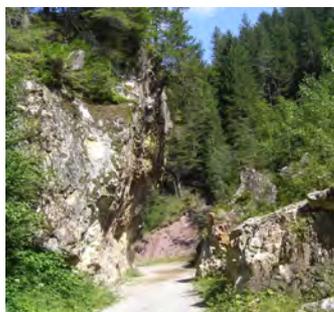**Soggetto attuatore:** *Comune Colle Santa Lucia*

Titolo: Il sito minerario del "Fursil": recupero a fini turistico culturali della galleria mineraria Breda e realizzazione del centro visita

Cod: VENR9AR9P056

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Colle Santa Lucia

Costo complessivo iniziale: 1.580.000

Fonte regionale: 1.477.500

Fonte comunale: 102.500

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G29H09000030003

Le opere consistono: nel recupero di un tratto di m. 300 di galleria con ripristino del percorso esterno a binari rotabili fino alla partenza del trenino elettrico; nel consolidamento e recupero del tratto di galleria per raggiungere l'antica camera di coltivazione, dove allestire un cantiere didattico di scavo; infine, nella costruzione di parte dell'edificio per centro visite e nella realizzazione di opere di collegamento.

L'intervento è incorso in ritardi dovuti al fenomeno di "sfondellamento", che ha interrotto le necessarie operazioni di verifica geo-meccanica della galleria. Lavori in corso di esecuzione da maggio 2012, prevista ultimazione entro il 31/7/2014 (non avvenuta). Il comune (in data 28/05/2014) ha chiesto alla Sezione LLPP una proroga per l'ultimazione dei lavori entro il 30/11/2015.

contributo regionale erogato: € 543.433,76

avanzamento della spesa: 35,3%



Soggetto attuatore: *Comune di Bosco Chiesanuova***Titolo:** Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Bosco Chiesanuova**Costo complessivo iniziale:** 2.182.000**Fonte regionale:** 1.477.500**Fonte comunale:** 704.500**Stato attuazione:** non realizzato (revoca contributo)**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** H49J09000020006

L'intervento prevede la realizzazione di strutture a supporto dell'attività turistica estiva ed invernale: area attrezzata coperta per ciclisti ed escursionisti, campo da pallavolo, bocce, giochi per bambini, aree parcheggio anche attrezzate per camper; piantumazione delle aree oggetto di intervento e dotazione di segnaletica per la sentieristica.

L'intervento ha avuto un forte ritardo nella fase progettuale, dovuto alla indisponibilità di risorse del Comune a copertura della quota a proprio carico per la realizzazione dell'opera. A fronte di ciò, decorsi i termini di proroga preventivamente concessi al Comune, il contributo è stato revocato con DGR n. 2387 del 16/12/2013.

REVOCATO**contributo regionale erogato:** € 0
avanzamento della spesa: 0%**Soggetto attuatore:** *Unione Montana della Lessinia***Titolo:** Sistema della sentieristica della Lessinia: valorizzazione turistica area Valpolicella e Corno d'Aquilio**Cod:** VNR9AR9P053**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Dolcè, Erbezzo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo**Costo complessivo iniziale:** 1.793.989**Fonte regionale:** 1.236.950**Fonte comunale:** 557.039**Stato attuazione:** in fase di rendicontazione finale**Struttura regionale responsabile:** Difesa del Suolo**CUP:** B39G09000070002

Le opere prevedono: ripristino dei percorsi pedonali esistenti, posa di bacheche illustrative, manutenzione strade bianche, segnaletica per automobilisti, ciclisti e podisti, punti di sosta panoramici, infrastrutture per sosta e info-point, noli biciclette e accoglienza visitatori, restauro di un capitello e di una fontana.

I lavori sono stati divisi in 4 lotti (A-B-C-D). I lavori relativi al lotto A sono conclusi; i lavori dei Lotti B-C-D sono in corso di esecuzione. Autorizzato riutilizzo di economie per € 154.898,38. Lavori ultimati il 13/6/2013. Opera collaudata il 13/01/2014 e resa funzionale il 2/06/2014. Prevista la rendicontazione finale entro il 30/06/2015.

contributo regionale erogato: € 1.018.513
avanzamento della spesa: 100%

Soggetto attuatore: *Comune di Porto Tolle*

Titolo: Valorizzazione dell'area Largo Europa e attracco fluviale ex traghetto

Cod: VENR9AR9P054

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Porto Tolle

Costo complessivo iniziale: 1.500.000

Fonte regionale: 1.122.900

Fonte comunale: 377.100

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Mobilità

CUP: I88C09000010006

L'intervento riguarda la sistemazione della darsena esistente lungo il fiume Po, lo scavo del bacino, la protezione delle sponde per la realizzazione di attracchi per 14 posti barca; inoltre la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra l'attracco e il fabbricato esistente, da adibire a museo.

Aggiudicazione definitiva in giugno 2012, stipulato contratto il 20/7/2012. Lavori iniziati il 03/10/2012, conclusi il 31/07/2014. Sottoscritto disciplinare per l'attuazione dell'intervento in data 19/02/2013. Sospensioni lavori dal 11/3/2013 al 17/4/2013 e dal 06/5/2013 al 11/6/2013, rispettivamente per rinvenimento geologico e per la piena del fiume Po. Collaudo avvenuto il 9/12/2014. Rendicontazione finale prorogata dalla Sezione Mobilità al 22/12/2014, in fase di verifica.

contributo regionale erogato: € 815.147,36
avanzamento della spesa: 98,9%



Soggetto attuatore: *Comune di Ariano nel Polesine*

Titolo: Valorizzazione di Santa Maria in Punta e delle sue gole nel Comune di Ariano Polesine

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Ariano nel Polesine

Costo complessivo iniziale: 600.000

Fonte regionale: 504.000

Fonte comunale: 96.000

Stato attuazione: concluso

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: J72D08000030006

CONCLUSO

L'intervento prevede la creazione di un percorso turistico di km 4 per la valorizzazione ambientale ed architettonica del luogo, tra preesistenze di edifici e un meraviglioso panorama naturalistico. Restauro di un monumento, di una scala, creazione di area di sosta, di un parcheggio e realizzazione di un percorso naturalistico.

Aggiudicazione avvenuta in gennaio 2012. Lavori iniziati ad aprile 2012 e ultimati il 29/10/2012. Il collaudo si è concluso il 26/11/2012. Il costo complessivo è aumentato da 600.000 a 618.000 (maggiorazione a carico del Comune). Intervento concluso con Decreto della Direzione Lavori Pubblici n. 542 del 04/4/2013.

contributo regionale erogato: € 504.000
avanzamento della spesa: 100%



Soggetto attuatore: Azienda Speciale S. Lucia Fiere**Titolo:** Ristrutturazione e sistemazione dell'area ex filanda Ancillotto"**Cod:** VENR9AR9P060**IPA:** Terre Alte della Marca Trevigiana**Localizzazione:** Santa Lucia di Piave**Costo complessivo iniziale:** 2.140.000**Fonte regionale:** 1.477.500**Fonte comunale:** 662.500**Stato attuazione:** in fase di rendicontazione finale**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** D28J09000040001

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'area storica ad ovest e la creazione di una zona di collegamento tra i 2 blocchi per ottimizzare la funzione espositiva e fieristica. Inoltre si prevede la creazione di una piazza con pavimentazione in calcestruzzo architettonico aperta al tessuto urbano come ritrovo e riferimento per l'uso quotidiano del complesso ed il consolidamento della vecchia ciminiera.

Con DGR n. 653 del 17/5/2011 riassegnato il contributo regionale all'A.S. Santa Lucia Fiere in luogo del Comune di S. Lucia di Piave. Disciplinare sottoscritto a febbraio 2012. Con DGR n. 754 del 02/5/2012 concessa proroga al 15/9/2012 per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori.

La progettazione esecutiva delle opere originarie si è conclusa il 23/7/2012 (contratto firmato il 18/02/2013). Il progetto esecutivo delle opere complementari è stato approvato il 5/8/2013 (contratto firmato il 7/11/2013). I lavori sono rimasti sospesi dal 12/12/2013 al 23/12/2013. Tutti i lavori sono stati ultimati in data 08/09/2014. Le opere complementari sono state collaudate il 08/09/2014, quelle originarie il 24/12/2014. E' prevista la rendicontazione finale entro il 30/06/2015.

contributo regionale erogato: € 1.329.750**avanzamento della spesa:** 79,2%**Soggetto attuatore:** Comune di Fontaniva**Titolo:** Sistemazione Villa Borromeo per museo agricolo - 2° stralcio**Cod:** VENR9AR9P063**IPA:** Medio Brenta**Localizzazione:** Fontaniva**Costo complessivo iniziale:** 1.960.000**Fonte regionale:** 1.477.500**Fonte comunale:** 482.500**Stato attuazione:** in esecuzione**Struttura regionale responsabile:** Beni Culturali**CUP:** C59G09000030006

Intervento necessario per destinare il museo ad allestimenti permanenti e temporanei con dotazione di struttura ricettiva consistente in uno stralcio comprendente il consolidamento della loggia ottocentesca, la realizzazione di nuovi impianti (elettrico e idrotermosanitario), i restauri interni (infissi e pavimenti) ed esterni (marmorini e stucchi), il giardino e nuovi posti auto. Con ulteriori lavori il museo viene dotato di funzioni di ricevimento e convegni (200 posti) destinando anche il piano interrato a percorso museale.

Il ritardo inizialmente accumulato nell'esecuzione dell'intervento è dovuto all'attesa del completamento del 1° stralcio.

Aggiudicazione conclusa il 30/7/2012 con un appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori a carico della ditta aggiudicataria).

Il progetto esecutivo è stato approvato il 19/05/2014 dopo alcuni slittamenti sui tempi previsti, dovuti alla necessità di definire l'impiantistica in funzione della effettiva destinazione museale degli ambienti. I lavori sono iniziati il 22/05/2014 e si prevede siano ultimati entro il 22/10/2015.

contributo regionale erogato: € 0**avanzamento della spesa:** 6,3%

Soggetto attuatore: *Comune di Istrana***Titolo:** Restauro di Villa Lattes per la nuova sede del museo della Collezione Lattes: automi, carrillons, dipinti**Cod:** VENR9AR9P065**IPA:** Montello Piave Sile**Localizzazione:** Istrana**Costo complessivo iniziale:** 1.750.000**Fonte regionale:** 1.465.200**Fonte comunale:** 284.800**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Beni Culturali**CUP:** D74B10000010006

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sede museale per ospitare collezione di automi, giocattoli meccanici, carrillons (lascito della famiglia Lattes), assieme a opere, dipinti, sculture, reperti lapidei, mobili, tappeti, arazzi, orologi e porcellane.

Aggiudicazione definitiva dei lavori con determina comunale del 20/6/2012. Lavori avviati il 10/7/2012. Termine di ultimazione prorogato al 31/12/2015 con Decreto della Sezione Beni Culturali. Perizia di variante in corso d'opera approvata con Decreto della Sezione Beni Culturali n. 50 del 05/06/2014.

contributo regionale erogato: € 537.687,37
avanzamento della spesa: 36,7%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Loreo***Titolo:** Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago**Cod:** VENR9AR9P064**IPA:** Sistema Polesine**Localizzazione:** Loreo**Costo complessivo iniziale:** 1.300.000**Fonte regionale:** 1.083.500**Fonte comunale:** 216.500**Stato attuazione:** aggiudicazione in corso**Struttura regionale responsabile:** Lavori Pubblici**CUP:** B83E09000800004

Previsto un intervento di restauro con la realizzazione di una sala polivalente (conferenze, convegni, riunioni), con mostra permanente dedicata al "Taglio di Loreo - Porto Viro" (1604), attività ricettive e culturali di Loreo e del territorio delizioso.

L'intervento ha accumulato un forte ritardo in fase progettuale. Concesse proroghe per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori, prima con DGR n. 187 del 07/02/2012 (proroga al 30/6/2012), poi con DGR n. 1695 del 07/8/2012 (proroga al 30/4/2013), a seguito di richiesta del Comune motivata dalla necessità di una pronuncia sull'interesse culturale dell'immobile da parte dei competenti organi ministeriali e poi della Soprintendenza, una volta acquisita la proprietà pubblica. Procedura di aggiudicazione avviata con determina comunale n. 207 del 30/4/2013. L'aggiudicazione provvisoria è stata fatta il 21/11/2014 (la definitiva è prevista il 22/01/2015). La fase esecutiva dei lavori è prevista dal 02/04/2015 al 02/04/2016. La chiusura dell'intervento è stata posticipata con Decreto della Sezione LLPP n. 1227 del 09/12/2014 al 22/06/2016.

contributo regionale erogato: € 264.219,50
avanzamento della spesa: 26%



Soggetto attuatore: *Comune di Monselice*

Titolo: Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico, integrazione impianti tecnologici e restauro affreschi di Villa Pisani

Cod: VENR9AR9P059

IPA: Bassa Padovana

Localizzazione: Monselice

Costo complessivo iniziale: 1.301.700

Fonte regionale: 833.400

Fonte comunale: 468.300

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Beni Culturali

CUP: B44B09000020004

L'intervento è mirato al recupero architettonico e artistico dell'edificio e al restauro di bellissimi affreschi parietali al fine della destinazione a museo permanente per mostre itineranti, nonché sede di rappresentanza per il Comune di Monselice nella quale svolgere convegni, conferenze, incontri culturali.

La Direzione Beni Culturali ha concesso una proroga per l'aggiudicazione dei lavori entro il 30/6/2012. Aggiudicazione provvisoria con Determina comunale del 27/6/2012. Consegna provvisoria dei lavori per preparazione allestimento del cantiere e prove per affreschi avvenuta in data 18/9/2012; consegna definitiva il 15/10/2012 (il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 04/10/2012). Sospensione dei lavori dal 26/7/2013 al 30/9/2013. Lavori ultimati il 11/07/2014. Opere collaudate il 23/12/2014. Con Decreto n. 75 del 27/6/2013 è stato autorizzato l'utilizzo delle somme in amministrazione diretta per finanziare una perizia suppletiva dovuta a rinvenimenti avvenuti in corso d'opera e per adeguare l'impostazione progettuale a salvaguardia del bene, secondo le prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza. Il quadro economico complessivo rimane invariato a fronte del ribasso d'asta e dell'utilizzo di parte delle somme destinate a imprevisti e opere complementari. Intervento ora in fase di rendicontazione finale.

contributo regionale erogato: € 750.060

avanzamento della spesa: 95%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Chioggia*

Titolo: Progetto di sistemazione e arredo Corso del Popolo - La Piazza di Chioggia

Cod: VENR9AR9P061

IPA: Chioggia, Cavarzere, Cona

Localizzazione: Chioggia

Costo complessivo iniziale: 2.139.500

Fonte regionale: 1.428.250

Fonte comunale: 711.250

Stato attuazione: in esecuzione

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: I94H09000020006

L'intervento consiste nel recupero del senso di unità spaziale del Corso del Popolo, dapprima limitando e poi eliminando il traffico motorizzato. Il progetto comprende interventi sulla superficie del selciato (5 - 7% del tracciato), sull'impianto di illuminazione del portico (ora variegato e di scarso impatto visivo), sul plateatico e l'arredo urbano con un sistema modulare ed aggregativo.

A seguito di prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici si è dovuto provvedere ad una revisione del progetto esecutivo. Con DGR n. 187 del 07/02/2012 concessa proroga per avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori al 30/6/2012. Con Determina comunale del 25/6/2012 approvato nuovo progetto esecutivo e avviata procedura di aggiudicazione. Concluso procedimento con Determina comunale di aggiudicazione definitiva del 15/11/2012. Accolta anche una richiesta del Comune di modifica del cronoprogramma con riferimento alle date di inizio e fine lavori. Avvio dei lavori il 20/01/2014, prevista ultimazione entro il 30/09/2015 (autorizzata con Decreto Sezione LLPP n. 1180/2014).

contributo regionale erogato: € 581.737,10

avanzamento della spesa: 41%



Soggetto attuatore: *Comune di Tonezza del Cimone*

Titolo: Completamento della struttura copertura polivalente al fine della pratica del pattinaggio su ghiaccio

Cod: VENR9AR9P058

IPA: Alto Vicentino

Localizzazione: Tonezza del Cimone

Costo complessivo iniziale: 720.000

Fonte regionale: 638.300

Fonte comunale: 81.700

Stato attuazione: in fase di rendicontazione finale

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: C25G08000510006

Il progetto prevede il completamento della copertura estesa su circa mq 740, che consentirà di ottenere complessivamente mq 2.140, idonei alla realizzazione di una pista di ghiaccio di tipo mobile con caratteristiche turistiche e sportive (velocità, pista da ballo e curling).

Ritardo iniziale causa modifiche alla progettazione esecutiva. Lavori aggiudicati a settembre 2012. Avviata esecuzione in data 16/10/2012. I lavori sono stati sospesi dal 05/12/2012 al 22/4/2013 e dal 27/11/2013 al 06/01/2014, per condizioni meteo avverse. Il 24/12/2013 il Comune ha chiesto autorizzazione di variante per miglioramenti funzionali e tecnologici che non incidono sulle finalità del progetto originario (adeguamento fondazioni, adeguamento del parapetto, nuovo impianto telefonico, integrazione linea vita e sistemazioni esterne) per una spesa aggiuntiva pari ad € 24.214,19 finanziata con economie derivanti da ribasso d'asta. Lavori ultimati il 30/05/2014 con ulteriore tempo fino al 03/07/2014 per completare lavori di modesta entità non influenti sulla funzionalità. Collaudo avvenuto il 05/12/2014. Chiusura intervento prevista il 31/03/2015.

contributo regionale erogato: € 485.971,50

avanzamento della spesa: 78,7%



Soggetto attuatore: *Comune di Fumane***Azione Pilota:** Riqualficazione degli elementi urbani del centro storico di Molina**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Fumane**Fonte regionale:** 575.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Turismo

Nel 2009 al Comune di **Fumane** è stato affidato un Fondo di dotazione di € 500.000 per finanziare *iniziative private per l'avvio/ammodernamento di attività di affittacamere e bed & breakfast* - **Azione A.**

Inoltre è stata assegnata un'ulteriore somma di € 75.000 per realizzare interventi infrastrutturali connessi o funzionali all'azione sulla ricettività - **Azione B.**

Al Comune è stata liquidata una quota di contributo regionale pari a 394.953,89 euro, corrispondente al 68,7% del totale del contributo assegnato.

La Direzione regionale Turismo ha prorogato al 21/12/2014 il termine per la rendicontazione finale delle spese; una nuova richiesta di proroga è in corso di istruttoria.

Soggetto attuatore: *Comune di Valli del Pasubio***Azione Pilota:** Soggiornare nelle antiche valli dei conti e dei signori**IPA:** Alto Vicentino**Localizzazione:** Valli del Pasubio**Fonte regionale:** 575.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Turismo

Nel 2009 al Comune di **Valli del Pasubio** è stato affidato un Fondo di dotazione di € 500.000 per finanziare *iniziative private per l'avvio/ammodernamento di attività di affittacamere e bed & breakfast* - **Azione A.**

Inoltre è stata assegnata un'ulteriore somma di € 75.000 per realizzare interventi infrastrutturali connessi o funzionali all'azione sulla ricettività — **Azione B.**

Al Comune è stata liquidata una quota di contributo regionale pari a 175.000,00 euro, corrispondente al 30,4% del totale del contributo assegnato.

La Direzione regionale Turismo ha prorogato al 31/8/2014 il termine per la rendicontazione finale delle spese; una nuova richiesta di proroga è in corso di istruttoria.

Soggetto attuatore: *Comune di Taglio di Po***Azione Pilota:** La ricchezza del fiume, il calore dell'accoglienza**IPA:** Sistema Polesine**Localizzazione:** Taglio di Po**Fonte regionale:** 575.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Turismo

Nel 2009 al Comune di **Taglio di Po** è stato affidato un Fondo di dotazione di € 500.000 per finanziare *iniziative private per l'avvio/ammodernamento di attività di affittacamere e bed & breakfast* - **Azione A.**

Inoltre è stata assegnata un'ulteriore somma di € 75.000 per realizzare interventi infrastrutturali connessi o funzionali all'azione sulla ricettività - **Azione B.**

Al Comune è stata liquidata una quota di contributo regionale pari a 319.594,19 euro, corrispondente al 55,6% del totale del contributo assegnato.

La Direzione regionale Turismo ha prorogato al 30/6/2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese.

Soggetto attuatore: *Comune di Feltre***Azione Pilota:** Feltre. Camere con vista**IPA:** Prealpi Bellunesi**Localizzazione:** Feltre**Fonte regionale:** 575.000**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Turismo


Nel 2009 al Comune di **Feltre** è stato affidato un Fondo di dotazione di € 500.000 per finanziare *iniziative private per l'avvio/ammodernamento di attività di affittacamere e bed & breakfast*. - **Azione A.**

Inoltre è stata assegnata un'ulteriore somma di € 75.000 per realizzare interventi infrastrutturali connessi o funzionali all'azione sulla ricettività - **Azione B.**

Al Comune è stata liquidata una quota di contributo regionale pari a 323.276,26 euro, corrispondente al 56,2% del totale del contributo assegnato.

La Direzione regionale Turismo ha prorogato al 30/9/2014 il termine per la rendicontazione finale delle spese; una nuova richiesta di proroga è in corso di istruttoria.

annualità 2010

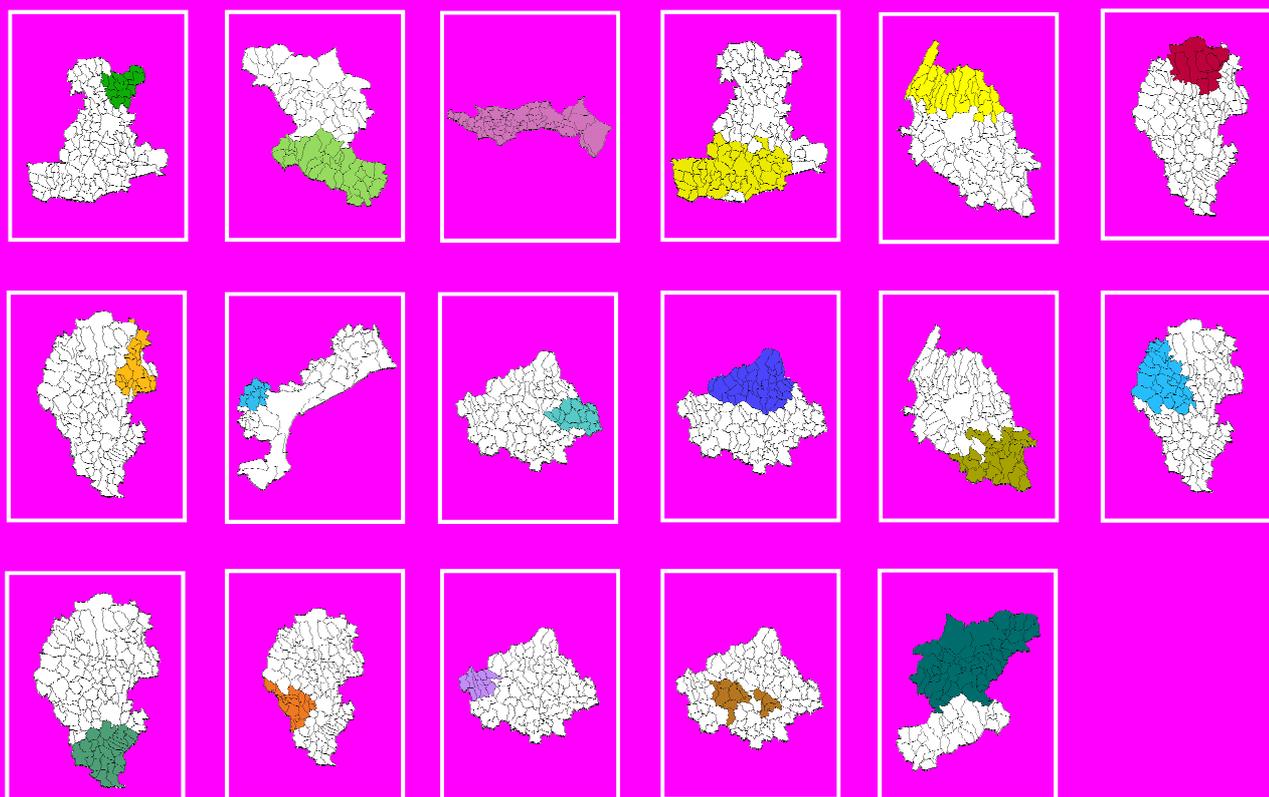

*Camposampierese
Prealpi Bellunesi
Sistema Polesine
Bassa Padovana
Montagna Veronese
Altopiano dei Sette Comuni
Pedemontana del Brenta
Miranese
Opitergino Mottense*

*Terre Alte della Marca Trevigiana
Basso Veronese e Colognese
Alto Vicentino
Area Berica
Ovest Vicentino
Pedemontana del Grappa e dell'Asolano
Montello Piave Sile
Dolomiti Venete*

Anno 2010 - DGR n. 1779 e DGR n. 3535

DGR n. 1779 del 06/07/2010 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). Anno 2010”.

Risorse a disposizione: 11.474.715,76 euro.



Tipologie ammissibili: opere finalizzate alla valorizzazione turistico-sportivo-ricreativa del territorio, con l'obiettivo di favorire la fruizione di ambienti e contesti di pregio naturalistico e storico-culturale.

Istruite 19 domande di finanziamento, comprendenti complessivamente 38 progetti.

DGR n. 3535 del 30/12/2010 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1779/2010”.

Individuati 18 interventi finanziabili, con assegnazione di risorse per complessivi € 1-1.292.450,00.

Altri 6 interventi ritenuti ammissibili, ma non finanziati; non ammissibili i rimanenti 14.

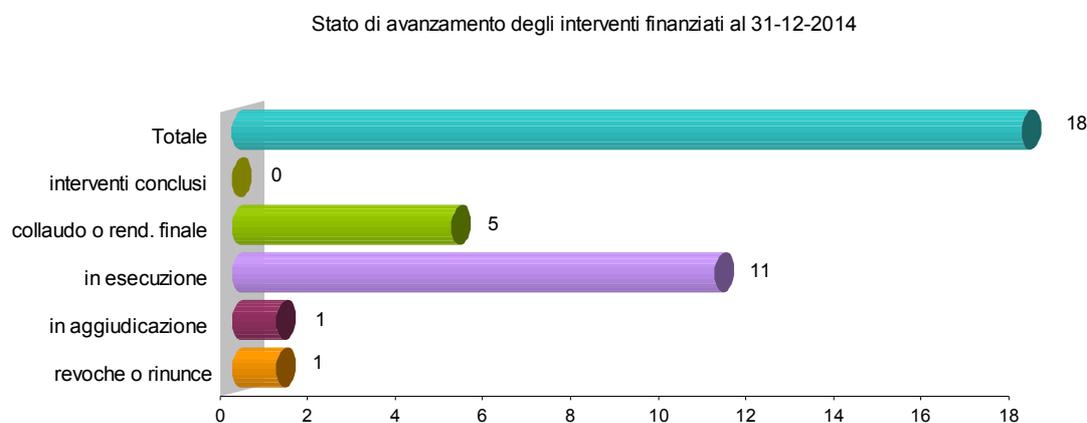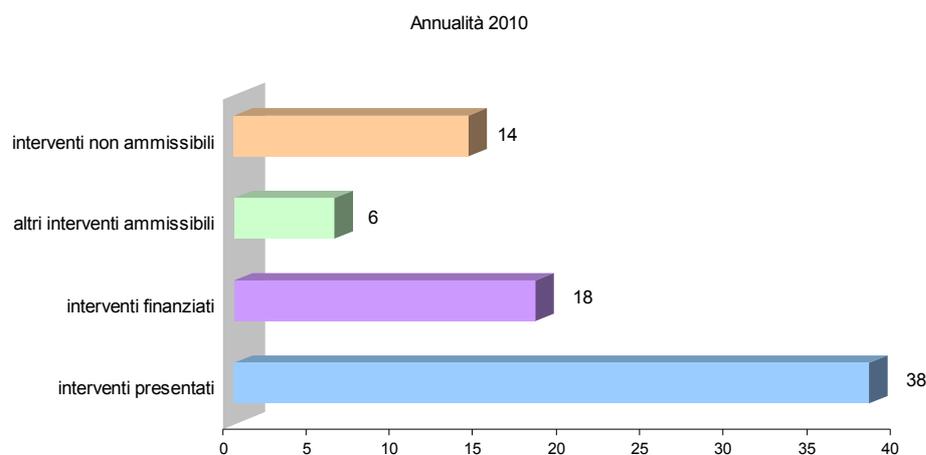

| area | beneficiario | opera finanziata | costo totale | contributo regione | avanzamento al 31-12-2014 |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Campo-sampierese | Federazione dei Comuni del Camposampierese | La via delle risorgive tra ambiente e cultura | 1.425.000 | 750.000 | In esecuzione |
| Prealpi Bellunesi | Unione Montana dell'Alpago | Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce | 880.000 | 748.000 | In esecuzione |
| Sistema Polesine | Comune di Casteljuglielmo | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovracomunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale, lungo l'asta fluviale Tartaro-Canalbionco | 1.361.000 | 750.000 | In esecuzione |
| Bassa Padovana | Comune di Pernumia | Percorso itinerante storico ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige - Vie di terra e di acqua | 1.500.000 | 750.000 | In esecuzione |
| Montagna veronese | Unione Montana Baldo-Garda | B.A.L.D.O. in rete Biodiversità - Alpeggi - Lago - Didattica e sport - Ospitalità | 882.353 | 750.000 | In esecuzione |
| Altopiano dei Sette Comuni | Comune di Valstagna | Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume - Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta | 960.300 | 750.000 | In esecuzione |
| Pedemontana del Brenta | Comune di Bassano del Grappa | AQuAS 1 - Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo Sostenibile dell'area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica | 950.000 | 689.000 | In fase di collaudo |
| Miranese | Comune di Scorzè | Itinerario lungo l'argine del fiume Dese | 525.000 | 446.250 | In fase di collaudo |
| Opitergino Mottense | Comune di Gorgo al Monticano | "Gira Monticano" - Itinerario naturalistico del fiume Monticano | 882.000 | 749.000 | In fase di collaudo |
| Sistema Polesine | Comune di Arquà Polesine | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovracomunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale, lungo l'ex alveo della Fossa Filistina collegando il Castello di Rovigo con il Castello di Arquà Polesine | 2.248.800 | 750.000 | RINUNCIA AL CONTRIBUTO |
| Terre Alte della Marca Trevigiana | Unione Montana delle Prealpi Trevigiane | Progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" | 999.000 | 750.000 | In fase di collaudo |
| Basso Veronese e Colognese | Comune di Legnago | Il sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villabartolomea | 335.000 | 250.000 | In esecuzione |
| Alto Vicentino | Comune di Valli del Pasubio | Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina | 1.000.000 | 750.000 | In esecuzione |
| Area Berica | Comune di Alonte | Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale - 1° stralcio | 1.122.000 | 750.000 | In esecuzione |
| Ovest Vicentino | Unione Montana Agno-Chiampo | Anello ecoturistico "Agno-Chiampo" nei Comuni di Chiampo, Nogarele Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Cornedo Vicentino, Brogliano e Trissino | 450.000 | 382.500 | In esecuzione |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Comune di Paderno del Grappa | Riqualificazione ambientale Val Secca con percorso vita | 310.000 | 263.500 | In esecuzione |
| Montello Piave Sile | Comune di Giavera del Montello | Parco attrezzato Santi Angeli | 310.000 | 263.500 | In fase di collaudo |
| Dolomiti Venete | Comune di Canale d'Agordo | Percorso religioso e turistico-naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la "Via dei Papi" | 883.000 | 750.000 | In aggiudicazione |
| totale | | | 17.023.453 | 11.292.450 | |

Soggetto attuatore: *Comune di Arquà Polesine*

Titolo: Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricettiva sovracomunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'ex alveo della Fossa Filistina collegando il Castello di Rovigo con il Castello di Arquà Polesine

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Arquà Polesine, Rovigo

Costo complessivo iniziale: 2.248.800

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 1.498.800

Stato attuazione: annullato per rinuncia del beneficiario

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: B86G11000310006

Con il progetto si intende integrare il circuito di percorsi e itinerari turistici presenti nel territorio comunale di Rovigo allargandolo al limitrofo Comune di Arquà Polesine, attraverso il collegamento dei due castelli medioevali. E' prevista la realizzazione di aree di sosta in prossimità dei borghi attraversati dal percorso da cui si potrà accedere alle architetture storiche (castelli, chiese, monastero, piazze, ecc). Si prospetta di creare 5 chioschi di ristoro lungo il tratto (con incremento dell'artigianato locale e dei prodotti tipici polesani), punto informativo, attività di servizio pubblicità, agriturismo.

Il Comune in data 12/12/2012 ha comunicato la rinuncia alla realizzazione dell'opera e al contributo regionale. Con DGR n. 89 del 29/01/2013 la Regione ha preso atto della rinuncia.

RINUNCIA

contributo regionale erogato: € 0
avanzamento della spesa: 0

**Soggetto attuatore:** *Comune di Pernumia*

Titolo: Percorso itinerante storico - ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige - Vie di terra e di acqua

Cod: VENR13P095

IPA: Bassa Padovana

Localizzazione: Pernumia

Costo complessivo iniziale: 1.500.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 750.000

Stato attuazione: in esecuzione

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: I11I12000040002

Realizzazione di un percorso itinerante storico-ambientale che interessa il territorio dei comuni di Pernumia, San Pietro Viminario, Tribano, Bagnoli di Sopra, Pozzonovo e Anguillara Veneta (lunghezza complessiva km 42). Sono previsti due stralci. Verranno realizzate: segnaletica generale dell'itinerario e relativa ai singoli siti valorizzati; opere di sistemazione argini; sistemazione di sentieri esistenti, punti di sosta attrezzati con panchine e tavoli, passerelle in legno; totem pubblicitari di informazione.

Il termine del 30/09/2013 previsto per l'avvio della procedura di aggiudicazione non è stato rispettato a causa delle difficoltà sorte in fase di progetto definitivo, approvato in linea tecnica soltanto nell'ottobre del 2013 (in attesa del previsto parere del Genio Civile di Padova). Chiesta dal Comune ulteriore proroga di sei mesi per l'avvio della fase di aggiudicazione, con parere favorevole della Direzione Turismo. Progetto esecutivo approvato il 06/05/2014. Aggiudicazione definitiva il 07/08/2014. Avvio dei lavori il 09/10/2014; l'ultimazione è prevista entro il 30/06/2015.

contributo regionale erogato: € 0
avanzamento della spesa: 0%



Soggetto attuatore: *Federazione dei Comuni del Camposampierese*

Titolo: La via delle risorgive tra ambiente e cultura

Cod: VNR13P092

IPA: Camposampierese

Localizzazione: Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte

Costo complessivo iniziale: 1.425.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 675.000

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: D63E11000110006

Realizzazione di percorsi e itinerari lungo il fiume Draganziolo e il fiume Tergola e di porte di accesso alle aree di risorgiva del fiume Sile, del fiume Muson Vecchio e della palude di Onara, mettendo in connessione due aree umide a valenza naturalistica nella fascia delle risorgive. L'intervento comprende: 1) Villa del Conte (spazi, percorsi attrezzati e arredo, cartellonistica e piazzole di sosta presso palude Onara); 2) Piombino Dese (percorso pedonale di m 300 in centro storico, opere a verde e opere idrauliche su peschiere, valorizzazione manufatto storico Villa Cornaro); 3) Trebaseleghe (cartellonistica su percorso pedonale di km 9, piazzole di soste-scambio attrezzate, attracchi nel percorso fluviale lungo fiume Draganziolo).

Intervento inizialmente attribuito al Comune di Trebaseleghe. Accolta richiesta di sostituzione del soggetto attuatore e, con DGR n. 653 del 17/05/2011, disposta la riassegnazione del contributo regionale alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, nuovo soggetto attuatore. Aggiudicazione dei lavori l'11/02/2013. Contratto stipulato il 27/02/2013. Previsione di fine lavori per il 30/3/2015. Perizia di variante del valore di € 142.664 (con copertura nella somma stanziata) approvata il 03/06/2014.

contributo regionale erogato: € 218.481,78
avanzamento della spesa: 77,2%



Soggetto attuatore: *Comune di Castelguglielmo*

Titolo: Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricreativa sovracomunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'asta fluviale Tartaro-Canalbianco
Cod: VNR13P094

IPA: Sistema Polesine

Localizzazione: Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Pincara

Costo complessivo iniziale: 1.361.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 611.000

Stato attuazione: esecuzione lavori


Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: I71B11000300002

Il progetto va ad integrare e completare tratti di percorsi ed itinerari turistici a forte valenza ambientale e storico-culturale già realizzati, lungo l'asta fluviale Fissero Tartaro Canalbianco. Verranno realizzate aree di sosta attrezzate in ambiti suggestivi lungo il canale e dal percorso si potrà accedere ad architetture storiche di ville venete (Villa Nani Mocenigo) e testimonianze di corti rurali. Si prospetta di creare 4 chioschi di ristoro lungo il tratto a favore dell'incremento dell'artigianato locale e dei prodotti tipici polesani.

Sottoscritto il 12/01/2012 il disciplinare per l'attuazione dell'intervento. Concessa proroga al 30/9/2013 per l'avvio della procedura di aggiudicazione. Il 27/9/2013 avviata la procedura di aggiudicazione, con pubblicazione di bando il 18/12/2013. L'aggiudicazione provvisoria del 09/05/2014 è stata annullata a seguito di sentenza su ricorso della seconda classificata, a favore della quale è poi avvenuta l'aggiudicazione il 12/11/2014. Inizio lavori il 26/05/2014, ultimazione prevista entro giugno 2015.

contributo regionale erogato: € 142.005,57
avanzamento della spesa: 19,9%



Soggetto attuatore: *Comune di Alonte*

Titolo: Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale, 1° stralcio

Cod: VENR13P105

IPA: Area Berica

Localizzazione: Alonte

Costo complessivo iniziale: 1.122.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 372.000

Stato attuazione: in esecuzione

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: H73E10000030006

Si prevede il recupero di antichi percorsi ai fini di una loro valorizzazione in ambito naturalistico-ambientale. Primo stralcio funzionale di un progetto più generale di realizzazione di un percorso ciclopedonale, che collega le due direttrici ciclabili nord-sud che corrono ad est e ad ovest dei Colli Berici.

La progettazione definitiva/esecutiva si è conclusa il 31/7/2012. Su richiesta del Comune, concessa proroga al 30/9/2013 per l'avvio della procedura di aggiudicazione.

Il 27/09/2013 il Comune avvia la procedura di affidamento, iniziata con la pubblicazione del bando nella stessa data e conclusa con la firma del contratto il 23/12/2013.

Lavori iniziati il 19/05/2014, prevista ultimazione il 30/6/2015 e rendicontazione intervento entro il 30/9/2015.

contributo regionale erogato: € 0

avanzamento della spesa: 35,2%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Valli di Pasubio*

Titolo: Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro terme, Valli del Pasubio e Posina

Cod: VENR13P104

IPA: Alto Vicentino

Localizzazione: Posina, Recoaro Terme, Valli del Pasubio

Costo complessivo iniziale: 1.000.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 250.000

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Difesa del Suolo

CUP: B93E10000100006

L'intervento prevede la riqualificazione dell'area attraverso la pulizia di sentieri e mulattiere esistenti, taglio di alberi, costruzione di muretti, pulizia di trincee e manufatti storici, 3 punti informativi a servizio del turista, aree di sosta per pedoni-auto-camper. Sostanzialmente si interviene su 40 km di percorsi e si realizzano 50 posti auto. L'opera sviluppa la vocazione del territorio offrendo aree e percorsi adatti all'attività turistico-ricreativa per un vasto pubblico durante tutto l'arco dell'anno. L'allestimento di alcuni punti provvisti di arredo urbano e tabelle informative garantisce la percezione di un insieme organico degli interventi.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta comunale il 29/8/2013. Il 16/9/2013 aggiudicati i lavori del 1° dei sei stralci in cui è stata suddivisa l'opera. Lavori in fase di esecuzione, ultimazione prevista entro dicembre 2015.

contributo regionale erogato: € 93.460,30

avanzamento della spesa: 20,8%



Soggetto attuatore: *Unione Montana Prealpi Trevigiane*

Titolo: Progetto per la valorizzazione turistico - sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave"

Cod: VENR13P102

IPA: Terre Alte della Marca Trevigiana

Localizzazione: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor

Costo complessivo iniziale: 999.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 249.000

Stato attuazione: in fase di collaudo

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: I72D10000390006

Il progetto prevede interventi di piccola infrastrutturazione quali: parcheggio-belvedere, sistemazione percorso ciclo-pedonale panoramico "delle vedette", completamento del maglio Bottarel, sistemazione del santuario Madonna del Carmine, risistemazione del punto di accesso est Palù, belvedere nel parco villa Brandolini, realizzazione di passerelle nella valle della Riù e recupero di un fabbricato rustico, realizzazione di un parcheggio e di punti di sosta a Fontane, riqualificazione della Piazza Tempio a Pianezze, sistemazione area esterna panoramica dell'ossario a Castello.

Prodotta variante sul progetto definitivo che prevede, oltre a variazioni di natura tecnica sulle opere da realizzare, anche lo scorporo dall'appalto principale di alcuni lavori di carattere specialistico, per i quali la C.M. intende procedere con affidamento diretto. La progettazione esecutiva si è conclusa il 28/9/2012.

Il 19/7/2013 sottoscritto disciplinare per l'attuazione dell'opera. Avviata la procedura di aggiudicazione con pubblicazione del bando in data 22/5/2013 e firma del contratto il 30/9/2013. Lavori avviati il 16/9/2013, giunti a conclusione il 01/06/2014. Intervento ora in fase di collaudo.

contributo regionale erogato: € 570.501,41

avanzamento della spesa: 66,5%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Canale d'Agordo*

Titolo: Percorso religioso e turistico-naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la "Via dei papi"

Cod: VENR13P109

IPA: Dolomiti Venete

Localizzazione: Agordo, Calalzo di C., Canale d'A., Cencenighe Agordino, Domegge di C., La Valle Agordina, Longarone, Lorenzago di C., Lozzo di C., Ospitale di C., Perarolo di C., Pieve di C., Rivamonte Agordino, Taibon Agordino Vallada Agordina, Valle di C., Vigo di C..

Costo complessivo iniziale: 883.000

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 133.000

Stato attuazione: in fase di aggiudicazione

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: G28J10000230002

Il progetto consiste in interventi di adeguamento della sentieristica (suddivisi in varie tipologie) e di realizzazione sia di aree di accesso al percorso che di piazzole di sosta attrezzate. Collegamento di numerose singolarità religiose, naturalistiche, paesaggistiche e turistiche, in genere localizzate lungo il percorso o a breve distanza. La lunghezza complessiva dell'itinerario è di 117 km, di cui 11 km sono interessati dall'intervento.

Il 25/9/2013 approvato con Delibera GC il progetto definitivo/esecutivo e avviata la procedura di affidamento dei lavori. Il Comune di La Valle Agordina ha comunicato la rinuncia alla realizzazione dei lavori nel territorio di propria competenza. Il comune di Castellavazzo, a seguito di fusione, è stato accorpato a Longarone. Con Decreto n. 100 del 16/12/2013, la Direzione Turismo conferma il contributo regionale, previo adeguamento progettuale. E' prevista la pubblicazione del bando per il 18/3/2015 e l'aggiudicazione definitiva entro aprile 2015. Si prevede di seguito l'esecuzione dei lavori da aprile a novembre 2015.

contributo regionale erogato: € 0

avanzamento della spesa: 2%



Soggetto attuatore: *Comune di Valstagna*

Titolo: Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume - Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta

Cod: VNR13P097

IPA: Altopiano dei Sette Comuni

Localizzazione: Valstagna

Costo complessivo iniziale: 960.300

Fonte regionale: 750.000

Fonte comunale: 210.300

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: C18J10000030006

Il progetto riguarda la valorizzazione degli itinerari esistenti sul territorio comunale di Valstagna mediante interventi puntuali di riqualificazione turistico-ambientale di alcuni nodi chiave, al fine di favorire lo sviluppo integrato del sistema di offerta turistica locale. Sono previsti interventi su 4 geositi: 1) grotte di Oliero, sistemazione parcheggio e ristrutturazione punto ristoro e informazioni all'ingresso del parco; 2) Valstagna, riqualificazione edificio storico e valorizzazione Calieron; 3) sorgente Subiolo, valorizzazione area di accesso, riqualificazione turistico-ambientale di Ponte Subiolo; 4) Cala' del Sasso, sistemazione turistico-ambientale delle aree, infrastrutturazione leggera per favorire intermodalità turistica e residenziale.

Sottoscritto in data 27/6/2013 il disciplinare. La Direzione Turismo ha acconsentito alla suddivisione dell'esecuzione dei lavori in base alle tipologie degli stessi (opere di natura edile e non edile). Procedure di affidamento lavori avviate in data 18/02/2013 e 20/02/2013: ci sono due diverse gare a trattativa privata, due distinti affidamenti relativi ad opere di natura edile (391.380,50 €) e stradale (323.619,50 €). Aggiudicazione conclusa il 27/5/2013 per le opere edili e il 19/11/2013 per le opere stradali. Varianti in corso d'opera autorizzate dalla Sezione Turismo in data 20/12/2013 e 04/07/2014.

Avvio dei lavori in data 19/7/2013, prevista conclusione entro il 31/3/2015.

contributo regionale erogato: € 204.474,37

avanzamento della spesa: 34,8%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Bassano del Grappa*

Titolo: AQUAS 1- Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo sostenibile dell'area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica

Cod: VNR13P098

IPA: Pedemontana del Brenta

Localizzazione: Bassano del Grappa, Marostica

Costo complessivo iniziale: 950.000

Fonte regionale: 689.000

Fonte comunale: 261.000

Stato attuazione: in fase di collaudo

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: I73E10000040006

L'intervento (primo stralcio) prevede la riqualificazione di 4 percorsi naturalistici di particolare suggestione (50Km) e di aree di sosta attrezzate, tabellazione, segnaletica, nonché dell'aula didattica Gemma a S. Michele di Bassano (111mq) che, partendo dal fiume Brenta, attraversano le colline tra Bassano del Grappa e Marostica. Il progetto intende rispondere a diverse esigenze: valorizzazione e fruibilità di un ambito naturalistico di pregio finora poco utilizzato; messa in rete e potenziamento di siti ambientalisti e culturali posti lungo il percorso; incremento dell'attività didattica dedicata ai luoghi; allargamento dell'offerta turistico-ambientale esistente.

In data 18/7/2011 sottoscritto il disciplinare. Conclusa la fase di aggiudicazione il 14/6/2013 e stipulato il contratto il 16/9/2013. Lavori avviati il 30/06/2014 e conclusi il 12/01/2015. Sono intervenute sospensioni in vari periodi, per avverse condizioni meteo e attesa di rilascio autorizzazione Consorzio di Bonifica.

Prevista chiusura intervento entro settembre 2015.

contributo regionale erogato: € 0

avanzamento della spesa: 43%



Soggetto attuatore: Unione Montana del Baldo-Garda**Titolo:** B.A.L.D.O. in rete. Biodiversità - Alpeggi - Lago - Didattica e sport - Ospitalità**Cod:** VENR13P096**IPA:** Montagna Veronese**Localizzazione:** Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Malcesine, San Zeno di Montagna**Costo complessivo iniziale:** 882.353**Fonte regionale:** 750.000**Fonte comunale:** 132.353**Stato attuazione:** esecuzione lavori**Struttura regionale responsabile:** Difesa del Suolo**CUP:** I29B10000190007

Il territorio interessato dal progetto comprende la zona degli alpeggi del Monte Baldo, nella quale è prevista la valorizzazione del sistema delle malghe e degli edifici connessi (baite, casare, porcilaie, etc). Si tratta di recuperare tali manufatti destinandoli a scopi turistici-ricreativi e sportivi, al fine di mantenerli come memoria storica. Oltre al recupero è prevista la realizzazione di percorsi accessibili anche ai diversamente abili.

Progetto esecutivo approvato il 06/8/2012. Aggiudicazione definitiva il 23/10/2012. Sottoscritto disciplinare per l'attuazione dell'opera il 13/12/2012. L'importo complessivo del progetto ammonta ad € 930.000 (con differenza a carico del soggetto attuatore). Lavori iniziati in data 07/12/2012. Concesse proroghe dalla Sezione Difesa del Suolo per la fine dei lavori (entro il 31/05/2015) e la rendicontazione finale (entro il 31/10/2015).


contributo regionale erogato: € 675.000
avanzamento della spesa: 88,2%

**Soggetto attuatore: Comune di Gorgo al Monticano****Titolo:** Gira Monticano - Itinerario naturalistico del fiume Monticano**Cod:** VENR13P100**IPA:** Opitergino Mottense**Localizzazione:** Fontanelle, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Oderzo.**Costo complessivo iniziale:** 882.000**Fonte regionale:** 749.700**Fonte comunale:** 132.300**Stato attuazione:** in fase di collaudo**Struttura regionale responsabile:** Infrastrutture**CUP:** J59B10000060006

L'intervento riguarda l'itinerario ciclo-pedonale che attraversa un corridoio naturalistico costeggiante in gran parte il fiume Monticano. Il percorso si snoda sugli argini e sulle strade vicinali del fiume al fine di scoprire il territorio più ameno circostante il fiume. I comuni interessati dall'itinerario naturalistico sono: Fontanelle, Oderzo, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza (lunghezza complessiva 40 km circa). Saranno realizzate opere di primaria necessità quali segnaletica, sistemazione di strada campestre e di argini, nonché ulteriori opere quali piantumazione alberi, aree di sosta in golena e passerelle.

Intervento inizialmente attribuito al Comune di Fontanelle. Accolta richiesta di sostituzione del soggetto attuatore e, con DGR n. 853 del 15/5/2012, disposta la riassegnazione del contributo regionale al Comune di Gorgo al Monticano, nuovo soggetto attuatore. Sottoscritto il nuovo disciplinare in data 08/6/2011. Il 25/01/2012 approvato il progetto esecutivo. Lavori aggiudicati definitivamente in data 31/7/2012, iniziati il 06/6/2012, ultimati il 24/07/2014. Prevista chiusura intervento con rendicontazione finale entro luglio 2015.

contributo regionale erogato: € 503.293,69
avanzamento della spesa: 89,7%

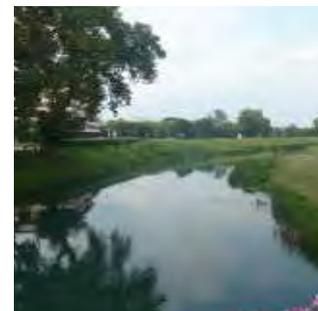

Soggetto attuatore: *Unione Montana dell'Alpago*

Titolo: Percorso per la fruizione sportivo-ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce

Cod: VENR13P093

IPA: Prealpi Bellunesi

Localizzazione: Puos d'Alpago

Costo complessivo iniziale: 880.000

Fonte regionale: 748.000

Fonte comunale: 132.000

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Infrastrutture

CUP: C19B11000270006

L'intervento prevede la realizzazione/riqualificazione di un percorso a valenza turistico-ricreativa che, partendo dalla valorizzazione del lago di Santa Croce, collega l'Alpago con il longarone e la Provincia di Treviso. Il percorso, una volta adeguato e qualificato, si presterà alla percorrenza a piedi ed in bicicletta e amplierà l'offerta del territorio, in particolare nei confronti dei turisti che raggiungono la zona dell'Alpago per svolgere attività sportive e ricreative.

Sottoscritto il disciplinare per l'attuazione dell'intervento in data 19/4/2012. Concessa proroga al 30/9/2013 per l'avvio delle procedure di aggiudicazione, poi ulteriore proroga di sei mesi, con parere favorevole della Direzione Turismo. Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunitaria in data 31/12/2013. Aggiudicazione dei lavori avvenuta il 14/4/2014, avvio lavori il 25/06/2014; prevista ultimazione entro maggio 2015 e chiusura intervento entro dicembre 2015.

contributo regionale erogato: € 177.754,25
avanzamento della spesa: 9,7%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Scorzè*

Titolo: Itinerario lungo l'argine del fiume Dese

Cod: VENR13P099

IPA: Miranese

Localizzazione: Scorzè

Costo complessivo iniziale: 525.000

Fonte regionale: 446.250

Fonte comunale: 78.750

Stato attuazione: in fase di collaudo

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G21B10000370005

Il progetto prevede la trasformazione di un elemento di separazione urbana, quale il fiume Dese, un'opportunità di connessione e di rivalutazione tra aree verdi, impianti sportivi, parchi e aree gioco, insediamenti scolastici e parcheggi di attestazione nei Comuni di Scorzè e Martellago. L'itinerario di valorizzazione ambientale proposto si snoda per circa 10 km, di cui 5,5 nel Comune di Scorzè, dal Molino Todori al nord fino al molino Pavaneto a sud, e 4,5 km nel comune di Martellago fino al parco "I laghetti". I siti di particolare pregio valorizzati sono i seguenti: i Molini di Scorzè, l'area compresa tra il fiume Dese ed il Rio San Martino, i molini di Martellago, l'area di villa Fappani, Combi, il parco "I laghetti" di Martellago.

Conclusa la procedura di aggiudicazione il 28/6/2013 e stipulato il contratto il 04/10/2013. Il 18/11/2013 affidati i lavori alla ditta esecutrice, ultimazione il 18/04/2014. Attualmente in fase di collaudo.

In corso di definizione del progetto esecutivo il costo totale dell'opera è aumentato ad € 560.000 (la maggiorazione della spesa resta a carico del Comune).

contributo regionale erogato: € 350.445,57
avanzamento della spesa: 74,2%



Soggetto attuatore: *Unione Montana Agno Chiampo*

Titolo: Anello ecoturistico Agno-Chiampo nei Comuni di Chiampo, Nogarole V., Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Cornedo V., Brogliano e Trissino

Cod: VNR13P106

IPA: Ovest Vicentino

Localizzazione: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo V., Crespadoro, Nogarole V., San Pietro Mussolino, Trissino

Costo complessivo iniziale: 450.000

Fonte regionale: 382.500

Fonte comunale: 67.500

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Difesa del Suolo

CUP: H77H10001780007

Il percorso ecoturistico di anello collega otto dei dieci comuni della Comunità Montana Agno-Chiampo, toccando siti turistici, culturali e ambientali particolarmente significativi e di pregio. I punti più interessanti dell'itinerario sono: Grotta e Pieve di Chiampo; Chiesa del Castellaro a Nogarole; Pescaia di Altissimo; Campanella di Altissimo; Museo etnografico di Crespadoro; Contrade Pozza, Meceneri e Perli a Crespadoro; S. Maria della Neve, S. Andrea e S. Sebastiano a Cornedo; Pieve di S. Martino a Brogliano; Villa Trissino Marzotto e Museo della comunicazione a Trissino.

Affidata l'esecuzione dei lavori al Servizio Forestale regionale di Vicenza con DGR n. 1533 del 31/7/2012. In data 03/9/2012 è stato sottoscritto il disciplinare per l'attuazione dell'intervento tra l'U.P. Foreste e Parchi e la Comunità Montana. Progettazione esecutiva approvata il 27/9/2012. Avvio dei lavori in data 08/10/2012, prevista conclusione entro il 29/12/2015 e chiusura intervento entro il 31/07/2016 (variazione cronoprogramma autorizzato con nota della Sezione Difesa del Suolo).

contributo regionale erogato: € 288.896,86
avanzamento della spesa: 53,5%

**Soggetto attuatore:** *Comune di Legnago*

Titolo: Il Sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione di attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villabartolomea

Cod: VNR13P103

IPA: Basso Veronese e Colognese

Localizzazione: Angiari, Legnago, Terrazzo, Villa Bartolomea

Costo complessivo iniziale: 335.000

Fonte regionale: 250.000

Fonte comunale: 85.000

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Difesa del Suolo

CUP: B19D10000040006

L'intervento prevede il posizionamento di pontili galleggianti con relative passerelle di collegamento, punti di sosta, aree e percorsi didattici, segnaletica stradale, cartelli informativi, arredi, illuminazione.

Approvato il 25/9/2012 dal Comune lo schema di disciplinare che regola le modalità attuative dell'intervento. Su richiesta del Comune, vista la necessità di procedere con la bonifica precauzionale da ordigni bellici, è stata concessa una proroga per avvio delle procedure di aggiudicazione. In data 02/12/2013 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori. Consegna lavori il 15/5/2014, prevista ultimazione entro il 15/9/2015.

contributo regionale erogato: € 31.083
avanzamento della spesa: 55,4%



Soggetto attuatore: *Comune di Paderno del Grappa*

Titolo: Riqualficazione ambientale Val Secca con percorso vita

Cod: VENR13P107

IPA: Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Localizzazione: Paderno del Grappa

Costo complessivo iniziale: 310.000

Fonte regionale: 263.500

Fonte comunale: 46.500

Stato attuazione: esecuzione lavori

Struttura regionale responsabile: Lavori Pubblici

CUP: G83E10000080006

Consiste in un percorso ad anello attrezzato per il trekking e attività ginnico-sportiva all'aria aperta, con partenza ed arrivo presso l'area ad alto valore paesaggistico del torrente Astego, attraversamento della campagna di Paderno, percorso del tracciato della Val Secca con laghetto, incontro con la chiesa parrocchiale ed il campanile di Paderno e Villa Fietta. Si localizza nel centro di Paderno del Grappa. Per i percorsi ciclo-pedonali (2,6 km) si utilizzerà un fondo naturale, per le piazzole (15 piazzole per attività ginnico - sportiva) materiali bituminosi naturalizzati. Gli elementi di arredo ed attrezzature saranno in legno. Il progetto si inserisce in una rete di itinerari già esistenti quali Itinerario della Grande Guerra, Itinerario Strada dell'Architettura, Itinerario della Marca Storica.

Sottoscritto il disciplinare per l'attuazione dell'intervento tra Comune e Direzione regionale Lavori Pubblici il 14/11/2011. In data 30/8/2013 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, il 06/08/2014 è stato poi firmato il contratto d'appalto. Lavori iniziati il 09/10/2014, si prevede l'ultimazione nel mese di gennaio 2015. La chiusura dell'intervento è prevista entro febbraio 2015.

contributo regionale erogato: € 0
avanzamento della spesa: 73,6%



Soggetto attuatore: *Comune di Giavera del Montello*

Titolo: Parco attrezzato Santi Angeli

Cod: VENR13P108

IPA: Montello Piave Sile

Localizzazione: Giavera del Montello

Costo complessivo iniziale: 310.000

Fonte regionale: 263.500

Fonte comunale: 46.500

Stato attuazione: in fase di collaudo

Struttura regionale responsabile: Turismo

CUP: I48J10000110006

L'intervento prevede la riqualficazione di uno spazio pubblico sul Montello, finora poco utilizzato, al fine di aumentarne la fruibilità da parte di residenti e turisti. L'area è circondata dalle numerose grotte ed è situata all'interno del bosco del Montello in una zona di pregio naturalistico. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di km 1,2 e di altri percorsi intermedi che formano piccoli anelli. Una parte dell'area è destinata a parcheggio auto, un'altra a sosta camper con potenziamento ed ampliamento della struttura già esistente con relativi servizi di carico e scarico, allacciamenti elettrici e servizi igienici. E' prevista la realizzazione di un bar chiosco di ristoro-punto di informazione turistica con annessi servizi igienici. Una parte d'area è destinata alle attività sportive all'aperto, attrezzata con un percorso vita, ed altra ad area pic-nic attrezzata con tavoli e panchine in legno vicino alle giostrine per bambini.

Non ancora sottoscritto il disciplinare che regola l'attuazione dell'intervento. Apportate varianti progettuali nel progetto definitivo, che non mutano le finalità complessive dell'intervento. Approvata progettazione esecutiva in gennaio 2012. Conclusa la procedura di aggiudicazione in data 07/5/2013, stipulato il contratto il 09/5/2013. Avvio lavori il 15/5/2013. Fine lavori il 31/10/2013. Prevista rendicontazione finale e chiusura dell'intervento entro il 30/06/2015.

contributo regionale erogato: € 200.647,74
avanzamento della spesa: 94,5%



PARTE II

Intese Programmatiche d'Area

nel territorio veneto


Riconoscimento delle Intese Programmatiche d'Area - DGR n. 2027 del 08/10/2012

Le Intese Programmatiche d'Area riconosciute dalla Regione Veneto sono 25:

- Alto Vicentino
- Altopiano dei Sette Comuni
- Area Berica
- Bassa Padovana
- Basso Veronese e Colognese
- Camposampierese
- Castellana
- Chioggia Cavarzere Cona
- Dolomiti Venete
- Marca Trevigiana
- Medio Brenta
- Miranese
- Montagna Veronese
- Montello Piave Sile
- Opitergino Mottense
- Ovest Vicentino
- Pedemontana del Brenta
- Pedemontana del Grappa e dell'Asolano
- Prealpi Bellunesi
- Risorgive
- Riviera del Brenta
- Saccisica
- Sistema Polesine
- Terre Alte Marca Trevigiana
- Venezia Orientale

INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA NEL TERRITORIO REGIONALE

(DGR n. 2027 del 08/10/2012)

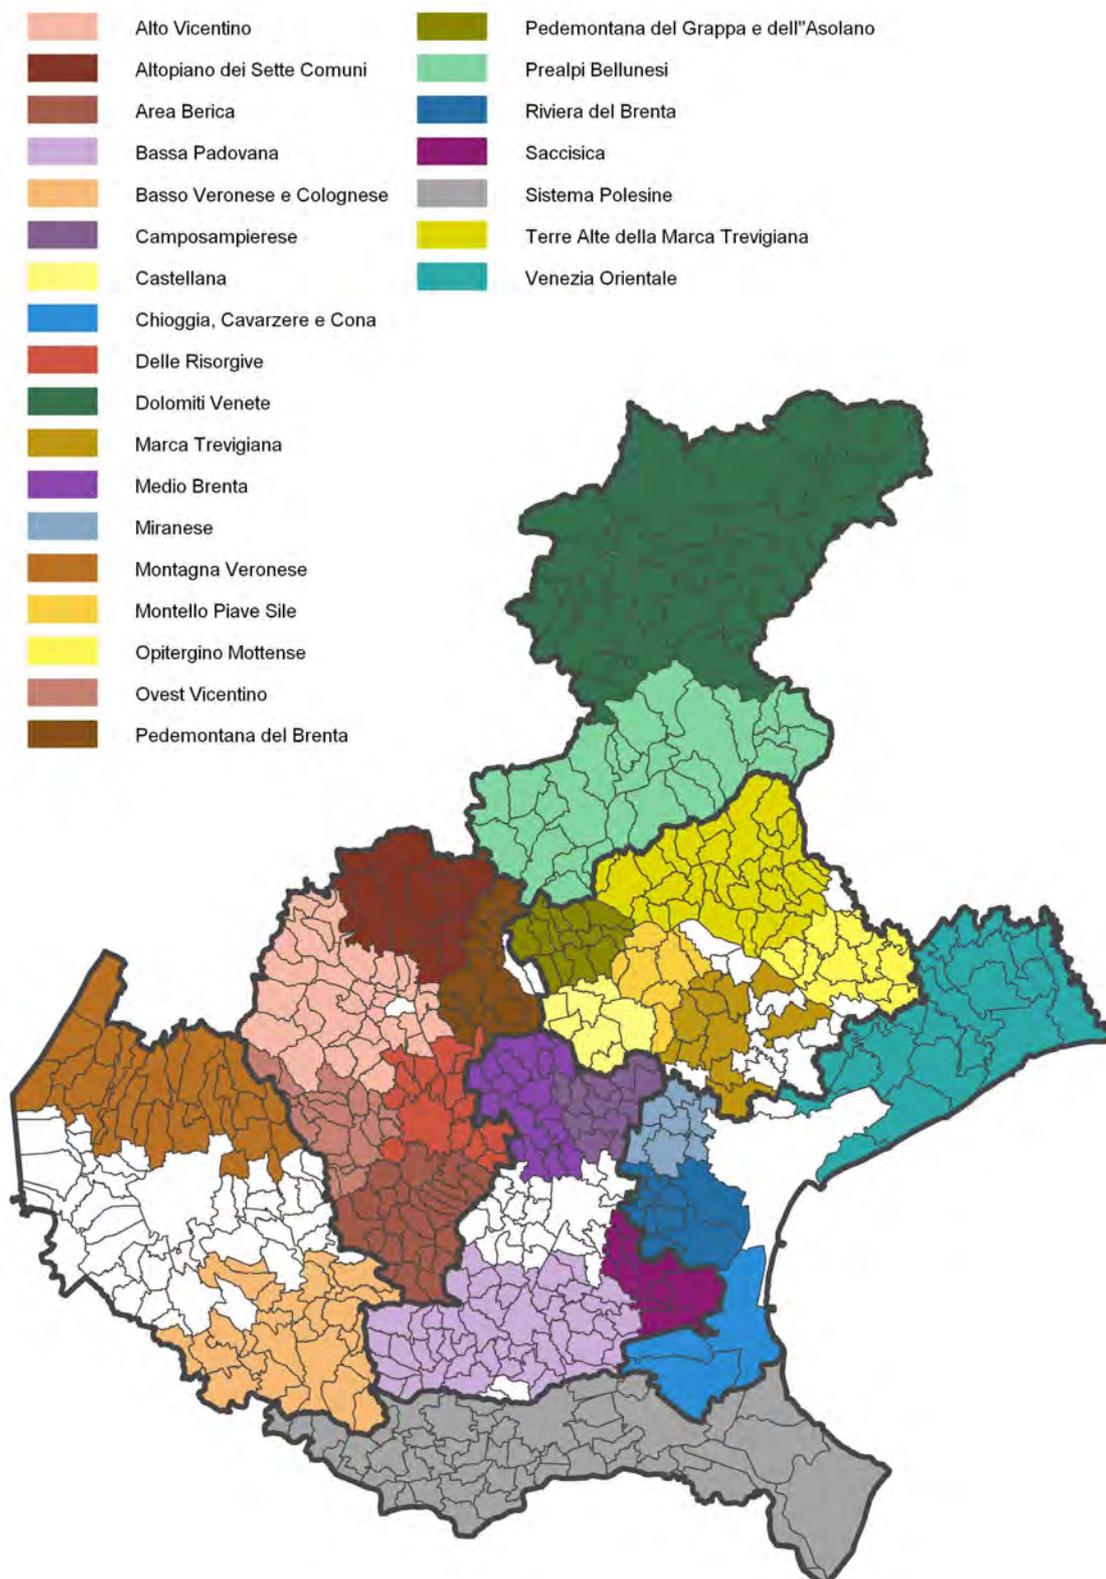

Intesa Programmatica d'Area ALTO VICENTINO

Superficie: 665 kmq - Popolazione: 218.625 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Schio

Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

www.comune.schio.vi.it

tel. 0445/691204 - fax 0445/530615

PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net



Comuni appartenenti (33): Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carre', Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Sarcedo, Santorso, Schio, Thiene, Tonzetta del Cimone, Torrelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Zane'.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| 2008 | Comune di Schio | Recupero dell'edificio di archeologia industriale "Shed" per il potenziamento delle attività del Centro per il trasferimento tecnologico Demotech | 2.045.520 | 1.091.000 | Lavori Pubblici | 53 |
| 2008 | Comune di Thiene | Restauro e rifunzionalizzazione del complesso denominato Villa Fabris - sede Centro Europeo per i Mestieri della Conservazione del Patrimonio Culturale | 1.758.480 | 1.335.000 | Industria Artigianato | 52 |
| 2009 | Comune di Tonzetta del Cimone | Completamento struttura copertira polivalente al fine della pratica del pattinaggio su ghiaccio | 720.000 | 638.300 | Lavori Pubblici | 66 |
| 2009 | Comune di Valli del Pasubio | Azione pilota "Soggiornare nelle antiche valli dei conti e dei signori" | - | a) 500.000 b) 75.000 | Turismo | 67 |
| 2010 | Comune di Valli del Pasubio | Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro terme, Valli del Pasubio e Posina | 1.000.000 | 750.000 | Difesa del Suolo | 74 |
| totale | | | 5.524.000 | 4.389.300 | | |

Intesa Programmatica d'Area ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Superficie: 491 kmq - Popolazione: 23.068 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni"

Piazza Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI)

www.reggenza.com

tel. 0424/63700 - fax 0424/64567

PEC: cmreggenza@legalmail.it



Comuni appartenenti (9): Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Valstagna

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|---------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| 2004 | Comune di Foza | Restauro e riqualificazione dell'ex sede municipale con destinazione d'uso a museo | 1.050.479 | 887.200 | Beni Culturali | 17 |
| 2005 | Comune di Asiago | Adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio del ghiaccio | 950.000 | 617.500 | Lavori Pubblici | 24 |
| 2006 | Comune di Gallio | Sistemazione e messa in sicurezza della strada turistica "Gallio - Melette - Monte Ortigara" | 892.371 | 633.371 | Infrastrutture | 29 |
| 2008 | Comune di Lusiana | Centro servizi sportivi denominato Fontanella Bike Resort | 1.134.000 | 897.000 | Lavori Pubblici | 53 |
| 2008 | Comune di Rotzo | Elettrificazione dei comprensori turistici di Campolongo in Comune di Rotzo e di Monte Verena in Comune di Roana | 1.480.000 | 998.750 | Difesa del Suolo | 49 |
| 2010 | Comune di Valstagna | Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume – Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta | 960.300 | 750.000 | Turismo | 76 |
| totale | | | 6.467.150 | 4.783.82 | | |

Intesa Programmatica dell'AREA BERICA

Superficie: 473 kmq - Popolazione: 95.388 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Villaga

Via G. Verdi, 32 - 36021 Villaga (VI)

www.comunevillaga.vi.it

tel. 0444/886037 – fax 0444/886731

PEC: villaga.vi@cert.ip-veneto.net



Comuni appartenenti (24): Agugliaro, Albettono, Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga, Zovencedo

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 2007 | Comune di Villaga | Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano del Pozzolo | 840.000 | 620.000 | Lavori Pubblici | 36 |
| 2007 | Comune di Arcugnano | Pista ciclabile pedonale dal Lago di Fimon al Tormeno | 980.000 | 730.000 | Infrastrutture | 40 |
| 2010 | Comune di Alonte | Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale – 1° stralcio | 1.122.000 | 750.000 | Lavori Pubblici | 74 |
| totale | | | 2.942.000 | 2.100.000 | | |

Intesa Programmatica d'Area BASSA PADOVANA

Superficie: 891 kmq - Popolazione: 193.684 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Padova


Piazza Antenore, 3 - 35121 - Padova

www.provincia.pd.it

tel. 049/8201111 - 049/8201631

fax 049/8201235 - 049/8201008

PEC: provincia.padova@cert.ip-veneto.net

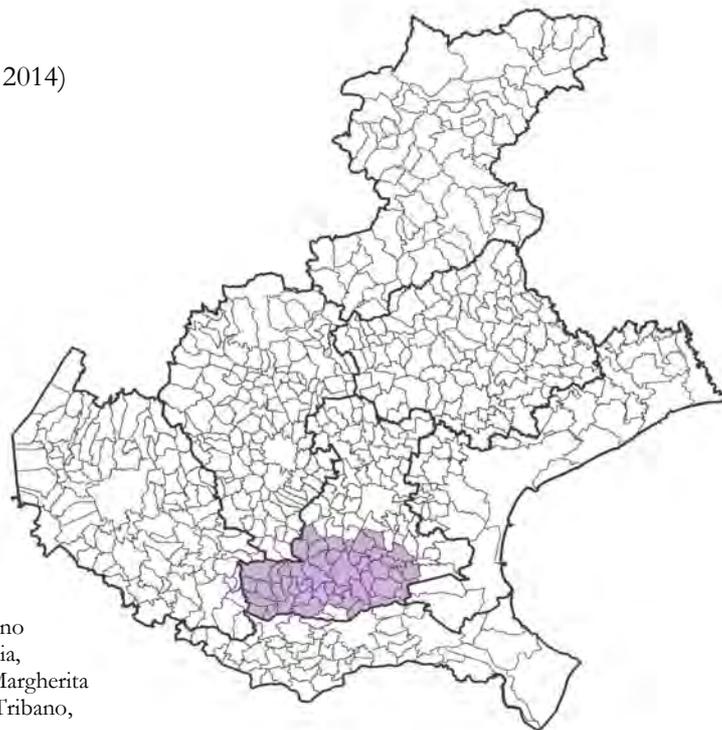

Comuni appartenenti (46):

Agna, Anguillara Veneta, Arqua'
 Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani,
 Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo,
 Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze,
 Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino
 San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia,
 Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita
 d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano,
 Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo Euganeo.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2004 | Cosecon s.p.a. | Opere di urbanizzazione Area PIP Casale di Scodosia | 1.000.000 | 664.400 | Industria Artigianato | 18 |
| 2006 | Comune di Pozzonovo | Lavori di ristrutturazione di Villa Centanini per trasformazione in museo della civiltà rurale-ostello- attività turistico ambientali | 1.200.000 | 900.000 | Beni Culturali | 31 |
| 2008 | Comune di Piacenza d'Adige | Centro di Educazione Naturalistica e Ambientale per la valorizzazione paesaggistica nell'area della Golena dell'Adige denominata "Il Bosco" | 2.500.000 | 1.483.000 | - | 46 |
| 2009 | Comune di Monselice | Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico, integrazione impianti tecnologici e restauro affreschi di Villa Pisani | 1.301.700 | 833.400 | Beni Culturali | 65 |
| 2010 | Comune di Pernumia | Percorso itinerante storico-ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige – Vie di terra e di acqua | 1.500.000 | 750.000 | Turismo | 72 |
| totale | | | 7.501.700 | 4.630.800 | | |

Intesa Programmatica d'Area BASSO VERONESE E COLOGNESE

Superficie: 792 kmq - Popolazione: 141.385 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Verona


Via S. Maria Antica, 1 - 37122 Verona (sede operativa: Via delle Franceschine 10 – Verona)

www.provincia.vr.it

tel. 045/9288611 - 045/9288314

fax 045/9288731 - 045/9288320

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

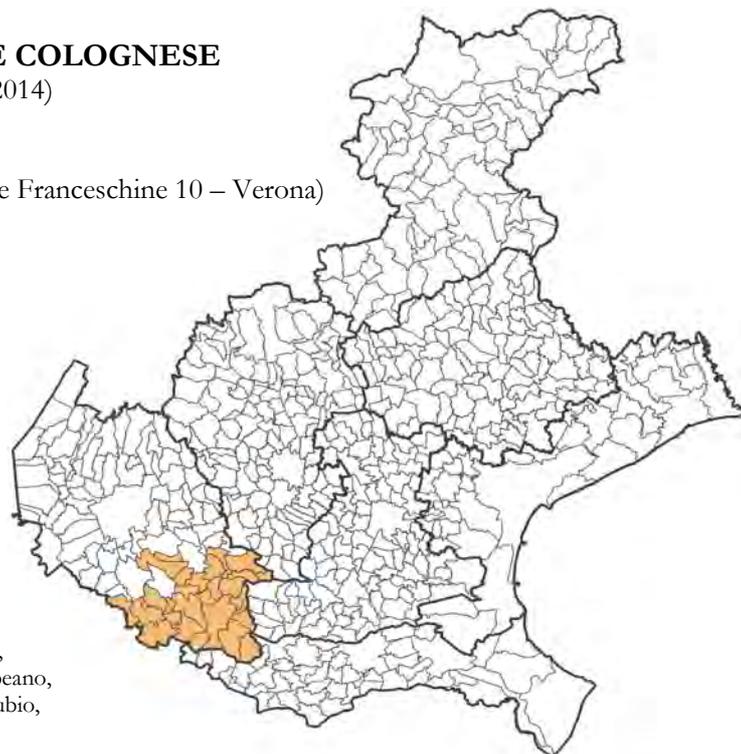

Comuni appartenenti (27): Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concemarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palu', Pressana, Roverchiara, Roveredo di Gua', Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorga', Terrazzo, Veronella, Villa Bartolomea

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 2004 | Comune di Albaredo d'Adige | Recupero dell'ex casa del fascio quale centro socio-culturale del territorio | 1.150.886 | 577.800 | Lavori Pubblici | 17 |
| 2005 | Comune di Legnago | Realizzazione percorso ciclabile "dalle Alpi all'Adriatico" tratto VR sud | 1.208.760 | 906.530 | Infrastrutture | 24 |
| 2006 | Comune di Cerea | Valorizzazione delle potenzialità turistiche e congressuali dell'area fieristica della ex perfosfati di Cerea | 1.100.000 | 800.030 | Lavori Pubblici | 28 |
| 2010 | Comune di Legnago | Il sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione di attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villabartolomea | 335.000 | 250.000 | Difesa del Suolo | 79 |
| totale | | | 3.794.646 | 2.534.36 | | |

Intesa Programmatica d'Area CAMPOSAMPIERESE

Superficie: 226 kmq - Popolazione: 100.385 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Federazione dei Comuni del Camposampierese

Via Cordenons, 17 - 35012 Camposampiero (PD)

tel. 049/9315631 - fax 049/9315611

www.fcc.veneto.it

PEC: amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it



Comuni appartenenti (11): Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|--|---|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2007 | Provincia di Padova | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale - Lotto A | 1.872.048 | 872.048 | Infrastrutture | 39 |
| 2010 | Federazione dei Comuni del Camposampierese | La via delle risorgive tra ambiente e cultura | 1.425.000 | 750.000 | Lavori Pubblici | 73 |
| totale | | | 3.297.048 | 1.622.048 | | |

Intesa Programmatica d'Area CASTELLANA

Superficie: 232 kmq - Popolazione: 93.813 abitanti (dati Istat 2014)


Soggetto responsabile: Comune di Castelfranco Veneto

Via Francesco Maria Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

tel. 0423/735596 - fax 0423/735597

PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

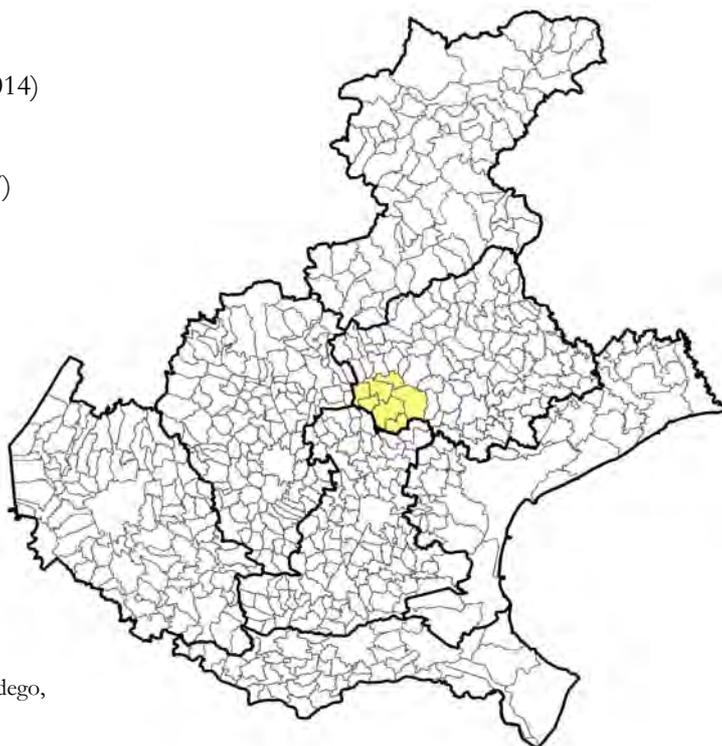

Comuni appartenenti (7): Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Veduggio

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2007 | Comune di Castello di Godego | Realizzazione di un itinerario turistico lungo il fiume Muson denominato "Sui sentieri degli Ezzelini" | 1.570.000 | 1.077.500 | Infrastrutture | 36 |
| totale | | | 1.570.000 | 1.077.500 | | |

Intesa Programmatica d'Area CHIOGGIA-CAVARZERE-CONA

Superficie: 390 kmq - Popolazione: 67.540 abitanti (dati Istat 2011)

Soggetto responsabile: Provincia di Venezia

Sede legale: Ca' Corner 2262 San Marco - 30124 Venezia

Sede operativa: Via Sansovino 5 (Centro Servizi 2 - Torre Nord)

www.provincia.venezia.it

tel. 041/2501839 – fax 041/72501840

PEC: attivitaproduttive@pec.provincia.ve.it



Comuni appartenenti (3): Cavarzere, Chioggia, Cona

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|---------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2004 | Comune di Chioggia | Realizzazione di un polo agroalimentare con ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Brondolo | 3.746.175 | 1.349.600 | Produzioni Agroalimentari | 16 |
| 2006 | ASPO Chioggia | Riqualificazione area vecchio porto di Chioggia di Isola Saloni - Area filtro servizi logistici e supporto all'autostrada del mare | 1.850.000 | 955.974 | Infrastrutture | 29 |
| 2007 | Comune di Cavarzere | Restauro Palazzo Barbiani - sede municipale | 2.750.000 | 1.500.000 | Lavori Pubblici | 37 |
| 2009 | Comune di Chioggia | Progetto di sistemazione e arredo di Corso del Popolo - La Piazza di Chioggia | 2.139.500 | 1.428.250 | Lavori Pubblici | 65 |
| totale | | | 10.485.675 | 5.233.824 | | |

Intesa Programmatica d'Area DOLOMITI VENETE

Superficie: 2.333 kmq - Popolazione: 66.109 abitanti (dati Istat 2014)


Soggetto responsabile: Unione Montana Agordina

Via IV Novembre 2 – 32021 Agordo (BL)

www.agordino.bl.it - tel. 0437/62390 – fax 0437/62043

PEC: um.agordino.bl@pecveneto.it

Comuni appartenenti (42): Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Soverzene, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore

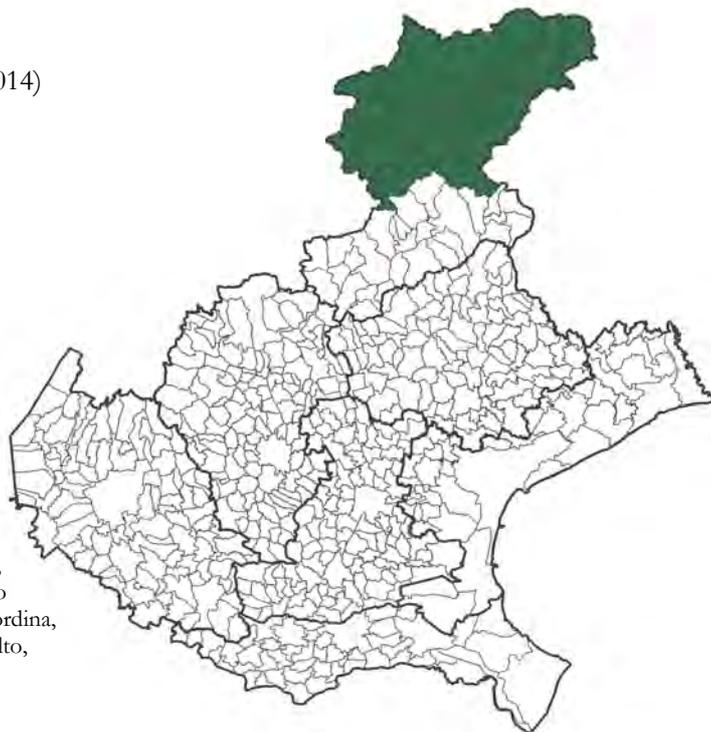

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------|
| 2004 | U.Montana Cadore Longaronese Zoldo | Progetto integrato: valorizzazione turistico-ambientale del territorio | 1.860.093 | 1.423.500 | Turismo | 12 |
| 2005 | Comune di Auronzo di Cadore | Riqualificazione Compr. sciistico Monte Agudo. Realizzazione impianto di risalita Taiarezze-Malon | 2.925.000 | 1.500.000 | Mobilità | 23 |
| 2005 | Comune di Comelico Superiore | Ampliamento e ammodernamento area sciabile in Padola di Comelico Superiore. Pista da sci denominata Campo | 1.005.402 | 754.050 | Mobilità | 23 |
| 2007 | Comune di Selva di Cadore | Realizzazione di un fabbricato da destinare a centro servizi polifunzionale finalizzato allo sviluppo turistico del territorio dell'Alto Agordino | 900.000 | 585.000 | Turismo | 37 |
| 2007 | U.Montana della Valle del Boite | Completamento itinerario ciclo-pedonale "La lunga via delle Dolomiti" di collegamento tra i Comuni di Vodo di Cadore, Borca di Cadore, S.Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo - 3° stralcio | 1.017.630 | 819.290 | Infrastrutture | 40 |
| 2008 | U.Montana Cadore Longaronese Zoldo | Progetto integrato di sviluppo locale - Percorso dei Sagrati Storico Religiosi - Comuni di Castellavazzo, Colle S. Lucia, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Soverzene, Taibon Agordino, Zoppè di Cadore | 1.726.200 | 1.451.000 | Lavori Pubblici | 47 |
| 2008 | Comune di Agordo | Realizzazione di impianto comprensoriale di atletica leggera in località Polane del Comune di Agordo | 700.000 | 584.500 | Lavori Pubblici | 54 |
| 2008 | Comune di Valle di Cadore | Nuovo centro coperto per il mercato comprensoriale dei prodotti tipici del territorio | 2.291.079 | 1.483.000 | - | 47 |
| 2008 | Comune di Sappada | Opere di riqualificazione ambientale e valorizzazione antichi nuclei abitativi di Sappada | 2.750.000 | 1.483.000 | Lavori Pubblici | 46 |
| 2009 | Comune di Lozzo di Cadore | La traversata del centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica | 1.829.270 | 1.477.500 | Difesa del Suolo | 60 |
| 2009 | Comune di Colle Santa Lucia | Il sito minerario del "Fursil": recupero a fini turistico-culturali della galleria mineraria Breda e realizzazione del centro visita | 1.580.000 | 1.477.500 | Lavori Pubblici | 60 |
| 2010 | Comune di Canale d'Agordo | Percorso religioso e turistico - naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la "Via dei papi" | 883.000 | 750.000 | Turismo | 75 |
| totale | | | 19.467.675 | 13.788.340 | | |

Intesa Programmatica d'Area MARCA TREVIGIANA

Superficie: 336 kmq - Popolazione: 222.011 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Treviso

Via Municipio, 16 - 31100 Treviso

www.comune.treviso.it

tel. 0422/658243 – fax 0422/658398

PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it



Comuni appartenenti (11): Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Treviso, Villorba.

Contributi regionali assegnati

L'iniziativa, sorta nel corso del 2012, non ha beneficiato dei contributi regionali assegnati nel periodo dal 2004 al 2010.

Intesa Programmatica d'Area MEDIO BRENTA

Superficie: 338 kmq - Popolazione: 142.817 abitanti (dati Istat 2014)


Soggetto responsabile: Unione dei Comuni Padova Nordovest

Viale S. Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

www.unionedeicomunipadovanordovest.it

tel. 049/9697911 - fax 049/9697930

PEC: unionepadovanordovest.pd@legalmailpa.it

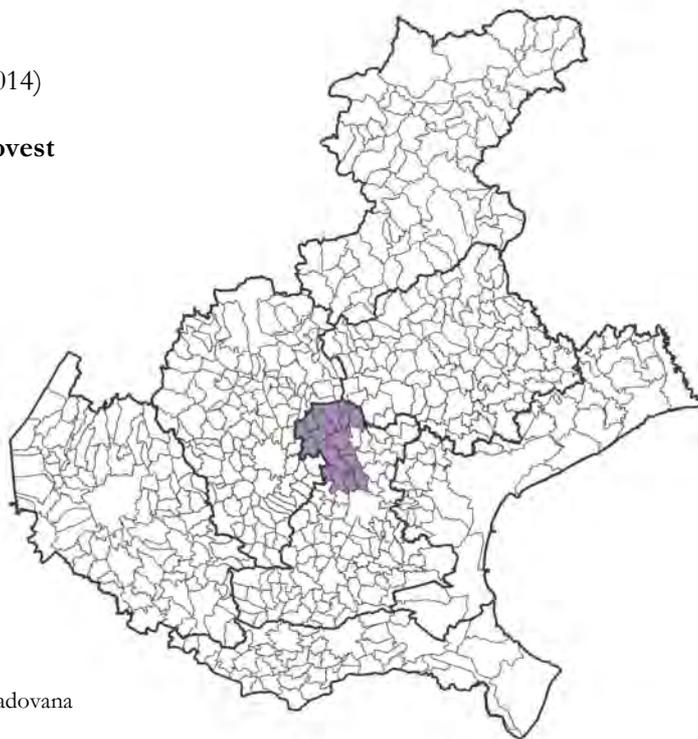

Comuni appartenenti (17): Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2008 | Provincia di Padova | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale - Lotto B | 1.833.557 | 1.269.000 | Infrastrutture | 55 |
| 2009 | Comune di Fontaniva | Sistemazione Villa Borromeo per museo agricolo - 2° stralcio | 1.960.000 | 1.477.500 | Beni Culturali | 63 |
| totale | | | 3.793.557 | 2.746.500 | | |

Intesa Programmatica d'Area MIRANESE

Superficie: 184 kmq - Popolazione: 141.392 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Venezia


Sede legale: Ca' Corner 2262 san Marco - 30124 Venezia

Sede operativa: Via Sansovino 5 (Centro Servizi 2 - Torre Nord)

www.provincia.venezia.it

tel. 041/2501839 - fax 041/2501840

PEC: attivitaproductive@pec.provincia.ve.it

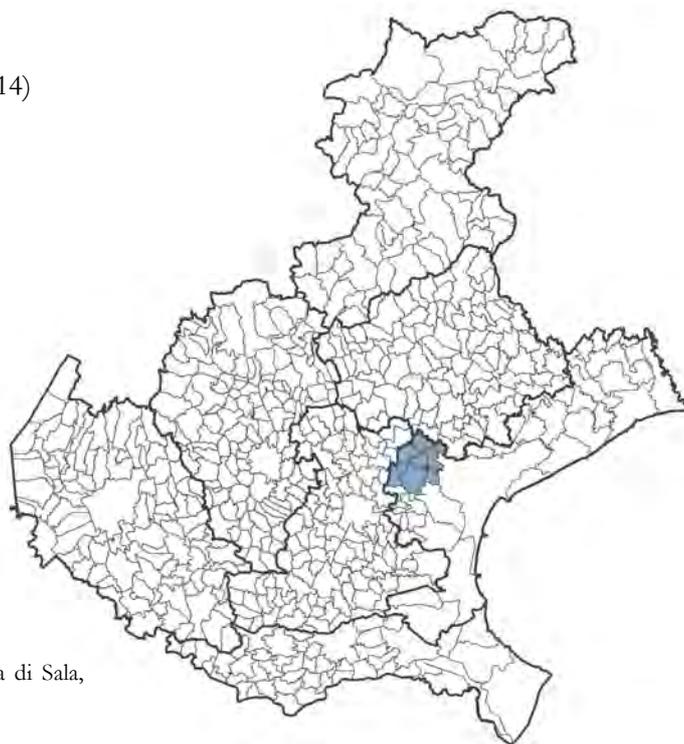

Comuni appartenenti (7): Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|
| 2010 | Comune di Scorzè | Itinerario lungo l'argine del fiume Dese | 525.000 | 446.250 | Lavori Pubblici | 78 |
| totale | | | 525.000 | 446.250 | | |

Intesa Programmatica d'Area MONTAGNA VERONESE

Superficie: 944 kmq - Popolazione: 109.221 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Verona

Via S. Maria Antica, 1 - 37122 Verona (sede operativa: Via delle Franceschine 10 – Verona)

www.provinvia.vr.it

tel. 045/9288611 - 045/9288314

fax 045/9288320 - 045/9288731

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net



Comuni appartenenti (29): Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Costermano, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Negrar, Rivoli Veronese, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|--|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| 2004 | Comune di Bosco Chiesanuova | Realizzazione di strutture turistico-sportive polifunzionali ricreative Monti Lessini | 2.010.000 | 1.335.500 | Lavori Pubblici | 16 |
| 2007 | Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella | Completamento recupero di Villa Bassani Brenzoni per alta formazione nel comparto della lavorazione lapidea | 700.000 | 525.000 | Industria Artigianato | 38 |
| 2008 | Comune di Brentino Belluno | Recupero antica viabilità sul versante orientale del Monte Baldo | 668.000 | 540.000 | Lavori Pubblici | 50 |
| 2008 | Comune di Brenzone | Recupero e valorizzazione storico-culturale, paesaggistica, turistica e ambientale di Brenzone - località Campo | 760.000 | 633.000 | Lavori Pubblici | 50 |
| 2009 | Comunità Montana della Lessinia | Sistema della sentieristica della Lessinia: valorizzazione turistica area Valpolicella e Corno d'Aquilio | 1.793.989 | 1.236.950 | Difesa del Suolo | 61 |
| 2009 | Comune di Bosco Chiesanuova | Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio | 2.182.000 | 1.477.500 | Lavori Pubblici | 61 |
| 2009 | Comune di Fumane | Azione pilota "A.P. per la riqualificazione degli elementi urbani del centro storico di Molina" | – | a) 500.000 b) 75.000 | Turismo | 67 |
| 2010 | Unione Montana del Baldo-Garda | B.A.L.D.O. in rete Biodiversità – Alpeggi – Lago – Didattica e sport – Ospitalità | 882.353 | 750.000 | Difesa del Suolo | 77 |
| totale | | | 8.996.342 | 7.072.950 | | |

Intesa Programmatica d'Area MONTELLO PIAVE SILE

Superficie: 205 kmq - Popolazione: 80.973 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Montebelluna

Corso Mazzini 118 – 31044 Montebelluna (TV)

www.comune.montebelluna.tv.it

tel. 0423/617202 – fax 0423/617220

PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it



Comuni appartenenti (7): Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2009 | Comune di Istrana | Restauro di Villa Lattes per la nuova sede del museo della Collezione Lattes: automi, carillons, dipinti | 1.750.000 | 1.465.200 | Beni Culturali | 64 |
| 2010 | Comune di Giavera del Montello | Parco attrezzato Santi Angeli | 310.000 | 263.500 | Turismo | 80 |
| totale | | | 2.060.000 | 1.728.700 | | |

Intesa Programmatica d'Area OPITERGINO MOTTENSE


Superficie: 327 kmq - Popolazione: 78.869 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Oderzo

Via Garibaldi 14 – 31046 Oderzo (TV)

tel. 0422/812220 – fax 0422/812222

PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it

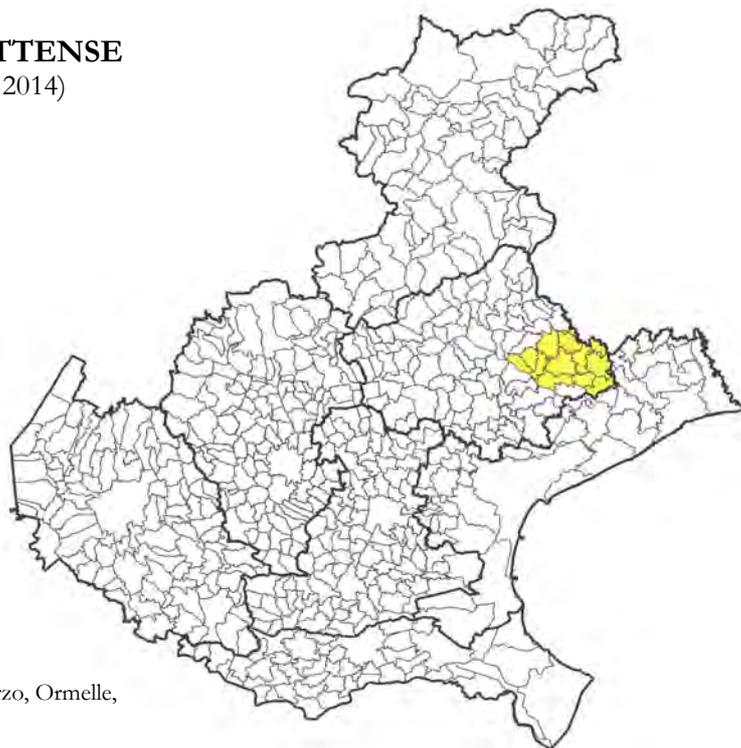

Comuni appartenenti (13): Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, San Polo di Piave.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|
| 2010 | Comune di Gorgo al Monticano | "Gira Monticano" – Itinerario naturalistico del fiume Monticano | 882.000 | 749.700 | Infrastrutture | 77 |
| totale | | | 882.000 | 749.700 | | |

Intesa Programmatica d'Area OVEST VICENTINO

Superficie: 310 kmq - Popolazione: 136.811 abitanti (dati Istat 2014)


Soggetto responsabile: Comune di Chiampo

Piazza Zanella, 42 - 36072 Chiampo (VI)

www.comune.chiampo.vi.it - www.pattoagnochiampo.com

tel. 0444/475211 - fax 0444/624759

PEC: protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it

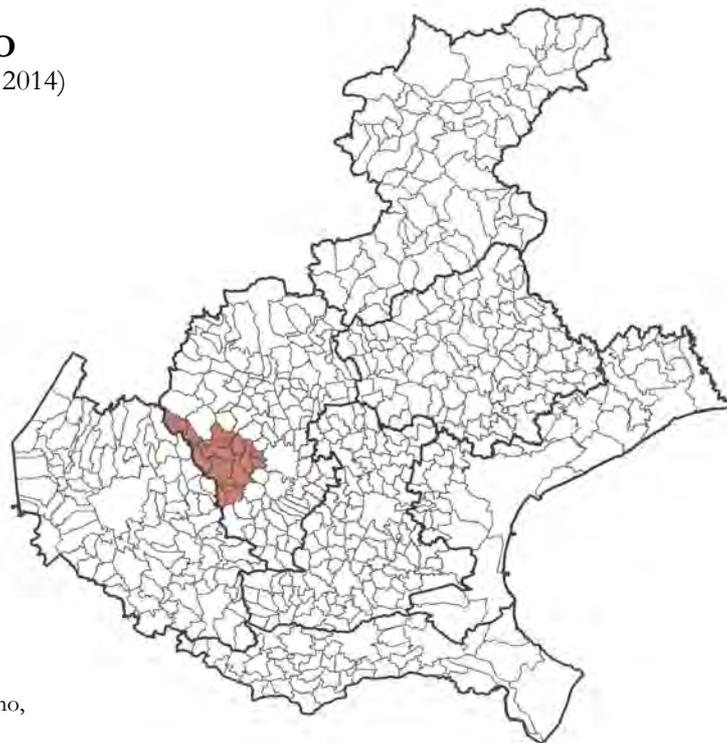

Comuni appartenenti (19): Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 2004 | Comune di Chiampo | Viabilità di collegamento tra la nuova zona industriale e la SP Val di Chiampo in zona Pieve Bassa | 1.285.000 | 915.000 | Infrastrutture | 18 |
| 2008 | Comune di Gambellara | Recupero delle barchesse di Palazzo Cera: centro servizi per la promozione dell'attività vitivinicola e Strada del vino | 1.130.535 | 821.000 | Turismo | 54 |
| 2010 | Unione Montana Agno-Chiampo | Anello ecoturistico "Agno-Chiampo" nei Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Cornedo Vicentino, Brogliano e Trissino | 450.000 | 382.500 | Difesa del Suolo | 79 |
| totale | | | 2.865.535 | 2.118.500 | | |

Intesa Programmatica d'Area PEDEMONTANA DEL BRENTA

Superficie: 295 kmq - Popolazione: 135.358 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Bassano del Grappa

Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

www.comune.bassano.vi.it

tel. 0424/519202 – fax 0424/519206

PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net



Comuni appartenenti (17): Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|
| 2010 | Comune di Bassano del Grappa | AQuAS 1- Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo Sostenibile dell'area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica | 950.000 | 689.000 | Lavori Pubblici | 76 |
| totale | | | 950.000 | 689.000 | | |

Intesa Programmatica d'Area PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELL'ASOLANO

Superficie: 248 kmq - Popolazione: 63.118 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Asolo

Piazza D'Annunzio 1 - 31010 Asolo (TV)

www.comune.asolo.tv.it

tel. 0423/524604 – fax 0423/950130

PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it



Comuni appartenenti (13): Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Cornuda, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 2005 | "Fondazione Canova" di Possagno | Osservatorio Canoviano della cultura della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | 800.000 | 592.000 | Lavori Pubblici | 22 |
| 2006 | Comune di S. Zenone degli Ezzelini | Recupero della torre di Ezzelino a S. Zenone degli Ezzelini | 800.000 | 600.000 | Beni Culturali | 30 |
| 2008 | Comune di Fonte | Realizzazione itinerario turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" lungo il Muson e il Lastego | 1.320.000 | 1.110.000 | Infrastrutture | 49 |
| 2010 | Comune di Paderno del Grappa | Riqualficazione ambientale Val Secca con percorso vita | 310.000 | 263.500 | Lavori Pubblici | 80 |
| totale | | | 3.230.000 | 2.565.500 | | |

Intesa Programmatica d'Area PREALPI BELLUNESI

Superficie: 1.345 kmq - Popolazione: 143.321 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Unione Montana della Val Belluna

Via dei Giardini 17 – 32036 Sedico (BL)


www.valbelluna.bl.it

tel. 0437/852896 – fax 0437/856070

PEC: cmvalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

www.gal2.it

tel. 0437/838586 - fax 0437/443916

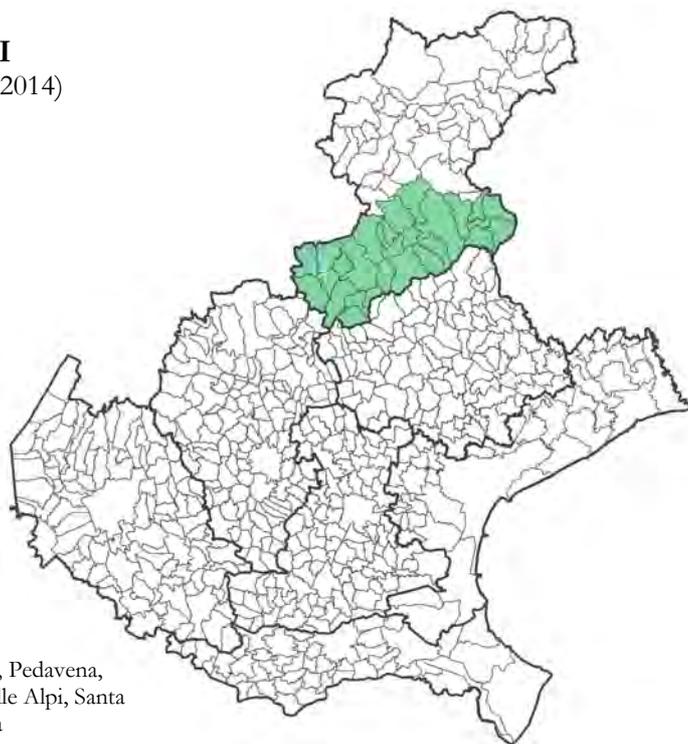

Comuni appartenenti (25): Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero-Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Trichiana

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|--|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| 2006 | Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville | Progetto per la realizzazione di un centro culturale a Quero | 750.000 | 540.000 | Lavori Pubblici | 30 |
| 2007 | Comune di Pedavena | Progetto di impianti sportivi e strutture ricettivo-turistiche in località Boscherai | 2.400.000 | 900.000 | Lavori Pubblici | 41 |
| 2009 | Comune di Feltre | Azione pilota "Feltre. Camere con vista" | - | a) 500.000 b) 75.000 | Turismo | 67 |
| 2010 | Unione Montana dell'Alpago | Percorso per la fruizione sportivo-ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce | 880.000 | 748.000 | Infrastrutture | 78 |
| totale | | | 4.030.000 | 2.763.000 | | |

Intesa Programmatica d'Area delle RISORGIVE

Superficie: 339 kmq - Popolazione: 231.616 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Vicenza

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

www.provincia.vicenza.it

tel. 0444/908179 – fax 0444/908164

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Comuni appartenenti (16): Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla.

Contributi regionali assegnati

L'iniziativa, sorta nel corso del 2011, non ha beneficiato dei contributi regionali assegnati nel periodo dal 2004 al 2010.

Intesa Programmatica d'Area RIVIERA DEL BRENTA

Superficie: 314 kmq - Popolazione: 129.553 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Provincia di Venezia

Sede legale: Ca' Corner 2262 San Marco - 30124 Venezia

Sede operativa: Via Sansovino 5 (Centro Servizi 2 - Torre Nord)

www.provincia.venezia.it

tel. 041/2501839 – fax 041/2501840

PEC: attivitaproduttive@pec.provincia.ve.it



Comuni appartenenti (10): Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso', Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo.

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 2004 | Comune di Mira | Restauro Villa Contarini 1° - 3° stralcio | 4.180.000 | 1.423.500 | Lavori Pubblici | 15 |
| totale | | | 4.180.000 | 1.423.500 | | |

Intesa Programmatica d'Area SACCISICA

Superficie: 246 kmq - Popolazione: 76.723 abitanti (dati Istat 2014)


Soggetto responsabile: Comune di Piove di Sacco

Piazza G. Matteotti, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

www.comune.piovedisacco.pd.it

tel. 049/9709103 – fax 049/9709777

PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

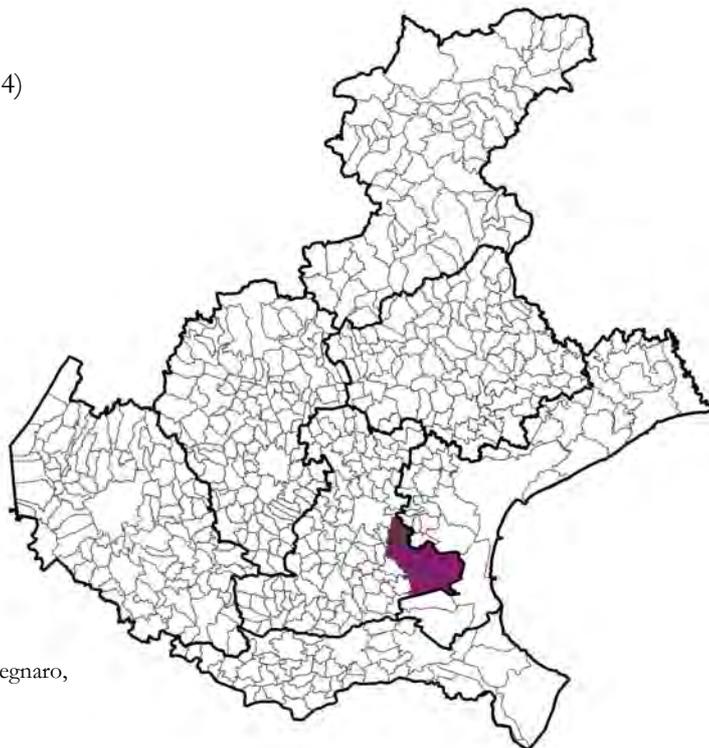

Comuni appartenenti (10): Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove, Saonara.

Contributi regionali assegnati

L'iniziativa, sorta nel corso del 2011, non ha beneficiato dei contributi regionali assegnati nel periodo dal 2004 al 2010.

Intesa Programmatica d'Area SISTEMA POLESINE


Superficie: 1.790 kmq - Popolazione: 244.062 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (CON.SVI.PO.)

Via delle Industrie 53/b – 45100 Rovigo

tel. 0425/412576 – fax 0425/419410 - www.consvipo.it

PEC: consvipo@pec.consvipo.it

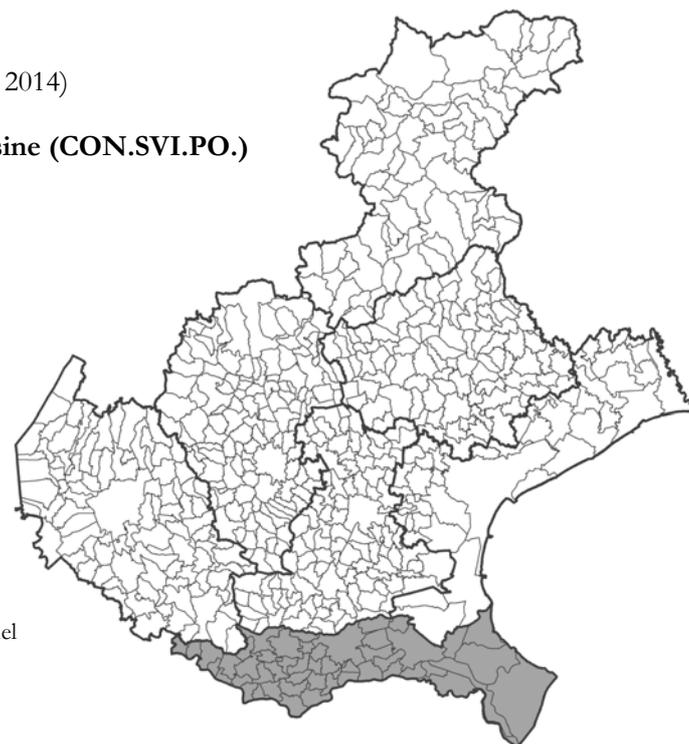

Comuni appartenenti (50): Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| 2004 | Comune di Pincara | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante | 3.050.000 | 1.423.500 | Infrastrutture | 15 |
| 2005 | Provincia di Rovigo | Lavori di ampliamento dell'istituto alberghiero di Adria | 1.200.000 | 629.920 | Lavori Pubblici | 22 |
| 2006 | Comune di Occhiobello | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della sinistra Po | 2.798.000 | 1.399.000 | Lavori Pubblici | 28 |
| 2007 | Comune di Fratta Polesine | Itinerario ciclabile intercomunale fra Adige e Po - 2° stralcio a completamento | 2.800.000 | 1.500.000 | Infrastrutture | 38 |
| 2007 | Comune di Porto Viro | Collettore Padano Polesano - Progetto per la riqualificazione paesaggistico- ambientale e riuso strategico, finalizzato alla funzione turistica ricreativa delle aree coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso connessi | 2.000.000 | 1.000.000 | Infrastrutture | 39 |
| 2008 | Camera di Commercio di Rovigo | Adeguamento edile, impiantistico e restauro del "Salone del grano" e dei locali annessi per adibirli ad attività a supporto dell'economia locale | 4.628.240 | 1.483.000 | Lavori Pubblici | 51 |
| 2008 | Comune di Trecenta | Recupero polifunzionale di un bene culturale, ex scuole elementari di Sariano, con destinazione ad uso turistico ricettivo - ostello per la gioventù | 1.665.000 | 1.215.250 | Lavori Pubblici | 52 |
| 2009 | Comune di Porto Tolle | Valorizzazione dell'area Largo Europa e attracco fluviale ex traghetto | 1.500.000 | 1.122.900 | Mobilità | 62 |
| 2009 | Comune di Ariano Polesine | Valorizzazione di Santa Maria in Punta e delle sue golene nel Comune di Ariano Polesine | 600.000 | 504.000 | Lavori Pubblici | 62 |
| 2009 | Comune di Loreo | Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago | 1.300.000 | 1.083.500 | Lavori Pubblici | 64 |
| 2009 | Comune di Taglio di Po | Azione pilota "La ricchezza del fiume, il calore dell'accoglienza" | - | a) 500.000 b) 75.000 | Turismo | 67 |
| 2010 | Comune di Castelguglielmo | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'asta fluviale Tartaro - Canalbianco | 1.361.000 | 750.000 | Lavori Pubblici | 73 |
| 2010 | Comune di Arquà Polesine | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'ex alveo della Fossa Filistina collegando il Castello di Rovigo con il Castello di Arquà Polesine | 2.248.800 | 750.000 | - | 72 |
| totale | | | 25.151.240 | 13.436.070 | | |

Intesa Programmatica d'Area TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA

Superficie: 775 kmq - Popolazione: 227.746 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Pieve di Soligo

Via G.Vaccari 2 – 31053 Pieve di Soligo (TV)

www.comune.pievedisoligo.tv.it

www.galaltamarca.it

tel. 0438/985314 – fax 0438/985300

PEC: segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it



Comuni appartenenti (30): Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene,

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura reg. responsabile | pag. |
|---------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 2008 | Comune di Sarmede | Palazzo mostra internazionale per l'infanzia | 1.721.875 | 1.446.000 | Lavori Pubblici | 51 |
| 2008 | Comune di Fregona | Interventi strutturali per la realizzazione del parco delle grotte del Caglieron | 1.600.000 | 1.335.500 | Lavori Pubblici | 48 |
| 2009 | Azienda Speciale Santa Lucia Fiere | Ristrutturazione e sistemazione dell'area ex filanda "Ancillotto" | 2.140.000 | 1.477.500 | Lavori Pubblici | 63 |
| 2010 | U.Montana delle Prealpi Trevigiane | Progetto per la valorizzazione turistico-sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" | 999.000 | 750.000 | Turismo | 75 |
| totale | | | 6.460.875 | 5.009.000 | | |

Intesa Programmatica d'Area VENEZIA ORIENTALE

Superficie: 1.137 kmq - Popolazione: 237.866 abitanti (dati Istat 2014)

Soggetto responsabile: Comune di Portogruaro


Piazza della Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (Ve)

www.comune.portogruaro.ve.it

www.vegal.net

tel. 0421/277216 - fax 0421/73209

PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

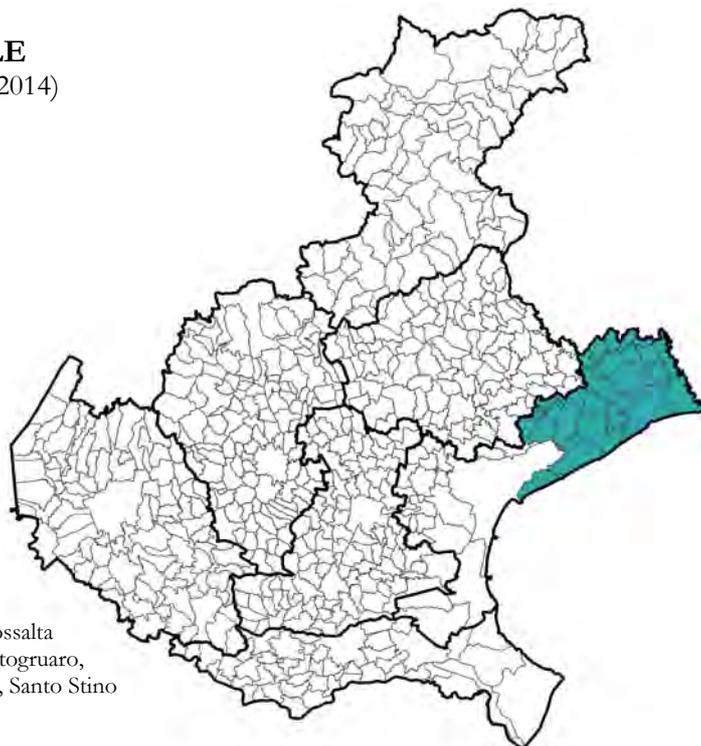

Comuni appartenenti (22): Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto

Contributi regionali assegnati

| anno | beneficiario | opera finanziata | costo opera | contr. regione | Struttura regionale responsabile | pag. |
|---------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 2008 | Comune di Caorle | Realizzazione parcheggio ingresso Caorle | 1.500.000 | 1.261.000 | Lavori Pubblici | 48 |
| totale | | | 1.500.000 | 1.261.000 | | |

PARTE III

*Tipologie di intervento finanziate
e stato di avanzamento dei lavori*

Dati e grafici al 31-12-2014

Numero di interventi finanziati per Area e per tipologia di intervento

| AREA | Valorizzazione turistico-ambientale | Recupero di edifici | Piste ciclabili | Impianti sportivi | Altri interventi (urbanizzazione) | Ricettività extra-alberghiera | TOTALE |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Alto Vicentino | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Altopiano dei Sette Comuni | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Area Berica | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bassa Padovana | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Basso Veronese e Colognese | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Camposampierese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Castellana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chioggia Cavarzere e Cona | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Dolomiti Venete | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Medio Brenta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miranese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montagna Veronese | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Montello Piave-Sile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Opitergino Mottense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ovest Vicentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pedemontana del Brenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Prealpi Bellunesi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Riviera del Brenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sistema Polesine | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Terre Alte Marca Trevigiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Venezia Orientale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 42 | 25 | 7 | 6 | 3 | 4 | 87 |

Importo dei contributi regionali assegnati per Area e per tipologia di intervento

| AREA | Valorizzazione turistico-ambientale | Recupero di edifici | Piste ciclabili | Impianti sportivi | Altri interventi (urbanizzazione) | Ricettività extra-alberghiera | TOTALE |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Alto Vicentino | 750.000 | 2.426.000 | 0 | 638.300 | 0 | 575.000 | 4.389.300 |
| Altopiano dei Sette Comuni | 2.382.121 | 887.200 | 0 | 1.514.500 | 0 | 0 | 4.783.821 |
| Area Berica | 1.370.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Bassa Padovana | 2.233.000 | 1.733.400 | 0 | 0 | 664.400 | 0 | 4.630.800 |
| Basso Veronese e Colognese | 1.050.030 | 577.800 | 906.530 | 0 | 0 | 0 | 2.534.360 |
| Camposampierese | 750.000 | 0 | 872.048 | 0 | 0 | 0 | 1.622.048 |
| Castellana | 1.077.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.500 |
| Chioggia Cavarzere e Cona | 0 | 3.805.574 | 0 | 0 | 1.428.250 | 0 | 5.233.824 |
| Dolomiti Venete | 10.130.500 | 0 | 819.290 | 2.838.550 | 0 | 0 | 13.788.340 |
| Medio Brenta | 0 | 1.477.500 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 2.746.500 |
| Miranese | 446.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.250 |
| Montagna Veronese | 4.637.450 | 1.860.500 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 7.072.950 |
| Montello Piave Sile | 263.500 | 1.465.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.700 |
| Opitergino Mottense | 749.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.700 |
| Ovest Vicentino | 382.500 | 821.000 | 0 | 0 | 915.000 | 0 | 2.118.500 |
| Pedemontana del Brenta | 689.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.000 |
| Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | 1.373.500 | 1.192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565.500 |
| Prealpi Bellunesi | 748.000 | 540.000 | 0 | 900.000 | 0 | 575.000 | 2.763.000 |
| Riviera del Brenta | 0 | 1.423.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423.500 |
| Sistema Polesine | 5.949.400 | 4.411.670 | 2.500.000 | 0 | 0 | 575.000 | 13.436.070 |
| Terre Alte Marca Trevigiana | 2.085.500 | 2.923.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009.000 |
| Venezia Orientale | 1.261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261.000 |
| TOTALE | 38.328.951 | 26.441.844 | 7.096.868 | 4.994.350 | 3.007.650 | 2.300.000 | 82.169.663 |

Elenco dettagliato degli interventi finanziati per tipologie omogenee, con stato di avanzamento lavori (aggiudicazione ed esecuzione)

| Anno | Area | Titolo intervento | | | Contributo | Aggiudicazione lavori | Esecuzione lavori | |
|------|------|-------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | inizio | fine |

VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 2004 | Sistema Polesine | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Comune Pincara) | | | 1.423.500 | 30.6.2007 | 17.9.2007 | 31.7.2009 |
| 2004 | Dolomiti Venete | Progetto integrato: valorizzazione turistico-ambientale del territorio - 16 progetti - (C.M. Cadore-Longaronese-Zoldo) | | | 1.423.500 | 03.4.2006 | 10.4.2006 | 23.02.2009 |
| 2006 | Sistema Polesine | Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della sinistra Po (Comune Occhiobello) | | | 1.399.000 | 30.11.2008 | 01.12.2008 | 22.8.2010 |
| 2006 | Altopiano dei Sette Comuni | Sistemazione e messa in sicurezza della strada turistica "Gallo - Melette - Monte Ortigara" (Comune Gallio) | | | 633.371 | 27.12.2007 | 21.5.2008 | 13.11.2009 |
| 2006 | Basso Veronese e colognese | Valorizzazione delle potenzialità turistiche e congressuali dell'area fieristica della ex polifosfati di Cerea (Comune Cerea) | | | 800.030 | 06.3.2008 | 12.5.2008 | 25.5.2010 |
| 2007 | Dolomiti Venete | Realizzazione di un fabbricato da destinare a Centro servizi polifunzionale (Kinderheim, bar-ristoro, attività logistico amministrativa e servizi di supporto alle attività sportive) finalizzato allo sviluppo turistico del territorio dell'Alto Agordino (Comune Selva di Cadore) | | | 585.000 | 16.12.2010 | 23.3.2011 | 19.12.2013 |
| 2007 | Area Berica | Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo (Comune Villaga) | | | 620.000 | 04.11.2010 | 28.9.2010 | 25.9.2012 |
| 2007 | Castellana | Realizzazione di un itinerario turistico lungo il fiume Muson denominato "Sui sentieri degli Ezzelini" - 1° e 2° stralcio (Comune Castello di Godego) | | | 1.077.500 | 09.12.2010 | 05.4.2011 | 30.5.2012 |
| 2008 | Dolomiti Venete | Opere di riqualificazione ambientale e valorizzazione antichi nuclei abitativi di Sappada (Comune Sappada) | | | 1.483.000 | 23.9.2011 | 14.9.2011 | 30.8.2013 |
| 2008 | Montagna Veronese | Recupero antica viabilità sul versante orientale del Monte Baldo (Comune Brentino Belluno) | | | 540.000 | 25.9.2009 | 01.10.2009 | 31.01.2011 |
| 2008 | Montagna Veronese | Recupero e valorizzazione storico-culturale, paesaggistica, turistica e ambientale di Brenzone - località Campo (Comune Brenzone) | | | 633.000 | 15.10.2011 | 01.10.2011 | in corso (prevista 30.4.2015) |
| 2008 | Bassa Padovana | Centro di Educazione Naturalistica e Ambientale per la valorizzazione paesaggistica nell'area della Golena dell'Adige denominata "il Bosco" (Comune Piacenza d'Adige) | | | 1.483.000 revocato | - | - | - |
| 2008 | Dolomiti Venete | Nuovo centro coperto per il mercato comprensoriale dei prodotti tipici del territorio (Comune Valle di Cadore) | | | 1.483.000 revocato | - | - | - |
| 2008 | Venezia Orientale | Realizzazione parcheggio ingresso Caorle (Comune Caorle) | | | 1.261.000 | 28.6.2013 | 03.6.2013 | 23.11.2013 |
| 2008 | Dolomiti Venete | Progetto integrato di sviluppo locale - Percorsi dei Sagrati Storico Religiosi - Comuni di Castellavazzo, Colle S. Lucia, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Soverzene, Taibon Agordino, Zoppè di Cadore (C.M. Cadore-Longaronese-Zoldo) | | | 1.451.000 | 23.9.2011 | 31.10.2011 | 05.9.2013 |
| 2008 | Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Realizzazione itinerario turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" lungo il Muson e il Lastego (Comune Fonte) | | | 1.110.000 | 16.12.2013 | - | - |
| 2008 | Altopiano dei Sette Comuni | Elettificazione dei comprensori turistici di Campolongo in Comune di Rotzo e di Monte Verena in Comune di Roana (Comune Rotzo) | | | 998.750 | 30.5.2011 | 28.6.2011 | 07.9.2012 |
| 2008 | Terre Alte Marca Trevigiana | Interventi strutturali per la realizzazione del parco delle grotte del Caglieron (Comune Fregona) | | | 1.335.500 | 07.7.2011 | 08.8.2011 | 31.01.2014 |
| 2009 | Montagna Veronese | Sistema della sentieristica della Lessinia: valorizzazione turistica area Valpolicella e Corno d'Aquilio (C.M. della Lessinia) | | | 1.236.950 | 19.9.2011 | 28.9.2011 | 13.6.2013 |
| 2009 | Sistema Polesine | Valorizzazione dell'area Largo Europa e attracco fluviale ex traghetto (Comune Porto Tolle) | | | 1.122.900 | 20.7.2012 | 03.10.2012 | 31.7.2014 |
| 2009 | Dolomiti Venete | La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica (Comune Lozzo Cadore) | | | 1.477.500 | 01.9.2012 | 12.11.2012 | in corso (prevista 20.12.2015) |
| 2009 | Dolomiti Venete | Il sito minerario del "Fursil": recupero a fini turistico culturali della galleria mineraria Breda e realizzazione del centro visita (Comune Colle Santa Lucia) | | | 1.477.500 | 30.9.2011 | 02.5.2012 | in corso (prevista 30.11.2015) |

| Anno | Area | Titolo intervento | Contributo | Aggiudicazione lavori | Esecuzione lavori | |
|------|------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------|
| | | | | | inizio | fine |

VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2009 | Montagna Veronese | Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga S.Giorgio (Comune Bosco Chiesanuova) | 1.477.500 revocato | - | - | - |
| 2009 | Sistema Polesine | Valorizzazione di Santa Maria in Punta e delle sue golene nel Comune di Ariano Polesine (Comune Ariano nel Polesine) | 504.000 | 07.3.2012 | 10.4.2012 | 29.10.2012 |
| 2010 | Camposampierese | La via delle risorgive tra ambiente e cultura (Federazione dei Comuni del Camposampierese) | 750.000 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | (prevista 30.3.2015) |
| 2010 | Prealpi Bellunesi | Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce (C.M. Alpagò) | 748.000 | 14.4.2014 | 25.6.2014 | (prevista 31.12.2015) |
| 2010 | Sistema Polesine | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'asta fluviale Tartaro-Canalbianco (Comune Castelguglielmo) | 750.000 | 09.5.2014 (annullata) 12.11.2014 | 26.5.2014 | (prevista 30.6.2015) |
| 2010 | Bassa Padovana | Percorso itinerante storico ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige - Vie di terra e di acqua (Comune Pernumia) | 750.000 | 07.8.2014 | 09.10.2014 | (prevista 30.6.2015) |
| 2010 | Montagna Veronese | B.A.L.D.O. in rete. Biodiversità - Alpeggi - Lago - Didattica e sport - Ospitalità (C.M. del Baldo) | 750.000 | 06.12.2012 | 07.12.2012 | (prevista 31.5.2015) |
| 2010 | Altopiano dei Sette Comuni | Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume - Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta (Comune Valstagna) | 750.000 | 27.5.2013 | 19.7.2013 | (prevista 31.3.2015) |
| 2010 | Pedemontana del Brenta | AQuAS 1 - Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo sostenibile dell'area Pademontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica (Comune Bassano del Grappa) | 689.000 | 16.9.2013 | 30.6.2014 | (prevista 12.01.2015) |
| 2010 | Miranese | Itinerario lungo l'argine del fiume Dese (Comune Scorzè) | 446.250 | 04.10.2013 | 18.11.2013 | 18.4.2014 |
| 2010 | Opitergino Mottense | "Gira Monticano" - Itinerario naturalistico del fiume Monticano (Comune Gorgo al Monticano) | 749.700 | 16.10.2012 | 06.6.2012 | 24.7.2014 |
| 2010 | Sistema Polesine | Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'ex alveo della Fossa Filistina collegando il castello di Rovigo con il Castello di Arquà Polesine (Comune Arquà P.) | 750.000 rinuncia | - | - | - |
| 2010 | Terre Alte Marca Trevigiana | Progetto per la valorizzazione turistico-sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA Terre Alte della Marca trevigiana: ambito dei "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" (C.M. Prealpi Trevigiane) | 750.000 | 30.9.2013 | 16.9.2013 | 01.6.2014 |
| 2010 | Basso Veronese e colognese | Il sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione di attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villa Bartolomea (Comune Legnago) | 250.000 | 02.12.2013 | 15.5.2014 | (prevista 15.9.2015) |
| 2010 | Alto Vicentino | Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro terme, Valli del Pasubio e Posina (Comune Valli del Pasubio) | 750.000 | 30.9.2013 | 16.9.2013 | (prevista 31.12.2015) |
| 2010 | Area Berica | Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale - 1° stralcio (Comune Alonte) | 750.000 | 23.12.2013 | 19.5.2014 | (prevista 30.6.2015) |
| 2010 | Ovest Vicentino | Anello ecoturistico "Agno-Chiampo" nei Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Comedo Vicentino, Brogliano e Trissino (C.M. Agno Chiampo) | 382.500 | 31.7.2012 | 08.10.2012 | (prevista 29.12.2015) |
| 2010 | Pedemontana del Grappa e dell'Asolano | Riqualificazione ambientale Val Secca con percorso vita (Comune Paderno del Grappa) | 263.500 | 06.8.2014 | 09.10.2014 | (prevista 31.01.2015) |
| 2010 | MontelloPiaveSile | Parco attrezzato Santi Angeli (Comune Giavera del Montello) | 263.500 | 07.5.2013 | 15.5.2013 | 31.10.2013 |
| 2010 | Dolomiti Venete | Percorso religioso e turistico-naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la "Via dei Papi" (Comune Canale d'Agordo) | 750.000 | in corso | (prevista 01.4.2015) | (prevista 30.11.2015) |

Totale

38.328.951

| Anno | Area | Titolo intervento | Contributo | Aggiudicazione lavori | Esecuzione lavori | |
|------|------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------|
| | | | | | inizio | fine |

RECUPERO DI EDIFICI

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| 2004 | Chioggia Cavarzere Cona | Realizzazione di un polo agroalimentare con ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Brondolo (Comune Chioggia) | 1.349.600 | 17.12.2008 | 20.11.2008 | 10.3.2010 |
| 2004 | Riviera del Brenta | Restauro Villa Contarini Leoni 1°-3° stralcio (Comune Mira) | 1.423.500 | 19.5.2006 | 31.5.2006 | 20.5.2008 |
| 2004 | Altopiano dei Sette Comuni | Restauro e riqualificazione dell'ex sede Municipale con destinazione d'uso a Museo (Comune Foza) | 887.200 | 04.12.2006 | 11.4.2007 | 30.10.2009 |
| 2004 | Montagna Veronese | Realizzazione di strutture turistico sportive polifunzionali ricreative Monti Lessini (Comune Bosco Chiesanuova) - 1°, 2°, 3° e 4° stralcio | 1.335.500 | 15.11.2006 | 10.02.2007 | 03.5.2011 |
| 2004 | Basso Veronese e colognese | Recupero dell'ex Casa del fascio quale Centro socio culturale del territorio (Comune Alberedo d'Adige) | 577.800 | 22.5.2006 | 29.5.2006 | 21.3.2008 |
| 2005 | Sistema Polesine | Lavori di ampliamento dell'Istituto Alberghiero di Adria (Provincia Rovigo) | 629.920 | 19.12.2006 | 30.10.2006 | 24.02.2010 |
| 2005 | Pedemontana del Grappa | Osservatorio Canoviano e della cultura della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano (Comune Possagno). | 592.000 | 18.9.2007 | 22.11.2007 | 28.11.2008 |
| 2006 | Prealpi Bellunesi | Progetto per la realizzazione di un centro culturale a Quero (Unione dei Comuni Basso Feltrino-Sette Ville) | 540.000 | 10.9.2007 | 29.10.2007 | 26.9.2008 |
| 2006 | Bassa Padovana | Lavori ristrutturazione Villa Centanini per trasformazione in museo della civiltà rurale - ostello - attività turistico ambientali (Comune Pozzonovo) | 900.000 | 10.12.2008 | 15.01.2009 | 13.6.2013 |
| 2006 | Pedemontana del Grappa | Recupero della Torre di Ezzelino a San Zenone degli Ezzelini (Comune San Zenone degli Ezzelini) | 600.000 | 04.6.2008 | 28.7.2008 | 30.9.2011 |
| 2006 | Chioggia Cavarzere Cona | Riqualificazione area vecchio porto di Chioggia di Isola Saloni - Area filtro servizi logistici e supporto all'autostrada del mare (ASPO Chioggia) | 955.974 | 19.9.2007 | 19.10.2007 | 15.5.2008 |
| 2007 | Montagna Veronese | Completamento recupero di Villa Bassani Brenzoni per alta formazione nel comparto della lavorazione lapidea (Comune Sant'Ambrogio di Valpolicella) | 525.000 | 16.8.2010 | 07.5.2010 | 20.5.2011 |
| 2007 | Chioggia Cavarzere Cona | Restauro Palazzo Barbiani - sede municipale - (Comune Cavarzere) | 1.500.000 | 06.7.2009 | 14.9.2009 | 19.11.2010 |
| 2008 | Sistema Polesine | Adeguamento edile, impiantistico e restauro del "Salone del grano" e dei locali annessi per adibirli ad attività a supporto dell'economia locale (Camera di Commercio di Rovigo) | 1.483.000 | 16.6.2011 | 20.6.2011 | 29.11.2013 |
| 2008 | Ovest Vicentino | Recupero della barchessa di Palazzo Cera: centro servizi per la promozione dell'attività vitivinicola e Strada del vino (Comune Gambellara) | 821.000 | 18.4.2011 | 25.5.2011 | 28.01.2013 |
| 2008 | Altopiano dei Sette Comuni | Centro servizi sportivi denominato Fontanella Bike Resort (Comune Lusiana) | 897.000 | 14.9.2011 | 23.01.2012 | 13.12.2013 |
| 2008 | Terre Alte Marca Trevigiana | Palazzo mostra internazionale per l'infanzia (Comune Sarmede) | 1.446.000 | 23.6.2011 | 28.6.2011 | 31.01.2013 |
| 2008 | Sistema Polesine | Recupero polifunzionale di un bene culturale (ex scuole elementari di Sariano) con destinazione ad uso collettivo e turistico ricettivo (ostello per la gioventù) - (Comune Trecenta) | 1.215.250 | 15.9.2011 | 26.9.2011 | 29.6.2012 |
| 2008 | Alto Vicentino | Recupero dell'edificio di archeologia industriale "Shed" per il potenziamento delle attività del Centro per il trasferimento tecnologico Demotech (Comune Schio) - 1° e 2° stralcio | 1.091.000 | 04.5.2010 | 24.5.2010 | 20.7.2012 |
| 2008 | Alto Vicentino | Restauro e rifunionalizzazione del complesso denominato Villa Fabris - sede Centro Europeo per i Mestieri della Conservazione del Patrimonio Culturale (Comune Thiene) | 1.335.000 | 04.4.2011 | 15.7.2011 | (prevista 30.6.2015) |
| 2009 | Sistema Polesine | Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago (Comune Loreo) | 1.083.500 | in corso | (prevista 02.4.2015) | (prevista 02.4.2016) |
| 2009 | Terre Alte Marca Trevigiana | Ristrutturazione e sistemazione dell'area ex filanda "Ancillotto" (Azienda Speciale Santa Lucia Fiere) | 1.477.500 | 18.02.2013 | 21.3.2013 | 08.9.2014 |
| 2009 | Bassa Padovana | Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico, integrazione impianti tecnologici e restauro affreschi di Villa Pisani (Comune Monselice) | 833.400 | 04.10.2012 | 18.9.2012 | 11.7.2014 |
| 2009 | Medio Brenta | Sistemazione Villa Borromeo per museo agricolo - II° stralcio (Comune Fontaniva) | 1.477.500 | 30.7.2012 | 22.5.2014 | (prevista 22.10.2015) |
| 2009 | Montello-Piave-Sile | Restauro di Villa Lattes per la nuova sede del museo della Collezione Lattes: automi, carrillons, dipinti (Comune Istrana) | 1.465.200 | 20.6.2012 | 10.7.2012 | (prevista 31.12.2015) |

Totale

26.441.844

| Anno | Area | Titolo intervento | Contributo | Aggiudicazione lavori | Esecuzione lavori | |
|------|------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------|
| | | | | | inizio | fine |

ITINERARI CICLABILI

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 2005 | Basso Veronese e colognese | Realizzazione percorso ciclabile "Dalle Alpi all'Adriatico" tratto VR Sud - Comuni di Roverchiara, Angiari, Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro (Comune di Legnago) | 906.530 | 17.02.2009 | 06.4.2009 | 20.6.2011 |
| 2007 | Sistema Polesine | Itinerario ciclabile intercomunale fra Adige e Po - 2° stralcio a completamento (Comune Fratta Polesine) | 1.500.000 | 27.9.2011 | 03.10.2011 | 31.12.2012 |
| 2007 | Area Berica | Pista ciclabile-pedonale dal Lago di Fimon al Tormeno (Comune Arcugnano) | 730.000 | 03.6.2009 | 04.6.2009 | 07.11.2013 |
| 2007 | Dolomiti Venete | Completamento itinerario ciclo-pedonale "La lunga via delle Dolomiti" di collegamento tra i comuni di Vodo di Cadore, Borca di Cadore, S. Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo - 3° stralcio (C.M. Valle del Boite) | 819.290 | 06.6.2008 | 19.6.2008 | 27.7.2009 |
| 2007 | Sistema Polesine | Collettore Padano Polesano - Progetto per la riqualificazione paesaggistico-ambientale e riuso strategico, finalizzato alla fruizione turistica ricreativa delle aree coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso connessi (Comune Porto Viro) | 1.000.000 | 22.02.2013 | 13.5.2013 | 09.10.2014 |
| 2007 | Campo-sampierese | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale - Lotto A (Provincia di Padova) | 872.048 | 07.9.2011 | 26.10.2011 | 12.7.2012 |
| 2008 | Medio Brenta | Recupero dell'ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale - Lotto B (Provincia di Padova) | 1.269.000 | 15.02.2012 | 28.5.2012 | 22.02.2014 |

Totale 7.096.868

IMPIANTI SPORTIVI

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 2005 | Dolomiti Venete | Riqualificazione Comprensorio sciistico Monte Agudo. Realizzazione impianto di risalita Taiarezze - Malon (Comune) | 1.500.000 | 02.5.2007 | 11.6.2007 | 31.12.2009 |
| 2005 | Dolomiti Venete | Ampliamento e ammodernamento area sciabile in Padola di Comelico Superiore. Pista da sci denominata Campo (Comune Comelico Superiore) | 754.050 | 30.9.2011 | 07.10.2011 | 30.9.2012 |
| 2005 | Altopiano dei Sette Comuni | Adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio del Ghiaccio (Comune Asiago) | 617.500 | 27.12.2007 | 18.02.2008 | 23.4.2010 |
| 2007 | Prealpi Bellunesi | Progetto di impianti sportivi e strutture ricettivo-turistiche in località Boscherai (Comune Pedavena) | 900.000 | 22.7.2009 | 30.9.2009 | 30.6.2012 |
| 2008 | Dolomiti Venete | Realizzazione di un impianto comprensoriale di atletica leggera in località Polane del Comune di Agordo (Comune Agordo) | 584.500 | 09.6.2011 | 13.6.2011 | 30.4.2012 |
| 2009 | Alto Vicentino | Completamento della struttura copertura polivalente al fine della pratica del pattinaggio su ghiaccio (Comune Tonezza del Cimone) | 638.300 | 04.9.2012 | 16.10.2012 | 30.5.2014 |

Totale 4.994.350

ALTRI INTERVENTI (URBANIZZAZIONE)




| | | | | | | |
|------|-------------------------|---|-----------|------------|------------|----------------------|
| 2004 | Bassa Padovana | Opere di urbanizzazione Area PIP - Casale di Scodosia | 664.400 | 10.3.2006 | 31.3.2006 | 31.3.2008 |
| 2004 | Ovest Vicentino | Viabilità di collegamento tra la nuova zona industriale e la SP Val di Chiampo in zona di Pieve Bassa (Comune Chiam-) | 915.000 | 12.6.2006 | 12.9.2006 | 22.10.2007 |
| 2009 | Chioggia Cavarzere Cona | Progetto di sistemazione e arredo di Corso del Popolo - La Piazza di Chioggia (Comune Chioggia) | 1.428.250 | 17.12.2013 | 20.01.2014 | (prevista 30.9.2015) |

Totale 3.007.650




RICETTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERA

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 2009 | Alto Vicentino | Soggiornare nelle antiche ville dei conti e dei signori (Comune Valli del Pasubio) | 575.000 | A 500.000 B 75.000 | in corso di esecuzione | |
| 2009 | Prealpi Bellunesi | Feltre. Camere con vista (Comune Feltre) | 575.000 | A 500.000 B 75.000 | in corso di esecuzione | |
| 2009 | Montagna Veronese | AP per la riqualificazione degli elementi urbani del Centro storico di Molina (Comune Fumane) | 575.000 | A 500.000 B 75.000 | in corso di esecuzione | |
| 2009 | Sistema Polesine | La ricchezza del fiume, il calore dell'accoglienza (Comune Taglio di Po) | 575.000 | A 500.000 B 75.000 | in corso di esecuzione | |




Totale 2.300.000

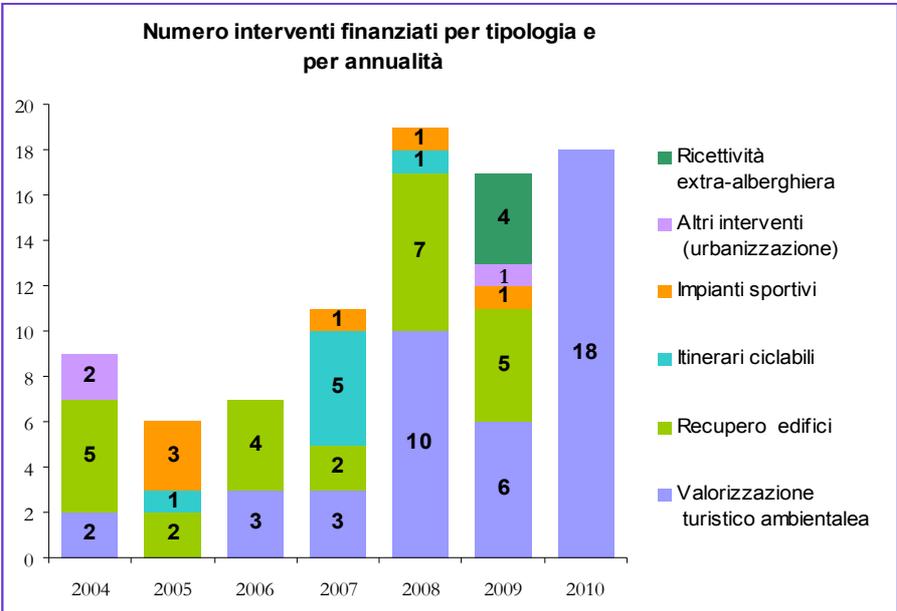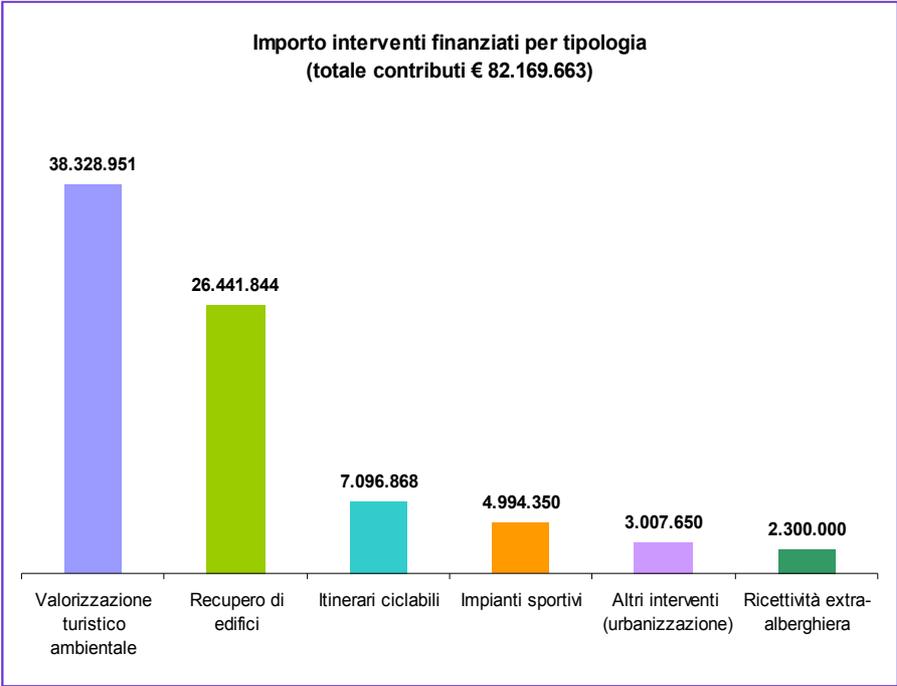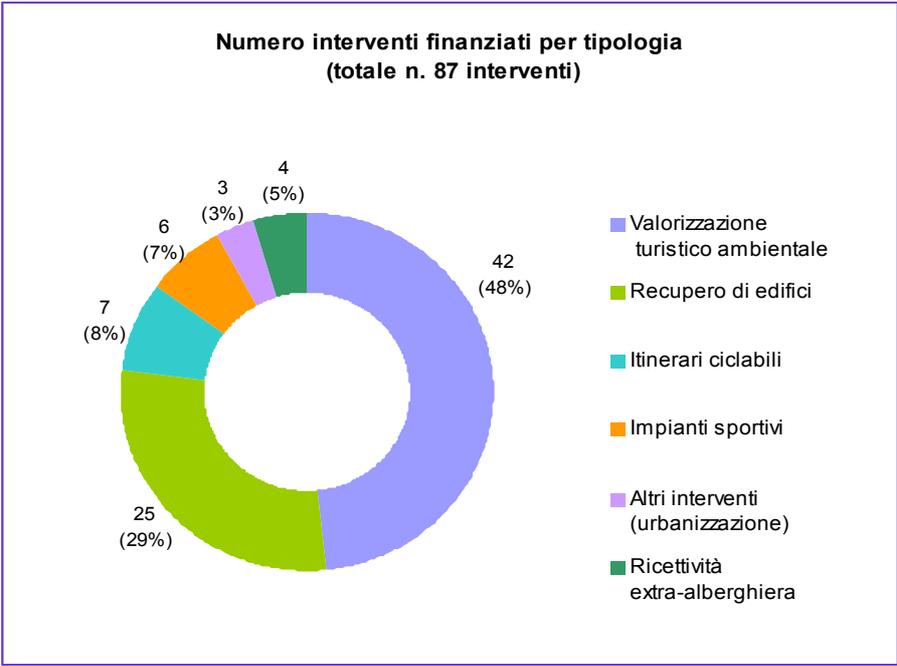


Nei grafici che seguono gli interventi sono rappresentati in base al costo complessivo e al contributo regionale assegnato

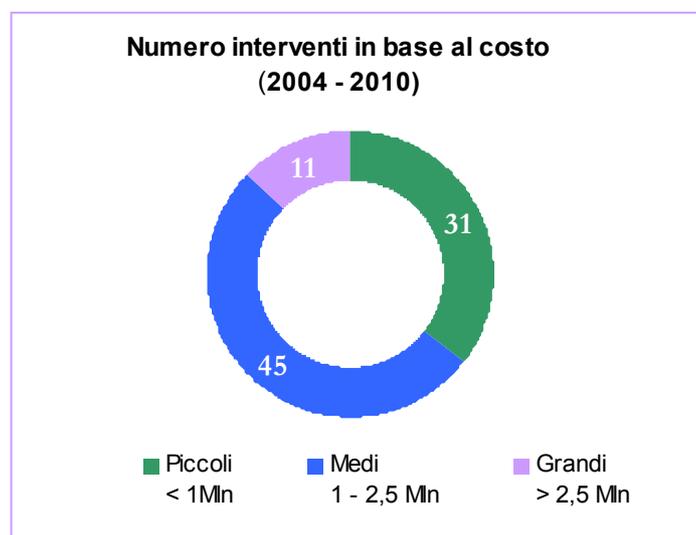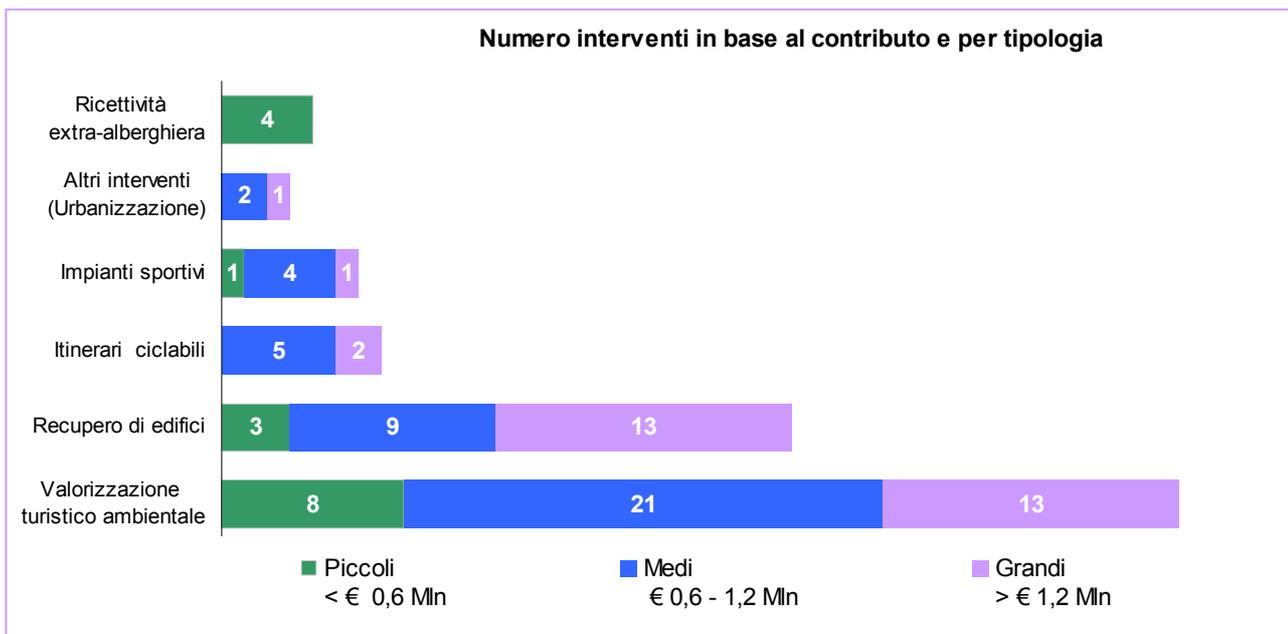
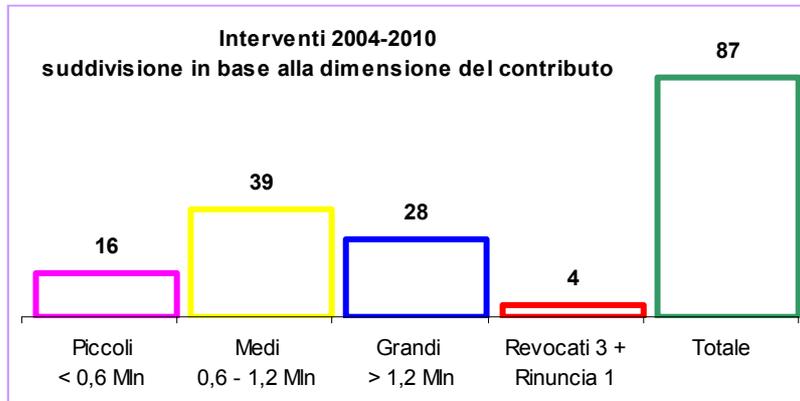


I grafici che seguono sono il risultato di una analisi dei dati pervenuti dai beneficiari attraverso le schede di monitoraggio. Le elaborazioni sono riferite ai **40 interventi conclusi** entro il 31 dicembre 2014.

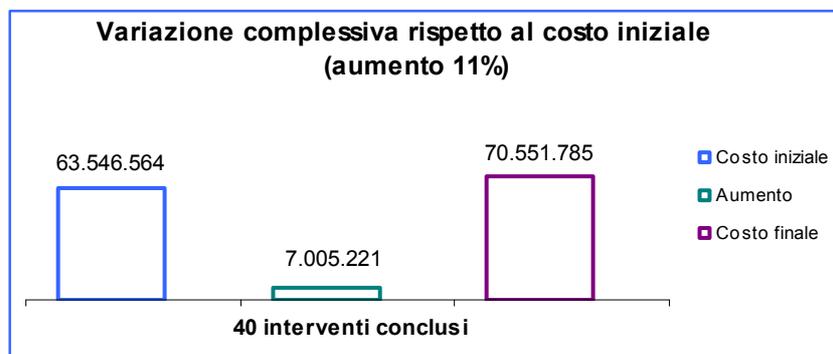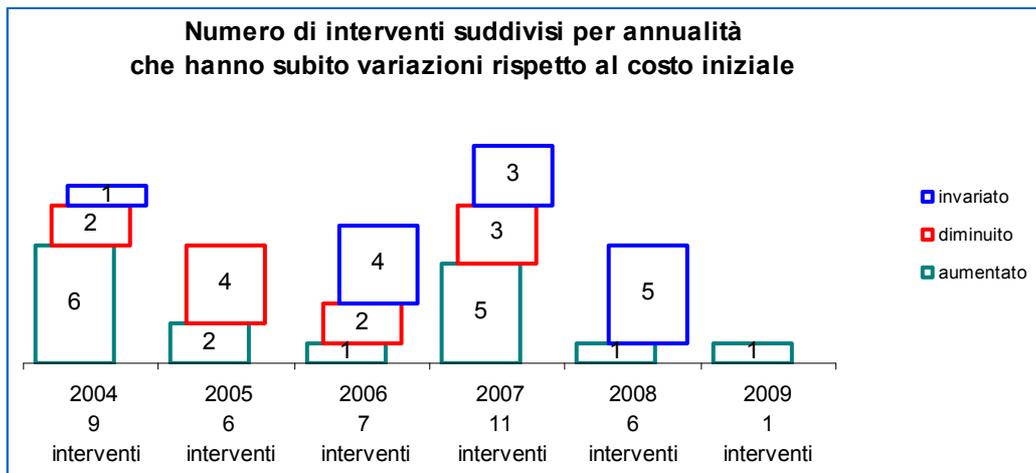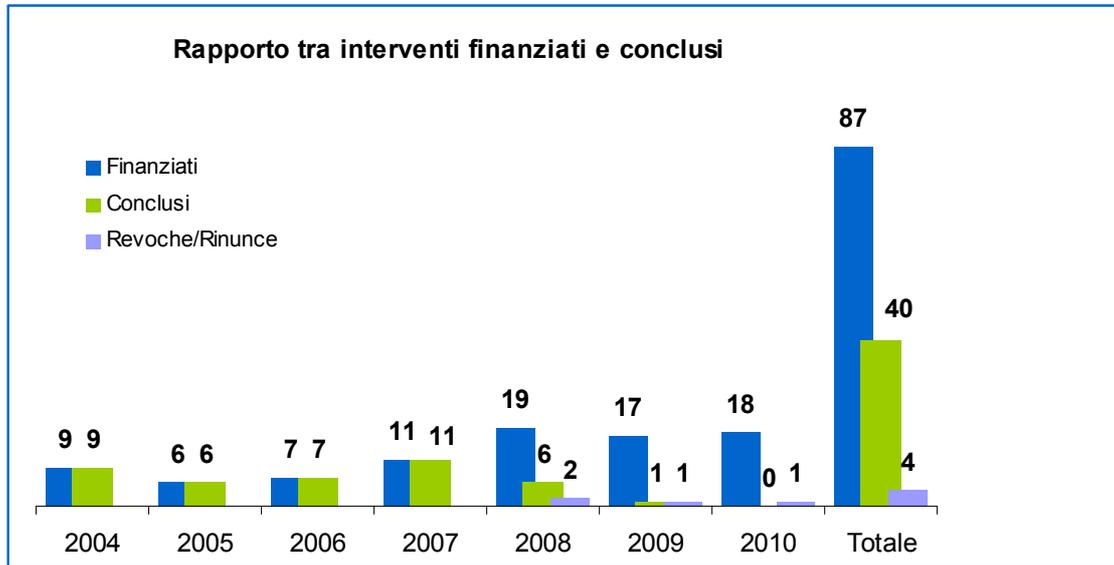


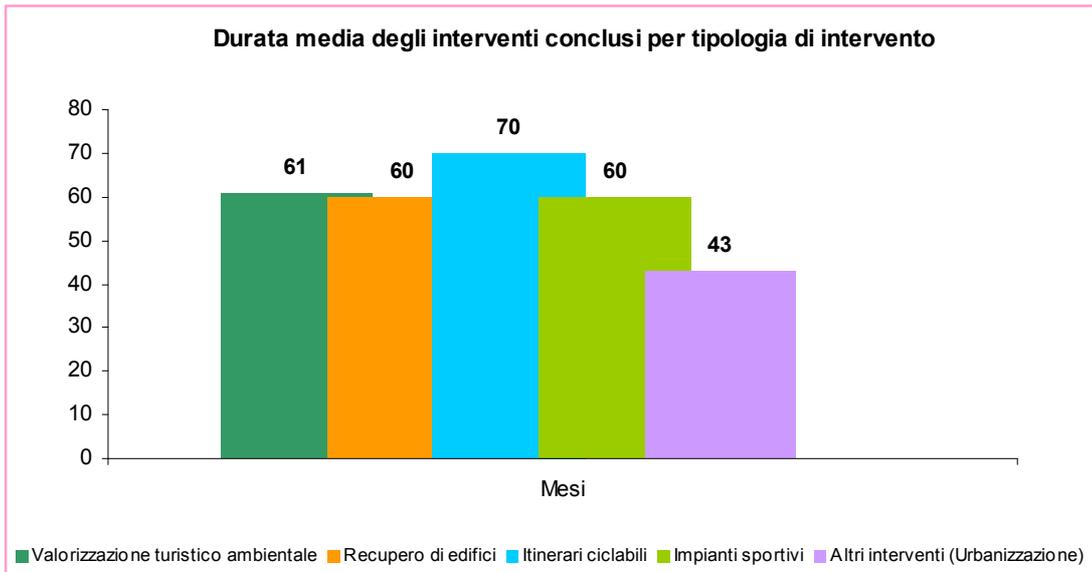



La durata comprende il periodo trascorso tra le date di assegnazione del contributo regionale e di rendicontazione finale della spesa.

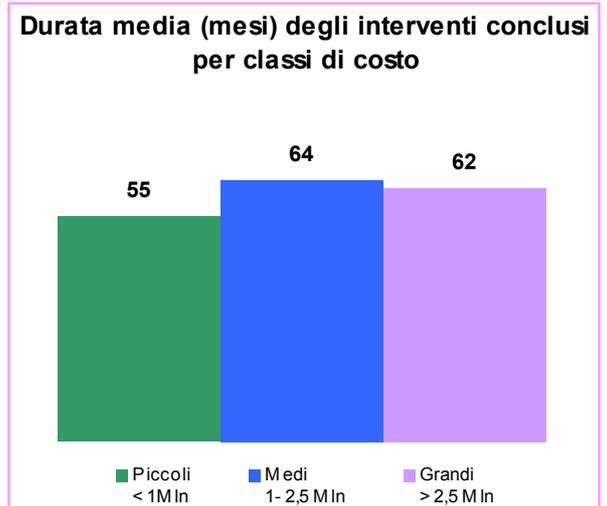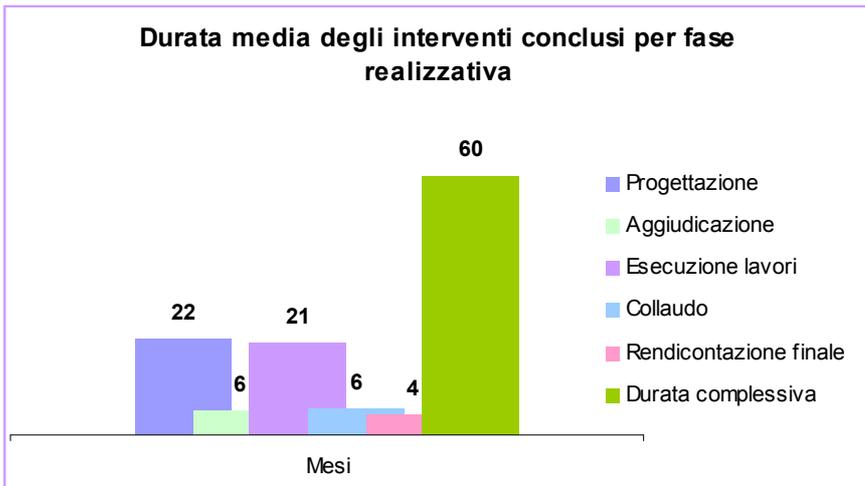

Il totale della durata media (60 mesi) tiene conto di eventuali periodi intermedi di inattività tra una fase e quella successiva.

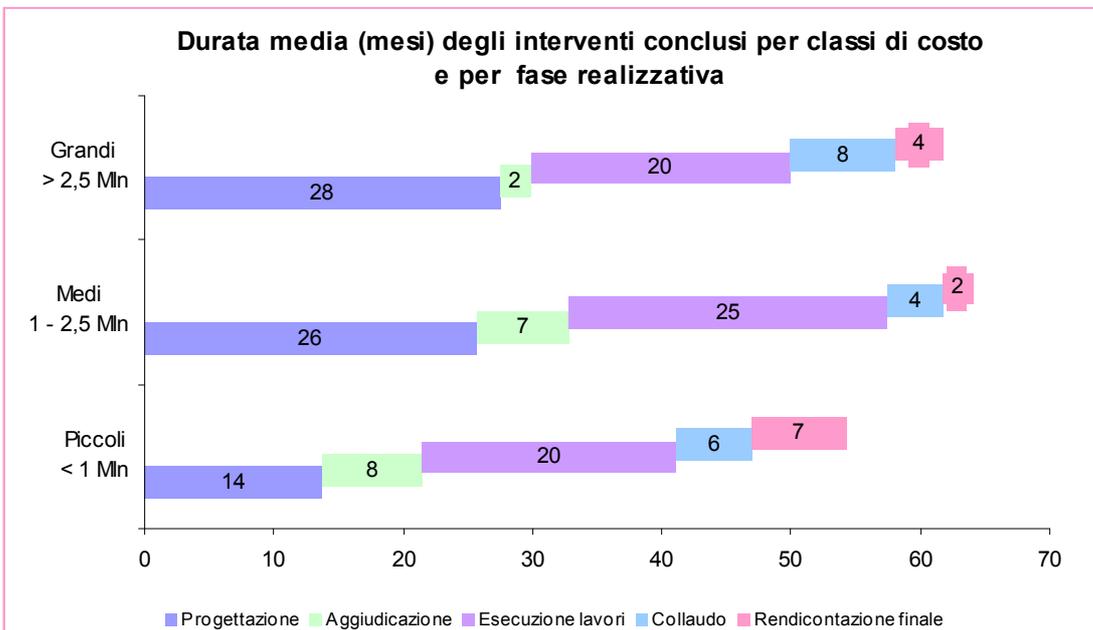

PROGRAMMAZIONE DECENTRATA 2004 - 2010

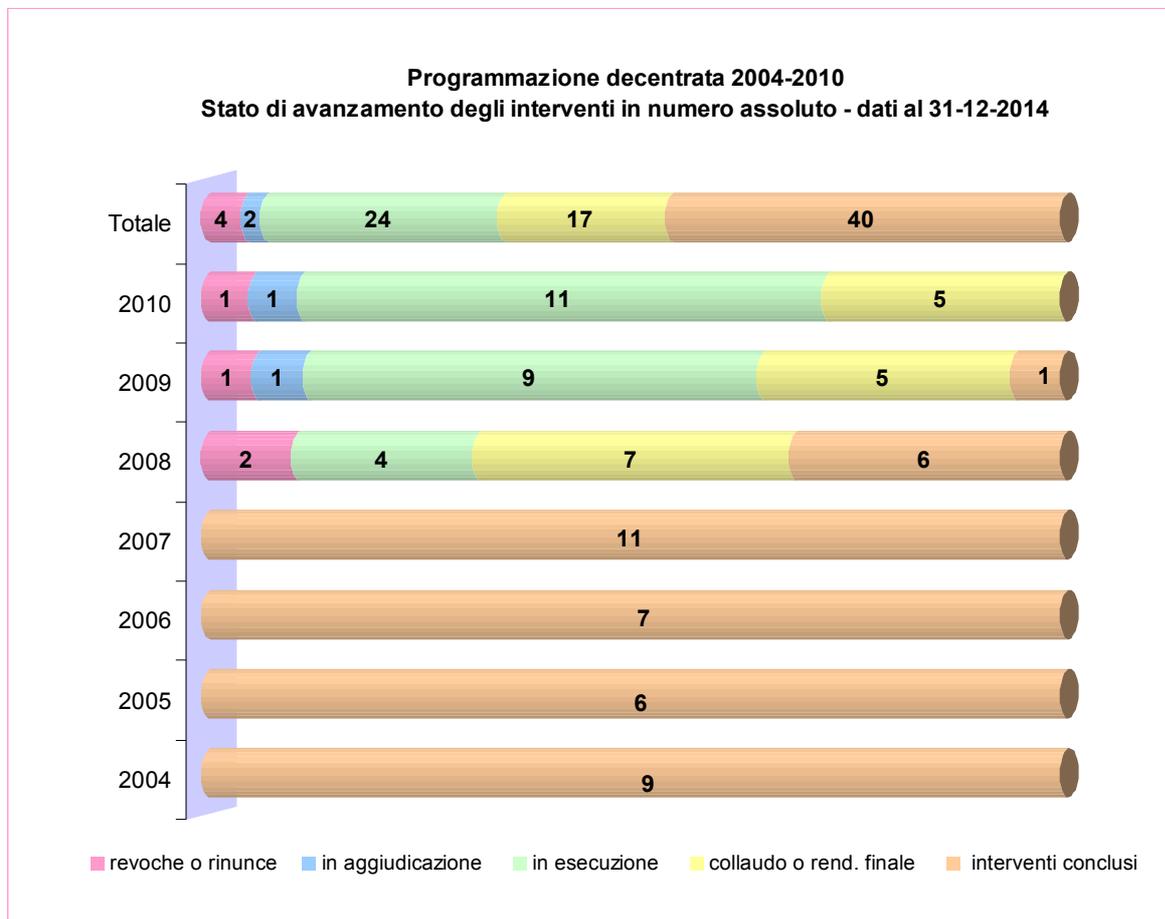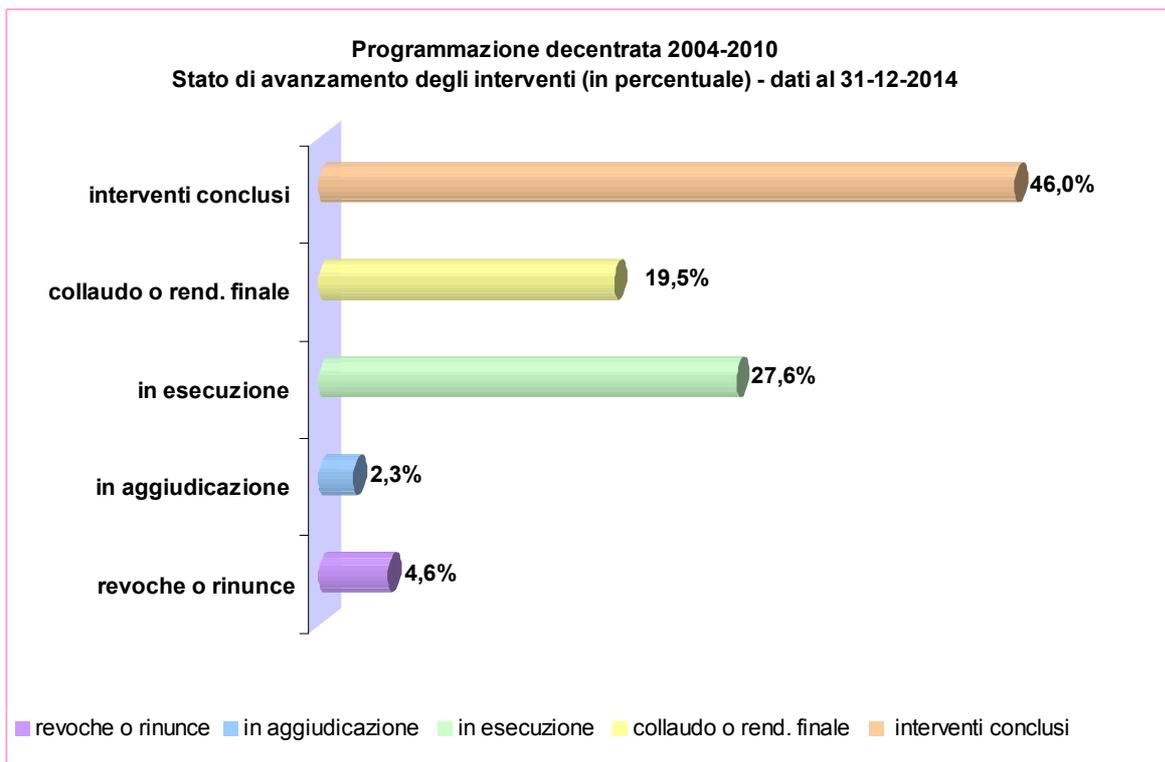

Conclusione

Programmazione decentrata : sette anni di istruttorie regionali

Nel periodo dal 2004 al 2010 con il metodo della programmazione decentrata sono state istruite 132 richieste di finanziamento, presentate dai soggetti responsabili del coordinamento di attività di programmazione dello sviluppo locale (prima Patti Territoriali, poi Intese Programmatiche d'Area).

Le richieste riguardano 385 opere infrastrutturali inerenti le principali linee di intervento riconducibili allo sviluppo locale.

Di questi interventi, 87 sono stati finanziati con l'assegnazione di contributi regionali per complessivi 82.169.663,20 euro; altri 92 sono stati ritenuti ammissibili, anche se non hanno ottenuto contributi su questa linea di finanziamento; i rimanenti 206, infine, non hanno raggiunto le condizioni minime per una valutazione di ammissibilità.

A partire dal bilancio regionale 2011 non sono stati stanziati ulteriori fondi per questa linea di finanziamento.

Questo il dato complessivo al 31/12/2014 sullo stato di avanzamento degli 87 interventi finanziati:

- 2 sono in fase di aggiudicazione dei lavori;
- 27 sono in fase di esecuzione dei lavori;
- 14 sono giunti a conclusione dei lavori, in attesa di collaudo o già collaudati e in fase di rendicontazione finale;
- 40 sono giunti alla chiusura del procedimento amministrativo e contabile, con relativa liquidazione del saldo;
- 4 progetti, infine, non sono stati realizzati; si è quindi proceduto in tre casi alla revoca del contributo regionale, in un caso alla presa d'atto della rinuncia al contributo da parte del soggetto attuatore.

Come si può notare, il 46,0% del totale delle opere finanziate è stato portato a termine, mentre un ulteriore 19,5% è costituito da interventi giunti comunque alla conclusione dei lavori ed ora in via di ultimazione con gli adempimenti amministrativo-contabili (collaudo e rendicontazione finale delle spese sostenute). Tenuto conto anche del 4,6% di opere non realizzate, soggette a revoca o rinuncia, si può dunque rilevare che sono tuttora in corso di esecuzione solo il 30% circa del totale degli interventi.

I dati relativi agli interventi conclusi fanno registrare un tempo medio di realizzazione di circa 5 anni, dei quali in linea di massima i primi 2 anni sono impiegati per la fase progettuale e per il successivo affidamento dei lavori, ulteriori 2 anni circa sono necessari per l'esecuzione dei lavori, il rimanente anno è impiegato per le operazioni di collaudo e di rendicontazione finale delle spese.

Il probabile incremento degli interventi che andranno a terminare entro il 2015, tenuto conto dell'avanzato stato di attuazione di diverse opere tuttora in fase di completamento, potrà fornire elementi ancor più significativi in ordine ai tempi medi di realizzazione delle opere finanziate.

Nota metodologica

I dati riportati nel presente elaborato derivano in parte dall'azione di monitoraggio, prevista nelle delibere regionali, che utilizza l'applicativo ministeriale SGP (Sistema Gestione Progetti), destinato agli interventi inseriti in APQ (Accordi di Programma Quadro), ma utilizzato dalla Regione del Veneto anche per il monitoraggio di linee di finanziamento esclusivamente regionali.

In tale contesto, i dati sono reperiti mediante l'invio di schede ai soggetti attuatori di ogni singolo intervento, con l'obiettivo di fotografarne lo stato di avanzamento con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno).

L'elaborato è altresì il frutto di attività di analisi ed approfondimento sulle Intese Programmatiche d'Area, realizzate dalla Sezione Affari Generali e FAS - FSC della Regione Veneto.

Documento realizzato dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC della Regione Veneto

Direttore: ing. Carlo Terrabujo

Dirigente Settore FAS-FSC, Programmazione negoziata e sviluppo locale: ing. Sandro Boato

P.O. Sviluppo locale: dr.ssa Nicoletta Gusella

P.O. Attuazione programmazione decentrata: dr. Alberto Cruccu

Redazione a cura di: arch. Roberto Di Santo



Intese Programmatiche d'Area

*Elaborazione dati di Monitoraggio al 31 Dicembre 2014
Edizione Aprile 2015*



REGIONE DEL VENETO
